



## “Nuovo Polo della Polizia di Stato” Cittadella della Sicurezza

presso la Caserma Boscariello, Via Miano 189, Napoli

CIG 8140592508 - CUP G65B19001360001

### PROGETTO DEFINITIVO

**AGENZIA DEL DEMANIO**  
Direzione Regionale Campania

ing. Paolo Maranca *Direttore p.t.*  
dott. Luca Damagini *Responsabile Unico del Procedimento*  
ing. Gabriella Pizzolante *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici  
e della Gestione Patrimoniale

PROGETTISTI:



Via San Nazaro, 19 - 16145 GENOVA - Italy  
Tel. +39 010 3828148 - Fax +39 010 3821078

**CORVINO + MULTARI**

Via Ponti Rossi, 117a - 80131 NAPOLI - Italy  
Tel. +39 081 7441678 - Fax +39 081 7441900



Via Galileo Ferraris, 86/a - 80142 NAPOLI - Italy  
Tel. +39 081 0807885 - Fax +39 081 0807885



Corso Europa, 72 - 80127 NAPOLI - Italy  
Tel. +39 081 5750086 - Fax +39 081 5750086



Via Rossini, 14 - 80026 CASORIA (NA) - Italy  
Tel. +39 081 7577738 - Fax +39 081 7578215



Via Valentine Zambra, 12 - 38121 TRENTO - Italy  
Tel. +39 0422 1762617



Piazza Meritatura, 1 - 38068 ROVERETO (TN) - Italy  
Tel. +39 328 9797497

dott. ssa Donatella Pingitore  
GEOLOG studio associato

Via Toppole, snc - 83020 CESINALE (AV) - Italy  
Tel. +39 08 3649665

archeologo Ilaria De Luca

Via Giovanni Boccaccio, 35  
00013 - FONTE NUOVA (RM)  
Tel. +39 368 3936397

CONSULENTE URBANISTICO:

arch. Francesco Varone

PROJECT MANAGER

ing. Gianluca Ciullo  
inh. (RINA Consulting spa)

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

ing. Alessandro Aliotta  
ING. (RINA Consulting spa)

COORDINATORE GENERALE DI PROGETTO:

arch. Vincenzo Corvino  
CORVINO + MULTARI

RAPPORTI CON SOGGETTO VERIFICATORE:

arch. Fabio De Falco  
(DFP Engineering srl)

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

PROFESSIONISTA RESPONSABILE:

Ing. Gian Paolo Vassallo  
(Rina Consulting SpA)

SPAZIO PER APPROVAZIONE:

NOME FILE  
CODICE  
ELAB.

NAB0726-ADM-NAB000726-XX-PR-Z-DZR001

REVISIONE

01

SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Recepimento commenti PdS	24 novembre 2021	Sebastiano Paparone	Federico Barabino	Gian Paolo Vassallo
00	prima emissione	22 marzo 2021	Sebastiano Paparone	Federico Barabino	Gian Paolo Vassallo
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## 1 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Si riporta di seguito l'elenco delle WBS principali previste dal progetto fino al quarto livello, che saranno utilizzate come riferimento all'interno del documento e del cronoprogramma.

LIVELLO 2	Fabbricati	Note
NAB0726	Sistemazioni Esterne ed Opere Generali di lotto	include le attività generali di preparazione del sito (es. demolizioni), e le opere non riferibili ai singoli fabbricati, quali allacciamenti, viabilità, etc.
NA1025013	Edificio A - Uffici Amministrativi e Gabinetto di Polizia Scientifica	ex edificio 1
NA1025014	Edificio B - IV Reparto Mobile	ex edificio 2
NA1025015	Edificio C - Uffici e Aree Mediche	ex edificio 3
NA1025016	Edificio G - Alloggi collettivi	ex edificio 4
NA1025017	Edificio F - Uffici aperti al Pubblico	ex edificio 5
NA1025018	Edificio E - Uffici aperti al Pubblico	ex edificio 6
NA1025019	Edificio D - Auditorium e Aree Didattiche	ex edificio 7
NA1025020	Edificio M - Mensa, Bar e Palestra	ex edificio 8
NA1025021	Alloggi Individuali	ex edificio 9
NA1025022	Edificio H - Reparto Cinofili, Artificieri e Tiratori	ex edificio 10
NA1025023	Edificio L - Officina e Uffici Gestione	ex edificio 11
NA1025024	Edificio I - Parcheggio	ex edificio 12
NA1025025	Edificio N - Vigilanza	ex edificio 13
NA1025010	Asilo, Museo e Spazi Comuni	edificio da ristrutturare

LIVELLO 3	Classi di unità tecnologiche	Note
OS	Opere strutturali	includono la preparazione del sito
OC	Opere civili	includono facciate ed elevatori
SE	Sistemazioni esterne	
VI	Viabilità	
IM	Impianti meccanici	
II	Impianti idrici	includono solare termico
IE	Impianti elettrici	includono automazione e supervisione ed impianti e fotovoltaico



LIVELLO 4	Unità tecnologiche	Classi	Note
A	Preparazione del sito	OS	include demolizioni, bonifiche, movimenti di terra
B	Strutture di fondazione	OS	include eventuali impermeabilizzazioni delle strutture contro terra e le strutture delle vasche idriche in c.a.
C	Strutture di elevazione	OS	include tutte le strutture secondarie ad esempio delle scale di servizio, delle pensiline, dei grigliati, etc.
D	Opere murarie	OC	sono tutte le lavorazioni di natura muraria cosiddette "bagnate"
E	Facciate e rivestimenti di facciata	OC	facciate continue, facciate ventilate, rivestimenti ed intonaci di facciata inclusi gli eventuali coibenti
F	Serramenti esterni	OC	include lucernai, pozzi di luce e simili, non include i serramenti integrati nei sistemi di facciata
G	Coperture, gronde, pluviali	OC	include tutti i pacchetti di copertura, i tetti, i sistemi di gronda, le pluviali, le scossaline, etc.
H	Partizioni interne	OC	include tutte le pareti e le contropareti a secco, le pareti tecniche e simili
I	Rivestimenti interni	OC	tutti i pacchetti di rivestimento delle pareti interne, inclusi eventuali coibenti e simili
J	Serramenti interni	OC	include botole, portelli di accesso cavedi e simili
K	Rivestimenti di soffitto e c/soffitti	OC	include materassini acustici ed eventuali isolanti termici
L	Pavimenti e sottofondi	OC	include tutti i pacchetti di pavimentazione, inclusi eventuali coibenti, impermeabilizzazioni e simili
M	Protezioni e delimitazioni	OC	ringhiere, corrimano, parapetti, pensiline ed altri elementi non diversamente classificabili
N	Attrezzature ed arredi	OC	solo quelli inclusi in appalto, fra cui apparecchi sanitari, rubinetterie ed arredo bagno
O	Opere esterne ed a verde	SE	tutte le opere esterne non strutturali o impiantistiche
P	Opere stradali	VI	includono i movimenti di terra propri, fondazione, corpo e pavimentazione stradale, cordoni, segnaletica, etc.
Q	Impianti elevatori	OC	ascensori e scale mobili
R	Impianti HVAC	IM	includono le centrali di cogenerazione
S	Impianti idrici	II	includono centrali idriche, vasche di accumulo prefabbricate, solare termico
T	Impianti di smaltimento	II	includono le reti pluviali, le reti fognarie, gli eventuali disoleatori
U	Impianti antincendio	II	includono centrali antincendio e vasche di accumulo prefabbricate, estintori, segnalazioni delle vie di esodo
V	Impianti gas	II	includono eventuali bombolai
W	Automazione e supervisione impianti	IE	regolazione, BMS, etc.
X	Impianti elettrici	IE	include continuità, elettrogeni, fotovoltaico
Y	Sistemi di illuminazione	IE	solo i corpi illuminanti; per quelli stradali sono inclusi i supporti
Z	Impianti speciali	IE	include eventuali sistemi di automazione parcheggi, ricarica veicoli elettrici e simili


Di seguito è riportato uno schema delle Funzioni e in maniera indicativa dei Reparti associati ad ogni edificio, nonché la comparazione con la vecchia codifica utilizzata nel progetto preliminare.

EDIFICI	N. PIANI FUORI TERRA	
Ex Edificio 1: NA 1025013	13 piani	Uffici amministrativi e gabinetto Polizia scientifica
Ex Edificio 2: NA 1025014	4 piani	IV Reparto mobile
Ex Edificio 3: NA 1025015	3 piani	Uffici e aree mediche
Ex Edificio 4: NA 1025016	5 piani	Alloggi collettivi
Ex Edifici: 5-6: NA 1025017 e NA 1025018	3 piani	Uffici aperti al pubblico
Ex Edificio 7: NA 1025019	2 piani	Auditorium e aule didattiche
Ex Edificio 8: NA 1025020	2 piani	Mensa – bar e palestre
Ex Edificio 9: NA 1025021	4 piani	Alloggi individuali
Ex Edificio 10: NA 1025022	2 piani	Reparto cinofili, artificieri e tiratori
Ex Edificio 11: NA 1025023	4 piani	Officina e uffici gestioni
Ex Edificio 12: NA 1025024	4 piani	Autorimesse, parcheggi
Ex Edificio 13: NA 1025025	2 piani	Vigilanza
Ex Edificio 14: NA 1025010	1 piani (da ristrutturare)	Asilo, museo e spazi comuni

### SEQUENZA DELLE LAVORAZIONI

Per l'esecuzione dei lavori risultano necessari **1394 gg** naturali e consecutivi

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA (mesi)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale bonifica bellica</li> <li>Preparazione dell'area di cantiere e cantierizzazione</li> <li>Demolizioni degli edifici esistenti</li> <li>Realizzazione pali di fondazione per l'Edificio NA 1025013</li> <li>Scavi piano interrato per tutti gli edifici nuovi da realizzare</li> <li>Scavi per Tunnel tecnologico</li> <li>Realizzazione del Tunnel Tecnologico interrato</li> <li>Realizzazione fondazioni e struttura portante dei piani interrati per gli edifici</li> <li>Rinterri ove necessario al fine di avere un unico "campo libero" su tutta la superficie planimetrica del Lotto al piano strada.</li> </ul>	9
2	Realizzazione Edificio NA 1025013	27
	Realizzazione Edificio NA 1025019 e NA 1025025	12
	Realizzazione Edificio NA 1025021	10
3	Completamento Edifici NA 1025013 e NA 1025019	
	Realizzazione Edificio NA 1025023 e NA 1025024	13
	Realizzazione Edificio NA 1025015	10
	Realizzazione Edificio NA 1025014	10
4	Completamento Edificio NA 1025013 - NA 1025014 - NA 1025015 - NA 1025023 - NA 1025024	
	Realizzazione Edificio NA 1025016	15
	Realizzazione Edificio NA 1025022	9
5	Completamento Edifici NA 1025022 e NA 1025016	11
	Realizzazione Edifici NA 1025017 - NA 1025018 - NA 1025020	9
	Ristrutturazione Edificio esistente su via Miano NA 1025010	9
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Completamento Edifici NA 1025017 – NA 1025018 – NA 1025020 – NA 1025010</li> <li>Condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere</li> <li>Rete idrica e condotte d'allacciamento alla rete principale urbana</li> <li>Rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica</li> <li>Rete del gas combustibile e relativi condotti d'allacciamento</li> <li>Demolizione muro su via Miano</li> <li>Aree pedonali pavimentate e sistemate a verde con arredo urbano</li> <li>Formazione di fondazione e manto stradale</li> <li>Piantumazione e posa superfici verdi, messa a dimora di piante</li> <li>Recinzioni, ringhiere e parapetti</li> <li>Pubblica illuminazione</li> <li>Pulizia e Smobilizzo del cantiere</li> </ul>	8

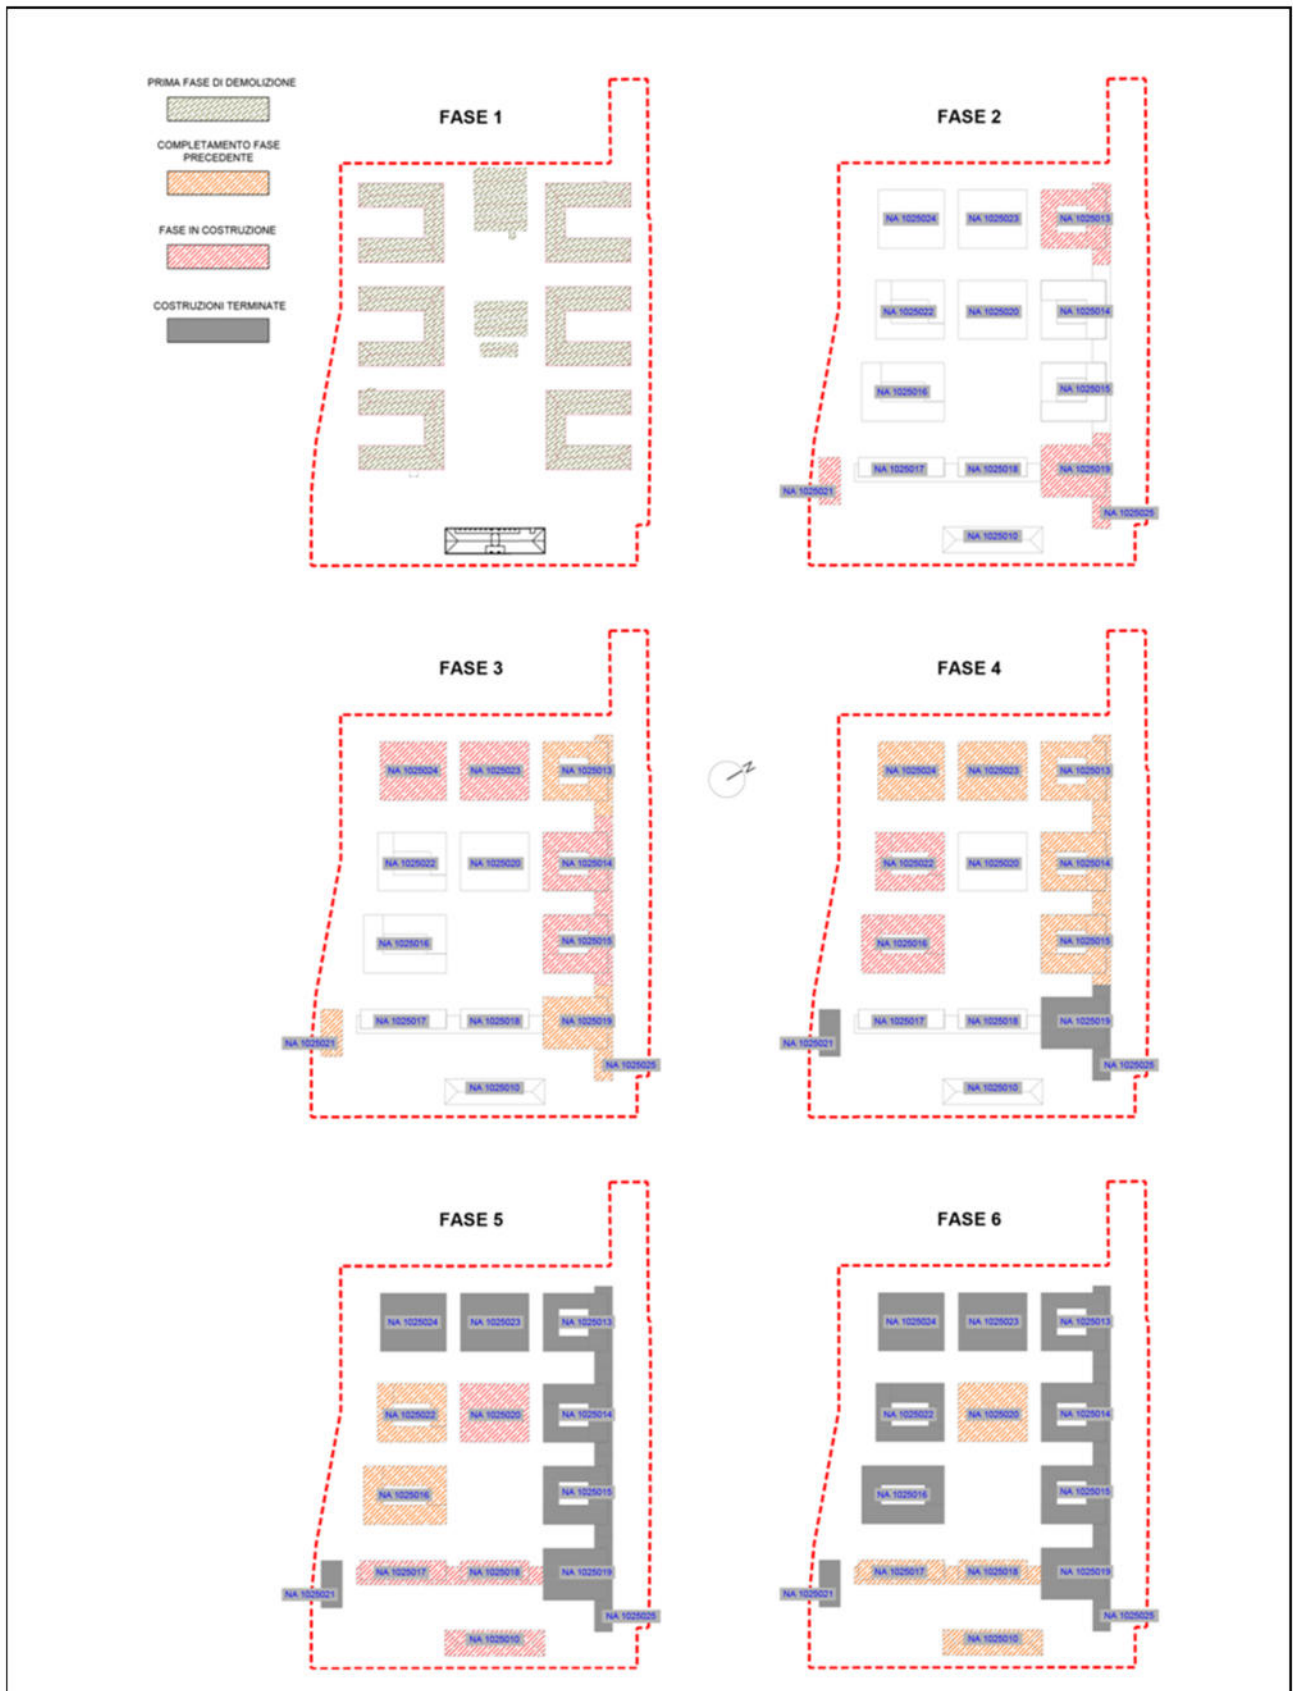

NAB0726-ADM-NAB000726-XX-PR-Z-DZR001 - CRONOPROGRAMMA



AGENZIA DEL  
DEMANIO

Progettazione definitiva per la realizzazione del **"Nuovo Polo del Ministero dell'Interno, Cittadella della Sicurezza"** presso l'immobile demaniale "Caserma Boscariello" sito in Napoli alla via Miano n. 189.




Polizia di Stato

---

Oltre al cronoprogramma viene riportato il grafico rappresentate i progressivi impegni percentuali di spesa necessari per l'esecuzione delle attività.

Nelle successive fasi progettuali il grafico riporterà gli importi derivati dai computi metrici estimativi e recepirà tutti i vincoli contrattuali definiti per la gestione economica dell'appalto.


## COSTO % DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

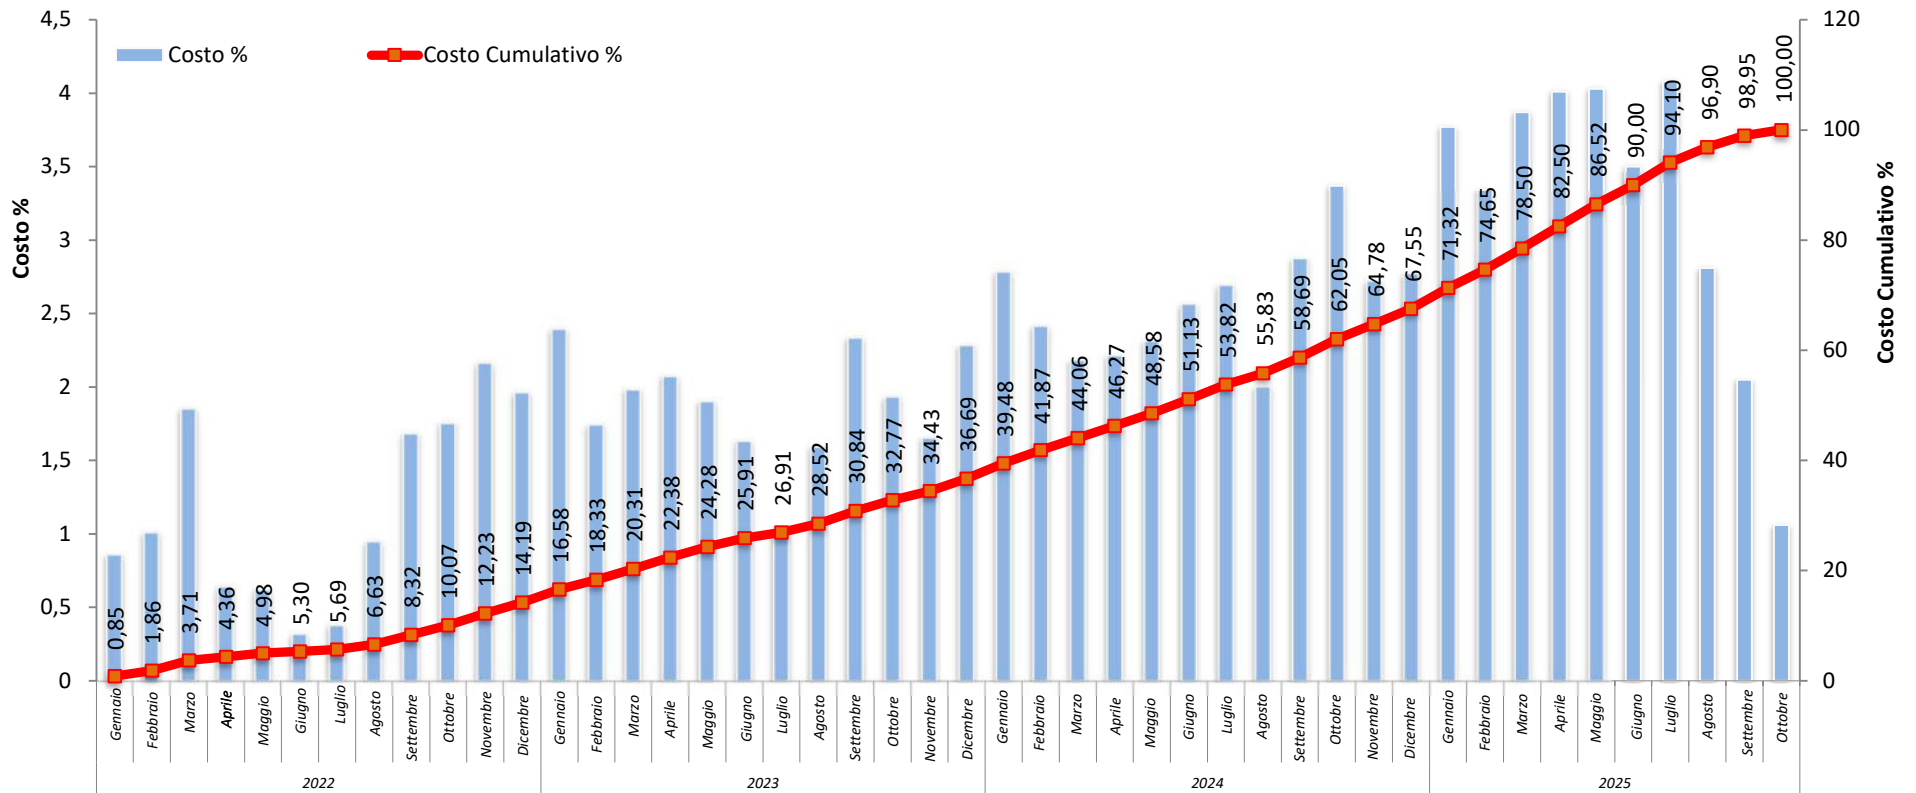



ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
1	📌	<b>Durata</b>	<b>970 days</b>	<b>Mon 03/01/22</b>	<b>Tue 28/10/25</b>	
2	📌	<b>NAB0726 - FASE 1</b>	<b>183 days</b>	<b>Mon 03/01/22</b>	<b>Wed 21/09/22</b>	
3	📌	<b>Consegna dei lavori</b>	<b>14 days</b>	<b>Mon 03/01/22</b>	<b>Fri 21/01/22</b>	
4	📌	Pre-consegna dell'area	1 day	Mon 03/01/22	Mon 03/01/22	
5	📌	Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	14 days	Mon 03/01/22	Fri 21/01/22	
6	📌	Consegna dei lavori	1 day	Tue 18/01/22	Tue 18/01/22	
7	📌	<b>Allestimento di cantiere FASE 1</b>	<b>11 days</b>	<b>Mon 24/01/22</b>	<b>Mon 07/02/22</b>	
8	📌	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 days	Mon 24/01/22	Thu 27/01/22	
9	📌	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	6 days	Mon 24/01/22	Mon 31/01/22	
10	📌	Allestimento Area logistica	8 days	Mon 24/01/22	Wed 02/02/22	
11	📌	Realizzazione della viabilità di cantiere	8 days	Mon 24/01/22	Wed 02/02/22	
12	📌	Allestimento depositi, zone stoccaggio materiali, impianti fissi	6 days	Mon 31/01/22	Mon 07/02/22	
13	📌	<b>OS - Demolizioni e rimozioni FASE 1</b>	<b>45 days</b>	<b>Mon 24/01/22</b>	<b>Fri 25/03/22</b>	
14	📌	OS A - Demolizione e rimozione di interi fabbricati in c.a. con mezzi meccanici	45 days	Mon 24/01/22	Fri 25/03/22	
15	📌	<b>OS - Scavi a sezione obbligata o di sbancamento FASE 1</b>	<b>42 days</b>	<b>Mon 07/02/22</b>	<b>Tue 05/04/22</b>	
16	📌	OS A - Scavo a sezione obbligata o di sbancamento zona edifici	42 days	Mon 07/02/22	Tue 05/04/22	
17	📌	OS A - Scavo a sezione obbligata o di sbancamento per Tunnel Tecnologico	13 days	Mon 14/03/22	Wed 30/03/22	
18	📌	<b>OS - IM - II - IE - Fondazioni FASE 1</b>	<b>113 days</b>	<b>Mon 21/02/22</b>	<b>Mon 01/08/22</b>	
19	📌	OS B - Carpenteria, posa ferri, getto in cls e isolatori sismici per fondazioni edifici	60 days	Mon 14/03/22	Wed 08/06/22	
20	📌	OS B - Perforazioni, posa ferri e getto in cls per pali trivellati di NA1025013	36 days	Mon 21/02/22	Mon 11/04/22	
21	📌	OS B - Impermeabilizzazione di pareti controterra	23 days	Mon 30/05/22	Thu 30/06/22	
22	📌	OS B - Carpenteria, posa ferri e Getto in cls per fondazioni Tunnel Tecnologico	17 days	Mon 20/06/22	Tue 12/07/22	
23	📌	IM R - II S - II V - IE X - Predisposizione allacciamenti impianti di rete	20 days	Tue 05/07/22	Mon 01/08/22	
24	📌	<b>OS - Strutture in c.a. piani interrati edifici FASE 1</b>	<b>41 days</b>	<b>Tue 26/07/22</b>	<b>Wed 21/09/22</b>	
25	📌	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	41 days	Tue 26/07/22	Wed 21/09/22	
26	📌	<b>OS - Strutture in c.a. piani interrati Tunnel Tecnologico FASE 1</b>	<b>18 days</b>	<b>Tue 26/07/22</b>	<b>Fri 19/08/22</b>	
27	📌	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	18 days	Tue 26/07/22	Fri 19/08/22	
28	📌	<b>NA1025013 REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 2</b>	<b>574 days</b>	<b>Mon 29/08/22</b>	<b>Fri 29/11/24</b>	
29	📌	<b>OS - OC - Strutture in elevazione e copertura FASE 2</b>	<b>199 days</b>	<b>Mon 29/08/22</b>	<b>Mon 12/06/23</b>	
30	📌	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	113 days	Mon 29/08/22	Mon 06/02/23	
31	📌	OS C - Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	84 days	Mon 14/11/22	Mon 13/03/23	
32	📌	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	31 days	Mon 27/02/23	Tue 11/04/23	
33	📌	OC G - Realizzazione di copertura	47 days	Mon 03/04/23	Mon 12/06/23	
34	📌	<b>OC - Tamponature FASE 2</b>	<b>92 days</b>	<b>Mon 22/05/23</b>	<b>Thu 28/09/23</b>	
35	📌	OC D - Realizzazione di tamponature	49 days	Mon 22/05/23	Fri 28/07/23	
36	📌	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	58 days	Mon 10/07/23	Thu 28/09/23	
37	📌	<b>OC - Facciata continua FASE 2</b>	<b>28 days</b>	<b>Mon 04/09/23</b>	<b>Wed 11/10/23</b>	
38	📌	OC E - Montaggio di facciata continua	28 days	Mon 04/09/23	Wed 11/10/23	
39	📌	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 2</b>	<b>151 days</b>	<b>Tue 05/09/23</b>	<b>Mon 08/04/24</b>	
40	📌	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	17 days	Tue 05/09/23	Wed 27/09/23	
41	📌	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	43 days	Mon 11/09/23	Thu 09/11/23	
42	📌	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	10 days	Mon 30/10/23	Mon 13/11/23	
43	📌	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	58 days	Mon 30/10/23	Mon 22/01/24	
44	📌	II U - Realizzazione di impianto antincendio	39 days	Tue 12/12/23	Mon 05/02/24	
45	📌	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	60 days	Mon 15/01/24	Mon 08/04/24	
46	📌	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	14 days	Mon 19/02/24	Thu 07/03/24	
47	📌	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 2</b>	<b>66 days</b>	<b>Tue 19/03/24</b>	<b>Fri 21/06/24</b>	
48	📌	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	54 days	Tue 19/03/24	Wed 05/06/24	
49	📌	OC H - Realizzazione di partizioni interne	47 days	Tue 16/04/24	Fri 21/06/24	
50	📌	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 2</b>	<b>91 days</b>	<b>Mon 03/06/24</b>	<b>Tue 08/10/24</b>	
51	📌	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	39 days	Mon 03/06/24	Thu 25/07/24	
52	📌	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	30 days	Tue 25/06/24	Mon 05/08/24	
53	📌	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	60 days	Tue 16/07/24	Tue 08/10/24	
54	📌	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 2</b>	<b>54 days</b>	<b>Mon 16/09/24</b>	<b>Fri 29/11/24</b>	
55	📌	OC J - Montaggio di serramenti interni	40 days	Mon 16/09/24	Mon 11/11/24	
56	📌	OC F - Montaggio di serramenti esterni	44 days	Mon 30/09/24	Fri 29/11/24	
57	📌	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	24 days	Tue 22/10/24	Mon 25/11/24	

M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47

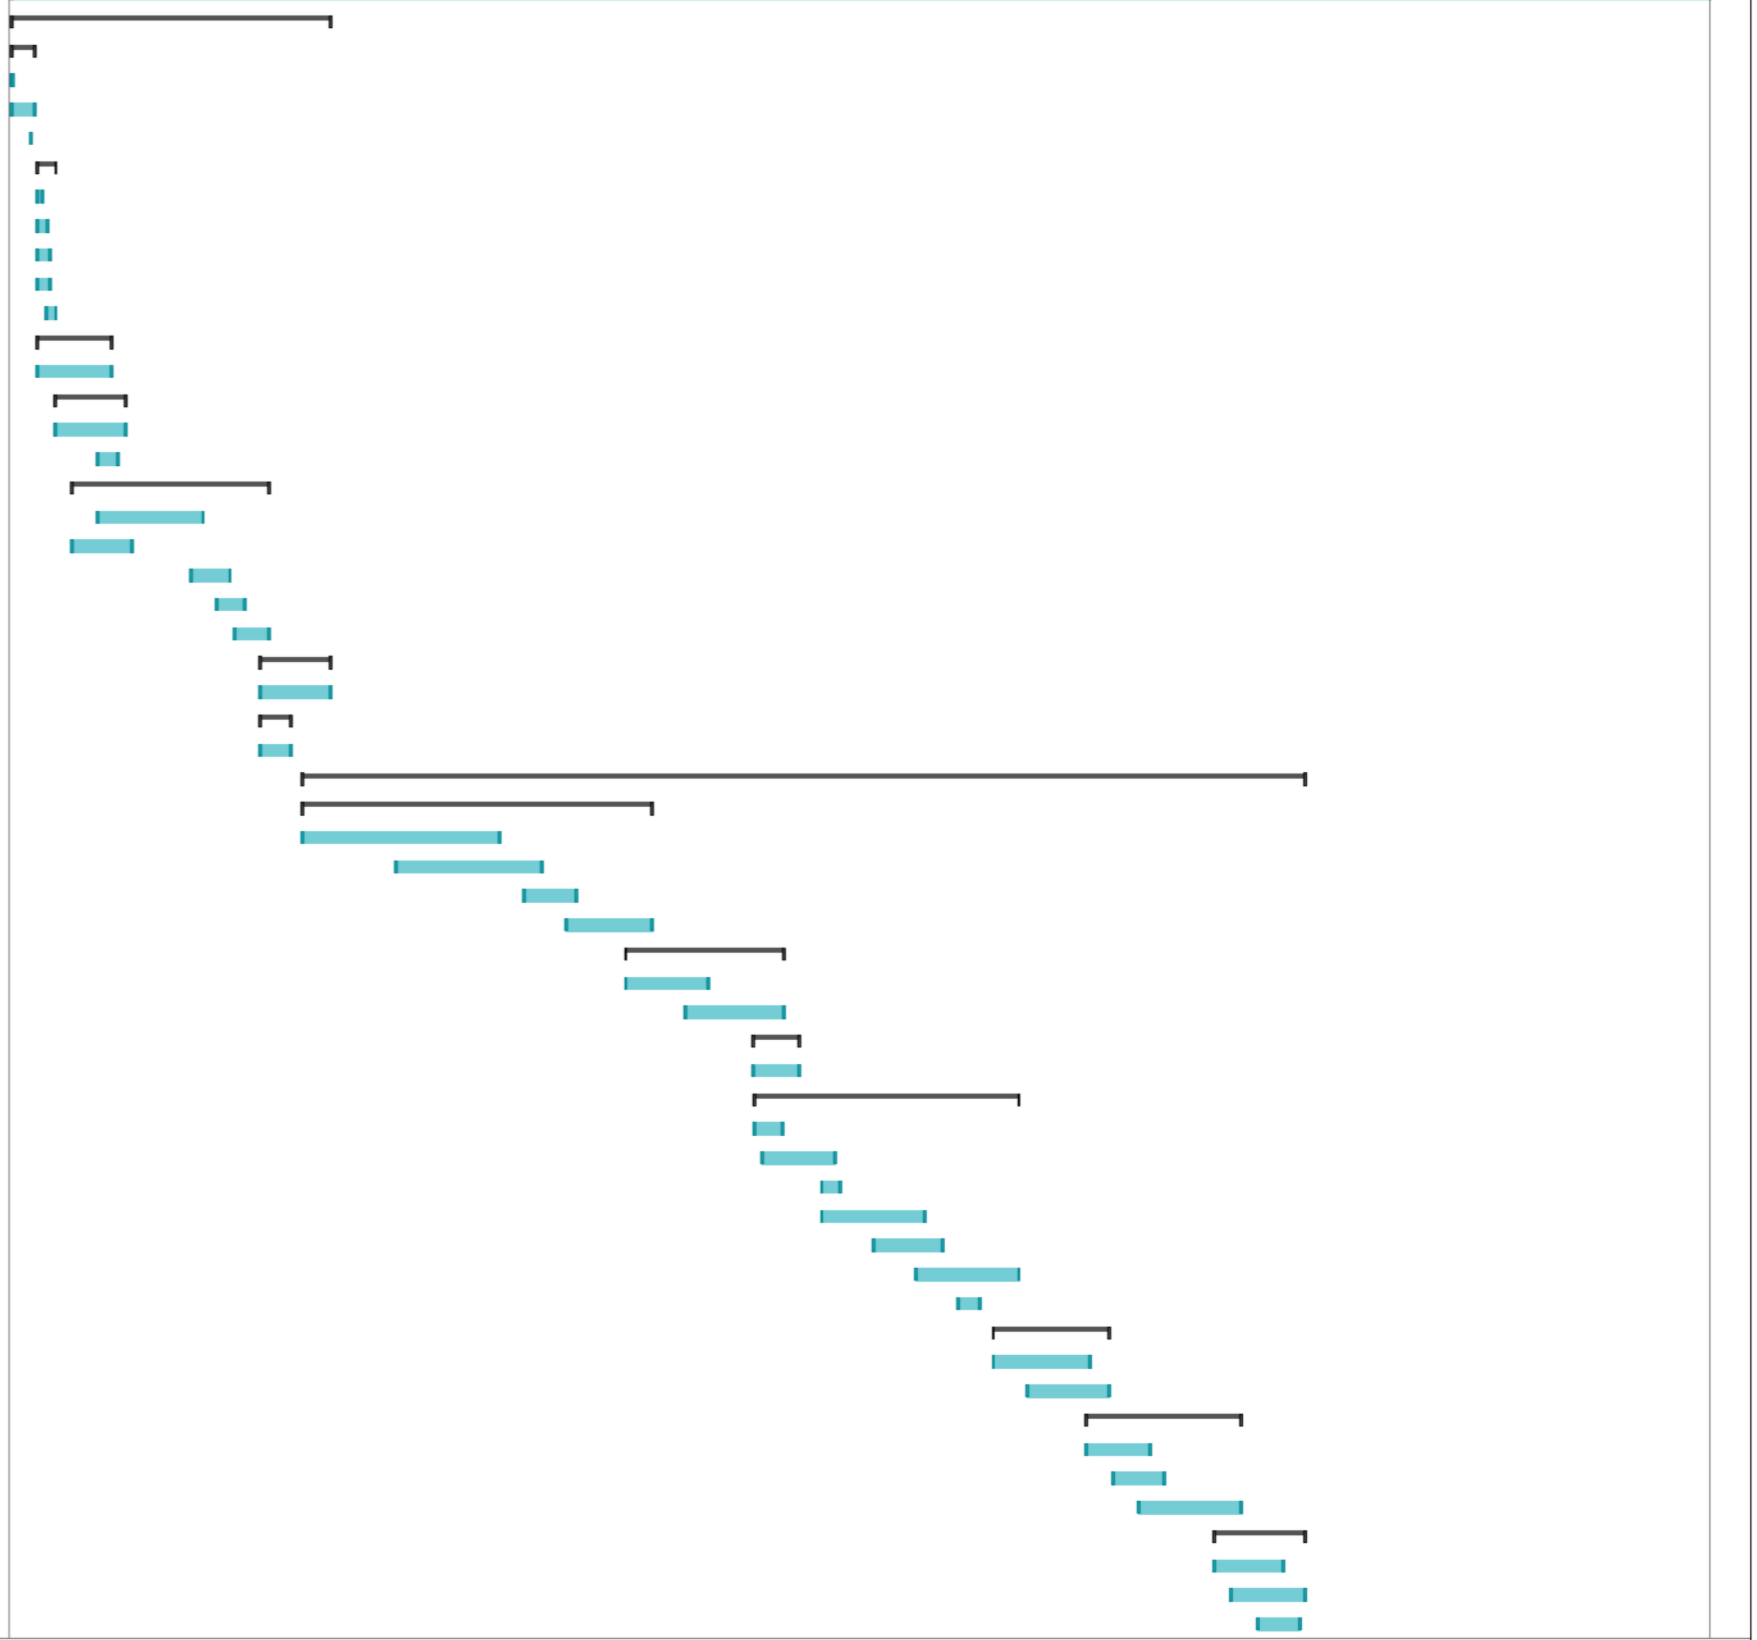


Project: Projec Date: Thu 18/0

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
58		<b>NA1025019 - NA1025025 - REALIZZAZIONE EDIFICI - FASE 2</b>	264 days	Mon 29/08/22	Tue 12/09/23	
59		<b>OS - OC - Strutture in elevazione e copertura FASE 2</b>	77 days	Mon 29/08/22	Thu 15/12/22	
60		OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	52 days	Mon 29/08/22	Wed 09/11/22	
61		OS C - Montaggio di strutture in acciaio	21 days	Mon 17/10/22	Tue 15/11/22	
62		OC G - Realizzazione di copertura	31 days	Wed 02/11/22	Thu 15/12/22	
63		<b>OC - Tamponature FASE 2</b>	41 days	Mon 28/11/22	Wed 25/01/23	
64		OC D - Realizzazione di tamponature	24 days	Mon 28/11/22	Fri 30/12/22	
65		OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	27 days	Mon 19/12/22	Wed 25/01/23	
66		<b>OC - Facciata continua FASE 2</b>	14 days	Tue 10/01/23	Fri 27/01/23	
67		OC E - Montaggio di facciata continua	14 days	Tue 10/01/23	Fri 27/01/23	
68		<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 2</b>	64 days	Mon 23/01/23	Fri 21/04/23	
69		OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	8 days	Mon 23/01/23	Wed 01/02/23	
70		II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	19 days	Mon 30/01/23	Thu 23/02/23	
71		II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	6 days	Mon 13/02/23	Mon 20/02/23	
72		IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	22 days	Mon 20/02/23	Tue 21/03/23	
73		II U - Realizzazione di impianto antincendio	12 days	Mon 20/03/23	Tue 04/04/23	
74		IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	18 days	Tue 28/03/23	Fri 21/04/23	
75		IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Mon 03/04/23	Wed 12/04/23	
76		<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 2</b>	38 days	Mon 03/04/23	Mon 29/05/23	
77		OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	22 days	Mon 03/04/23	Fri 05/05/23	
78		OC H - Realizzazione di partizioni interne	23 days	Wed 26/04/23	Mon 29/05/23	
79		<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 2</b>	52 days	Mon 22/05/23	Wed 02/08/23	
80		OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	19 days	Mon 22/05/23	Fri 16/06/23	
81		OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	17 days	Mon 12/06/23	Tue 04/07/23	
82		OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	27 days	Tue 27/06/23	Wed 02/08/23	
83		<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 2</b>	31 days	Mon 31/07/23	Tue 12/09/23	
84		OC J - Montaggio di serramenti interni	14 days	Mon 31/07/23	Fri 18/08/23	
85		OC F - Montaggio di serramenti esterni	17 days	Mon 21/08/23	Tue 12/09/23	
86		OC M - Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Mon 21/08/23	Thu 07/09/23	
87		<b>NA1025021 - REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 2</b>	203 days	Mon 29/08/22	Fri 16/06/23	
88		<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 2</b>	62 days	Mon 29/08/22	Wed 23/11/22	
89		OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	39 days	Mon 29/08/22	Thu 20/10/22	
90		OS C - Montaggio di strutture in acciaio	11 days	Tue 11/10/22	Tue 25/10/22	
91		OC G - Realizzazione di copertura	22 days	Mon 24/10/22	Wed 23/11/22	
92		<b>OC - Tamponature FASE 2</b>	31 days	Mon 07/11/22	Tue 20/12/22	
93		OC D - Realizzazione di tamponature	18 days	Mon 07/11/22	Wed 30/11/22	
94		OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	20 days	Tue 22/11/22	Tue 20/12/22	
95		<b>OC - Facciata continua FASE 2</b>	11 days	Tue 13/12/22	Tue 27/12/22	
96		OC E - Montaggio di facciata continua	11 days	Tue 13/12/22	Tue 27/12/22	
97		<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 2</b>	53 days	Mon 19/12/22	Thu 02/03/23	
98		OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	7 days	Mon 19/12/22	Tue 27/12/22	
99		II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari	14 days	Wed 28/12/22	Tue 17/01/23	
100		II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	5 days	Mon 16/01/23	Fri 20/01/23	
101		IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	15 days	Mon 23/01/23	Fri 10/02/23	
102		II U - Realizzazione di impianto antincendio	8 days	Tue 07/02/23	Thu 16/02/23	
103		IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	13 days	Tue 14/02/23	Thu 02/03/23	
104		IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Tue 21/02/23	Wed 01/03/23	
105		<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 2</b>	30 days	Tue 28/02/23	Tue 11/04/23	
106		OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Tue 28/02/23	Tue 21/03/23	
107		OC H - Realizzazione di partizioni interne	16 days	Mon 20/03/23	Tue 11/04/23	
108		<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 2</b>	39 days	Tue 28/03/23	Wed 24/05/23	
109		OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Tue 28/03/23	Mon 17/04/23	
110		OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Tue 18/04/23	Mon 08/05/23	
111		OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Wed 26/04/23	Wed 24/05/23	
112		<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 2</b>	23 days	Tue 16/05/23	Fri 16/06/23	
113		OC J - Montaggio di serramenti interni	11 days	Tue 16/05/23	Tue 30/05/23	
114		OC F - Montaggio di serramenti esterni	13 days	Mon 29/05/23	Thu 15/06/23	


M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47

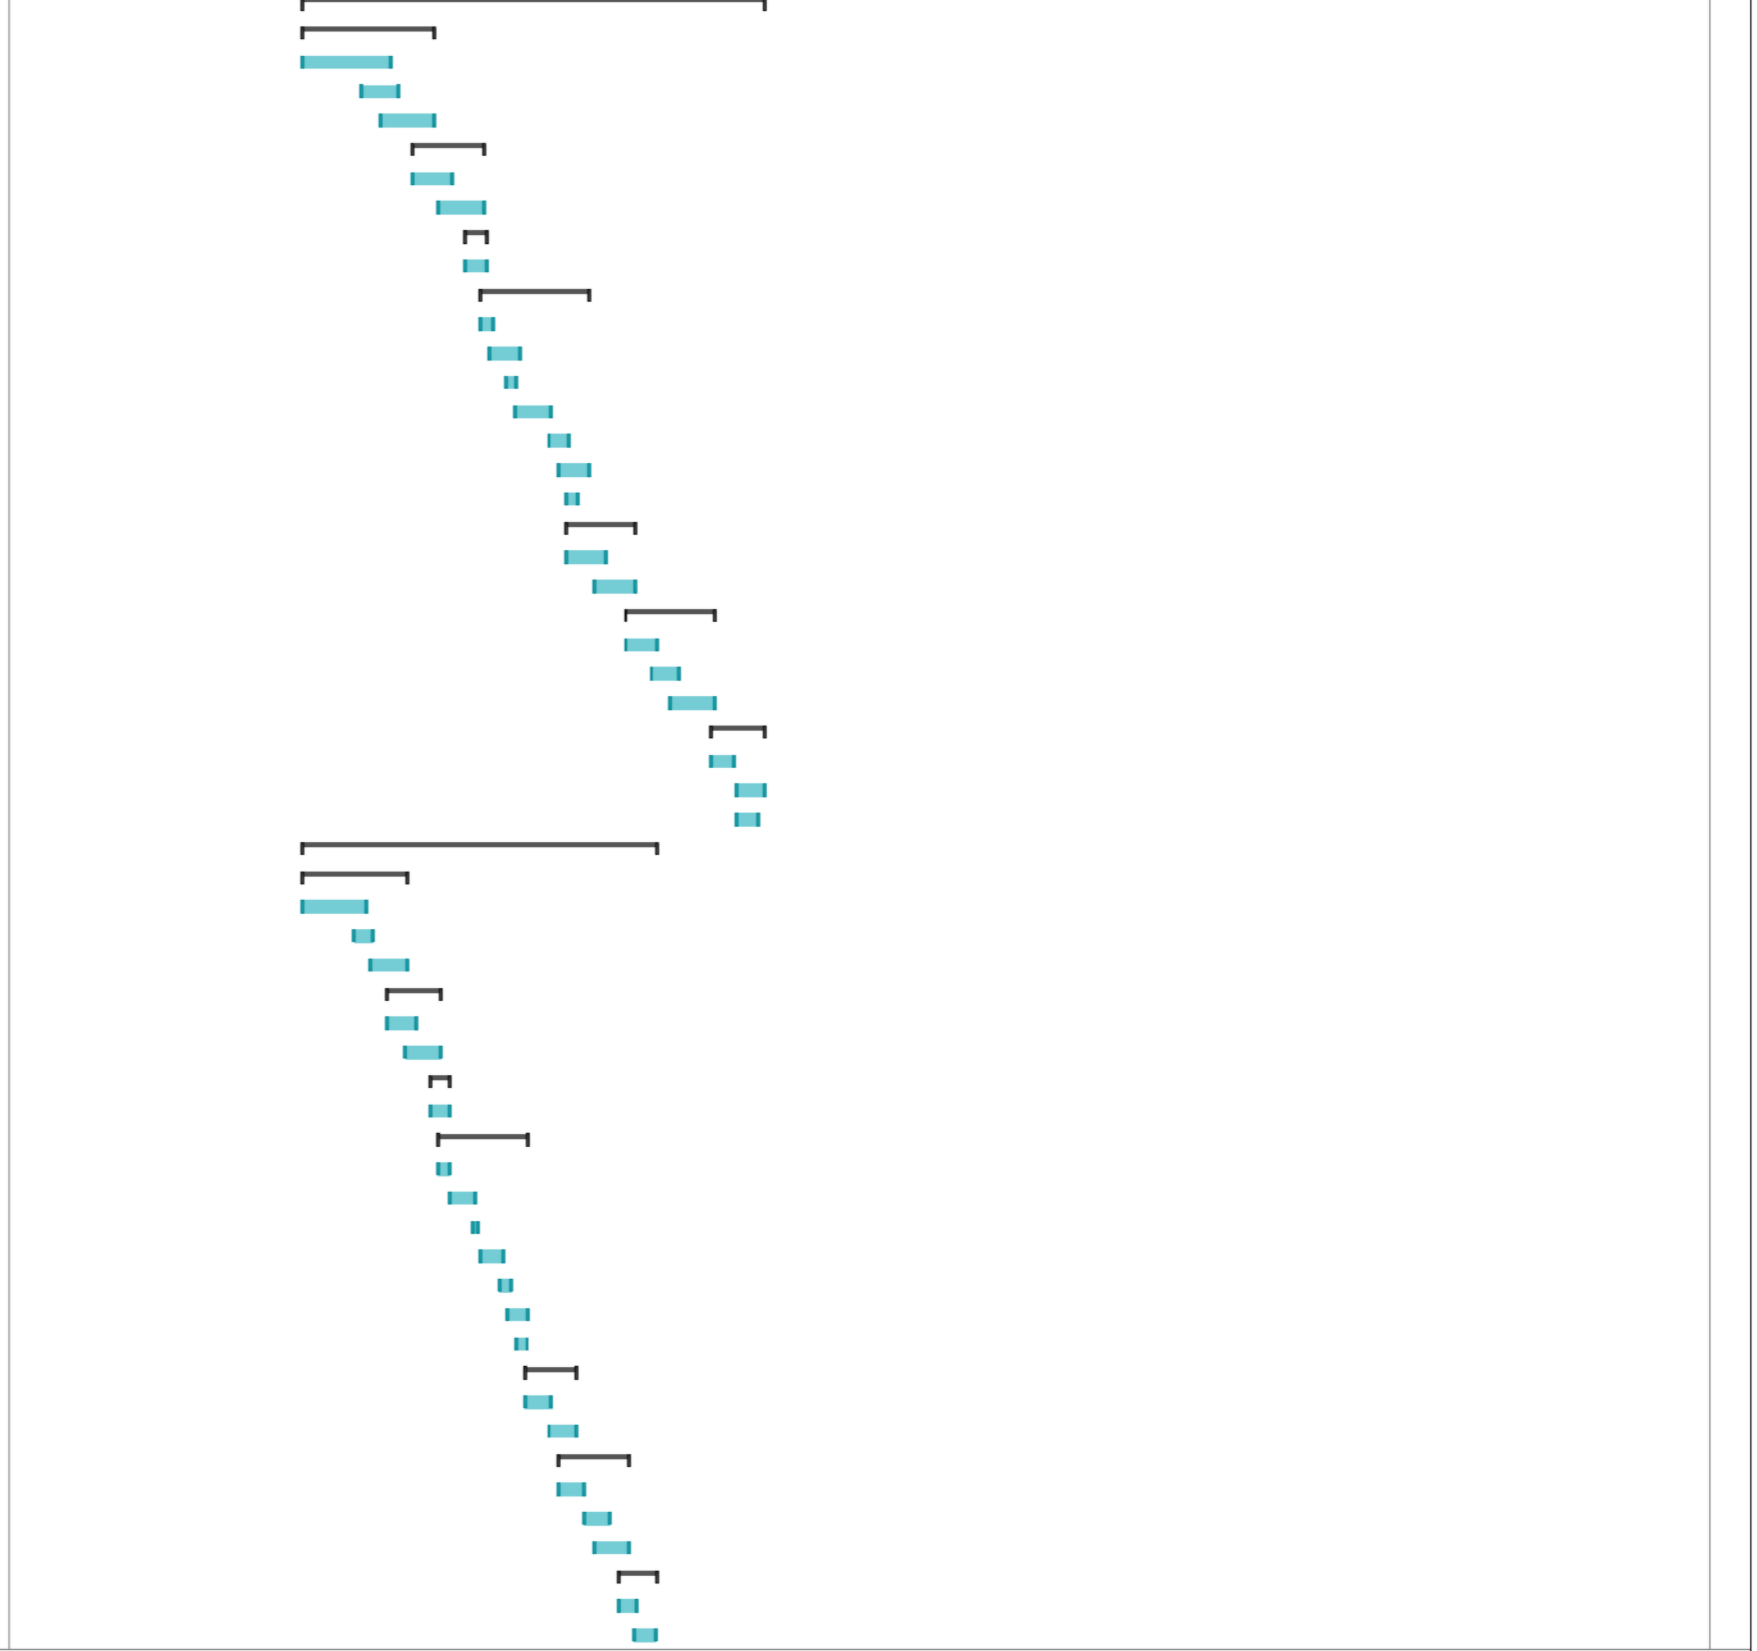

Project: Projec Date: Thu 18/0	Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress
	Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		
	Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress		

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
115	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Mon 29/05/23	Fri 16/06/23	
116	📁	<b>NA1025023 - NA1025024 - REALIZZAZIONE EDIFICI - FASE 3</b>	<b>283 days</b>	<b>Mon 12/06/23</b>	<b>Fri 19/07/24</b>	
117	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 3</b>	<b>91 days</b>	<b>Mon 12/06/23</b>	<b>Tue 17/10/23</b>	
118	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	58 days	Mon 12/06/23	Thu 31/08/23	
119	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	24 days	Mon 21/08/23	Thu 21/09/23	
120	➔	OC G - Realizzazione di copertura	37 days	Mon 28/08/23	Tue 17/10/23	
121	📁	<b>OC - Tamponature FASE 3</b>	<b>44 days</b>	<b>Mon 25/09/23</b>	<b>Fri 24/11/23</b>	
122	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	27 days	Mon 25/09/23	Tue 31/10/23	
123	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	29 days	Mon 16/10/23	Fri 24/11/23	
124	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 3</b>	<b>69 days</b>	<b>Mon 20/11/23</b>	<b>Mon 26/02/24</b>	
125	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	12 days	Mon 20/11/23	Tue 05/12/23	
126	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	22 days	Mon 27/11/23	Thu 28/12/23	
127	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	8 days	Tue 12/12/23	Thu 21/12/23	
128	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	26 days	Mon 18/12/23	Tue 23/01/24	
129	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	14 days	Mon 15/01/24	Thu 01/02/24	
130	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	21 days	Mon 29/01/24	Mon 26/02/24	
131	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	10 days	Mon 05/02/24	Fri 16/02/24	
132	➔	IE X - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	14 days	Tue 12/12/23	Mon 01/01/24	
133	➔	II S - Realizzazione di impianto solare termico	10 days	Thu 28/12/23	Wed 10/01/24	
134	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 3</b>	<b>39 days</b>	<b>Tue 30/01/24</b>	<b>Fri 22/03/24</b>	
135	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	25 days	Tue 30/01/24	Mon 04/03/24	
136	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	25 days	Mon 19/02/24	Fri 22/03/24	
137	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 3</b>	<b>64 days</b>	<b>Mon 18/03/24</b>	<b>Tue 18/06/24</b>	
138	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	23 days	Mon 18/03/24	Thu 18/04/24	
139	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	19 days	Tue 09/04/24	Tue 07/05/24	
140	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	35 days	Tue 30/04/24	Tue 18/06/24	
141	📁	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 3</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 10/06/24</b>	<b>Fri 19/07/24</b>	
142	➔	OC J - Montaggio di serramenti interni	17 days	Mon 10/06/24	Tue 02/07/24	
143	➔	OC F - Montaggio di serramenti esterni	20 days	Mon 24/06/24	Fri 19/07/24	
144	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	22 days	Mon 17/06/24	Tue 16/07/24	
145	📁	<b>NA1025015 - REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 3</b>	<b>213 days</b>	<b>Mon 28/08/23</b>	<b>Thu 27/06/24</b>	
146	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 3</b>	<b>62 days</b>	<b>Mon 28/08/23</b>	<b>Wed 22/11/23</b>	
147	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	36 days	Mon 28/08/23	Mon 16/10/23	
148	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	11 days	Tue 10/10/23	Tue 24/10/23	
149	➔	OC G - Realizzazione di copertura	22 days	Mon 23/10/23	Wed 22/11/23	
150	📁	<b>OC - Tamponature FASE 3</b>	<b>37 days</b>	<b>Mon 13/11/23</b>	<b>Thu 04/01/24</b>	
151	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	22 days	Mon 13/11/23	Wed 13/12/23	
152	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	22 days	Mon 04/12/23	Thu 04/01/24	
153	📁	<b>OC - Facciata continua FASE 3</b>	<b>14 days</b>	<b>Thu 28/12/23</b>	<b>Tue 16/01/24</b>	
154	➔	OC E - Montaggio di facciata continua	14 days	Thu 28/12/23	Tue 16/01/24	
155	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 3</b>	<b>53 days</b>	<b>Mon 01/01/24</b>	<b>Wed 13/03/24</b>	
156	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	7 days	Mon 01/01/24	Tue 09/01/24	
157	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	14 days	Mon 08/01/24	Thu 25/01/24	
158	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	5 days	Mon 22/01/24	Fri 26/01/24	
159	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	15 days	Mon 29/01/24	Fri 16/02/24	
160	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	8 days	Mon 19/02/24	Wed 28/02/24	
161	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	13 days	Mon 26/02/24	Wed 13/03/24	
162	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Mon 04/03/24	Tue 12/03/24	
163	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 3</b>	<b>26 days</b>	<b>Mon 11/03/24</b>	<b>Tue 16/04/24</b>	
164	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Mon 11/03/24	Tue 02/04/24	
165	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	16 days	Mon 25/03/24	Tue 16/04/24	
166	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 3</b>	<b>37 days</b>	<b>Tue 09/04/24</b>	<b>Fri 31/05/24</b>	
167	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Tue 09/04/24	Mon 29/04/24	
168	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Tue 23/04/24	Mon 13/05/24	
169	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Mon 06/05/24	Fri 31/05/24	
170	📁	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 3</b>	<b>24 days</b>	<b>Mon 27/05/24</b>	<b>Thu 27/06/24</b>	
171	➔	OC J - Montaggio di serramenti interni	12 days	Mon 27/05/24	Tue 11/06/24	


M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47

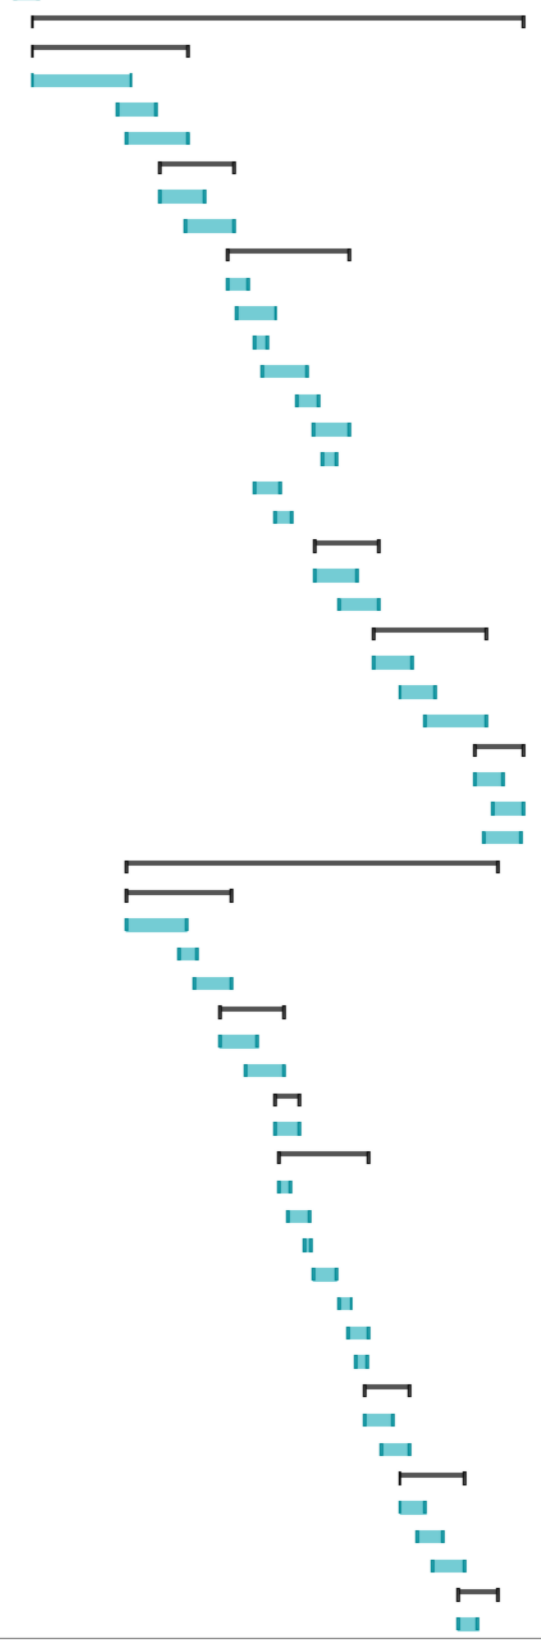

Project: Projec Date: Thu 18/0	Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
	Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
172	➔	OC F - Montaggio di serramenti esterni	13 days	Mon 10/06/24	Wed 26/06/24	
173	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Mon 10/06/24	Thu 27/06/24	
174	📁	<b>NA1025014 - REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 3</b>	<b>213 days</b>	<b>Mon 20/11/23</b>	<b>Thu 19/09/24</b>	
175	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 3</b>	<b>61 days</b>	<b>Mon 20/11/23</b>	<b>Wed 14/02/24</b>	
176	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	36 days	Mon 20/11/23	Wed 10/01/24	
177	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	11 days	Mon 08/01/24	Mon 22/01/24	
178	➔	OC G - Realizzazione di copertura	22 days	Tue 16/01/24	Wed 14/02/24	
179	📁	<b>OC - Tamponature FASE 3</b>	<b>36 days</b>	<b>Tue 06/02/24</b>	<b>Tue 26/03/24</b>	
180	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	22 days	Tue 06/02/24	Wed 06/03/24	
181	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	22 days	Mon 26/02/24	Tue 26/03/24	
182	📁	<b>OC - Facciata continua FASE 3</b>	<b>14 days</b>	<b>Mon 18/03/24</b>	<b>Fri 05/04/24</b>	
183	➔	OC E - Montaggio di facciata continua	14 days	Mon 18/03/24	Fri 05/04/24	
184	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 3</b>	<b>54 days</b>	<b>Mon 25/03/24</b>	<b>Tue 11/06/24</b>	
185	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	7 days	Mon 25/03/24	Wed 03/04/24	
186	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	14 days	Tue 02/04/24	Fri 19/04/24	
187	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	5 days	Tue 16/04/24	Mon 22/04/24	
188	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	15 days	Tue 23/04/24	Wed 15/05/24	
189	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	8 days	Tue 14/05/24	Thu 23/05/24	
190	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	13 days	Tue 21/05/24	Thu 06/06/24	
191	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Mon 03/06/24	Tue 11/06/24	
192	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 3</b>	<b>26 days</b>	<b>Mon 10/06/24</b>	<b>Mon 15/07/24</b>	
193	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Mon 10/06/24	Mon 01/07/24	
194	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	16 days	Mon 24/06/24	Mon 15/07/24	
195	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 3</b>	<b>36 days</b>	<b>Mon 08/07/24</b>	<b>Tue 27/08/24</b>	
196	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Mon 08/07/24	Thu 25/07/24	
197	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Mon 22/07/24	Wed 07/08/24	
198	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Tue 30/07/24	Tue 27/08/24	
199	📁	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 3</b>	<b>23 days</b>	<b>Tue 20/08/24</b>	<b>Thu 19/09/24</b>	
200	➔	OC J - Montaggio di serramenti interni	12 days	Tue 20/08/24	Wed 04/09/24	
201	➔	OC F - Montaggio di serramenti esterni	13 days	Tue 03/09/24	Thu 19/09/24	
202	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	11 days	Tue 03/09/24	Tue 17/09/24	
203	📁	<b>NA1025016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 4</b>	<b>326 days</b>	<b>Mon 08/07/24</b>	<b>Thu 16/10/25</b>	
204	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 4</b>	<b>99 days</b>	<b>Mon 08/07/24</b>	<b>Mon 25/11/24</b>	
205	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	72 days	Mon 08/07/24	Wed 16/10/24	
206	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	29 days	Tue 10/09/24	Fri 18/10/24	
207	➔	OC G - Realizzazione di copertura	45 days	Mon 23/09/24	Mon 25/11/24	
208	📁	<b>OC - Tamponature FASE 4</b>	<b>53 days</b>	<b>Mon 21/10/24</b>	<b>Thu 02/01/25</b>	
209	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	36 days	Mon 21/10/24	Tue 10/12/24	
210	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	34 days	Mon 18/11/24	Thu 02/01/25	
211	📁	<b>OC - Facciata continua FASE 4</b>	<b>28 days</b>	<b>Mon 16/12/24</b>	<b>Thu 23/01/25</b>	
212	➔	OC E - Montaggio di facciata continua	28 days	Mon 16/12/24	Thu 23/01/25	
213	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 4</b>	<b>93 days</b>	<b>Tue 31/12/24</b>	<b>Wed 14/05/25</b>	
214	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	15 days	Tue 31/12/24	Tue 21/01/25	
215	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	28 days	Mon 13/01/25	Wed 19/02/25	
216	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	12 days	Mon 03/02/25	Tue 18/02/25	
217	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	33 days	Mon 17/02/25	Wed 02/04/25	
218	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	18 days	Mon 17/03/25	Wed 09/04/25	
219	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	29 days	Tue 01/04/25	Wed 14/05/25	
220	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	13 days	Wed 23/04/25	Tue 13/05/25	
221	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 4</b>	<b>44 days</b>	<b>Tue 22/04/25</b>	<b>Wed 25/06/25</b>	
222	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	32 days	Tue 22/04/25	Mon 09/06/25	
223	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	32 days	Mon 12/05/25	Wed 25/06/25	
224	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 4</b>	<b>66 days</b>	<b>Mon 09/06/25</b>	<b>Tue 09/09/25</b>	
225	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	28 days	Mon 09/06/25	Wed 16/07/25	
226	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	25 days	Mon 30/06/25	Fri 01/08/25	
227	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	41 days	Mon 14/07/25	Tue 09/09/25	
228	📁	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 4</b>	<b>34 days</b>	<b>Mon 01/09/25</b>	<b>Thu 16/10/25</b>	


M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47

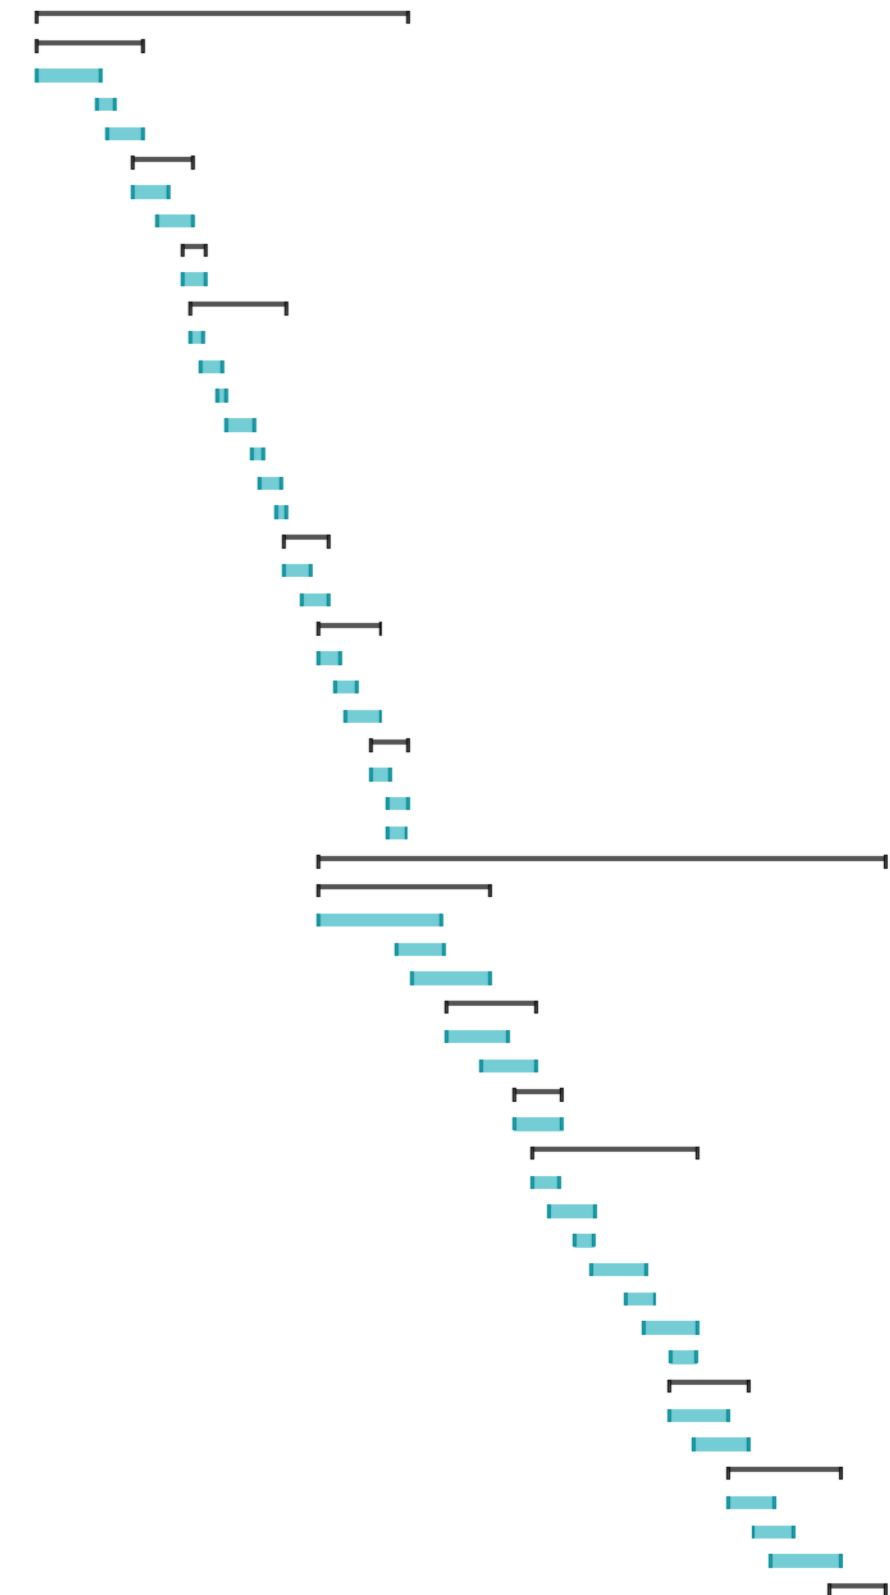

Project: Projec Date: Thu 18/0	Task	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:blue;"></span> Summary	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-top:1px solid black;"></span> Inactive Milestone	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightblue;"></span> Duration-only	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-left:1px solid black;"></span> Start-only	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> External Milestone	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightblue;"></span> Manual Progress
	Split	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-bottom:1px dotted black;"></span> Project Summary	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-top:1px solid black;"></span> Inactive Summary	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-left:1px solid black;"></span> Manual Summary Rollup	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border-right:1px solid black;"></span> Finish-only	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> Deadline	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightblue;"></span> Progress
	Milestone	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> Inactive Task	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> Manual Task	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightblue;"></span> Manual Summary	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> External Tasks	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px solid black;"></span> Progress	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightblue;"></span> Progress

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
229	➔	OC J - Montaggio di serramenti interni	20 days	Mon 01/09/25	Fri 26/09/25	
230	➔	OC F - Montaggio di serramenti esterni	24 days	Mon 15/09/25	Thu 16/10/25	
231	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	20 days	Mon 15/09/25	Fri 10/10/25	
232	📁	<b>NA1025022 - REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 4</b>	<b>190 days</b>	<b>Mon 08/07/24</b>	<b>Wed 02/04/25</b>	
233	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 4</b>	<b>57 days</b>	<b>Mon 08/07/24</b>	<b>Wed 25/09/24</b>	
234	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	40 days	Mon 08/07/24	Mon 02/09/24	
235	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	14 days	Mon 19/08/24	Thu 05/09/24	
236	➔	OC G - Realizzazione di copertura	23 days	Mon 26/08/24	Wed 25/09/24	
237	📁	<b>OC - Tamponature FASE 4</b>	<b>34 days</b>	<b>Mon 09/09/24</b>	<b>Thu 24/10/24</b>	
238	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	24 days	Mon 09/09/24	Thu 10/10/24	
239	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	24 days	Mon 23/09/24	Thu 24/10/24	
240	📁	<b>OC - Facciata continua FASE 4</b>	<b>20 days</b>	<b>Mon 07/10/24</b>	<b>Mon 04/11/24</b>	
241	➔	OC E - Montaggio di facciata continua	20 days	Mon 07/10/24	Mon 04/11/24	
242	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 4</b>	<b>64 days</b>	<b>Tue 22/10/24</b>	<b>Tue 21/01/25</b>	
243	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	12 days	Tue 22/10/24	Thu 07/11/24	
244	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	21 days	Tue 05/11/24	Tue 03/12/24	
245	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	12 days	Tue 19/11/24	Wed 04/12/24	
246	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	22 days	Mon 25/11/24	Tue 24/12/24	
247	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	11 days	Mon 16/12/24	Mon 30/12/24	
248	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	15 days	Tue 24/12/24	Tue 14/01/25	
249	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	11 days	Tue 07/01/25	Tue 21/01/25	
250	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 4</b>	<b>27 days</b>	<b>Mon 13/01/25</b>	<b>Tue 18/02/25</b>	
251	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	23 days	Mon 13/01/25	Wed 12/02/25	
252	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	22 days	Mon 20/01/25	Tue 18/02/25	
253	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 4</b>	<b>33 days</b>	<b>Mon 03/02/25</b>	<b>Wed 19/03/25</b>	
254	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	17 days	Mon 03/02/25	Tue 25/02/25	
255	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	16 days	Mon 10/02/25	Mon 03/03/25	
256	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	22 days	Tue 18/02/25	Wed 19/03/25	
257	📁	<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 4</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 10/03/25</b>	<b>Wed 02/04/25</b>	
258	➔	OC J - Montaggio di serramenti interni	15 days	Mon 10/03/25	Fri 28/03/25	
259	➔	OC F - Montaggio di serramenti esterni	13 days	Mon 17/03/25	Wed 02/04/25	
260	➔	OC M - Posa di ringhiere e parapetti	10 days	Mon 17/03/25	Fri 28/03/25	
261	📁	<b>NA1025017 - NA1025018 - REALIZZAZIONE EDIFICI - FASE 5</b>	<b>226 days</b>	<b>Mon 09/09/24</b>	<b>Tue 29/07/25</b>	
262	📁	<b>OS - OC - Strutture in elevazione FASE 5</b>	<b>68 days</b>	<b>Mon 09/09/24</b>	<b>Thu 12/12/24</b>	
263	➔	OS C - Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	44 days	Mon 09/09/24	Fri 08/11/24	
264	➔	OS C - Montaggio di strutture in acciaio	11 days	Tue 05/11/24	Tue 19/11/24	
265	➔	OC G - Realizzazione di copertura	24 days	Mon 11/11/24	Thu 12/12/24	
266	📁	<b>OC - Tamponature FASE 5</b>	<b>36 days</b>	<b>Mon 02/12/24</b>	<b>Tue 21/01/25</b>	
267	➔	OC D - Realizzazione di tamponature	20 days	Mon 02/12/24	Fri 27/12/24	
268	➔	OC E - Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	20 days	Tue 24/12/24	Tue 21/01/25	
269	📁	<b>OC - Facciata continua FASE 5</b>	<b>13 days</b>	<b>Tue 14/01/25</b>	<b>Thu 30/01/25</b>	
270	➔	OC E - Montaggio di facciata continua	13 days	Tue 14/01/25	Thu 30/01/25	
271	📁	<b>OC - II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 5</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 20/01/25</b>	<b>Fri 11/04/25</b>	
272	➔	OC Q - Realizzazione di impianti elevatori	9 days	Mon 20/01/25	Thu 30/01/25	
273	➔	II S - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	14 days	Tue 28/01/25	Fri 14/02/25	
274	➔	II V - Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	5 days	Mon 17/02/25	Fri 21/02/25	
275	➔	IE X - IE W - Realizzazione di impianto elettrico	18 days	Tue 18/02/25	Thu 13/03/25	
276	➔	II U - Realizzazione di impianto antincendio	10 days	Mon 10/03/25	Fri 21/03/25	
277	➔	IM R - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	20 days	Mon 17/03/25	Fri 11/04/25	
278	➔	IM R - Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Tue 01/04/25	Wed 09/04/25	
279	📁	<b>OC - Pareti divisorie, controsoffittature FASE 5</b>	<b>25 days</b>	<b>Mon 14/04/25</b>	<b>Wed 21/05/25</b>	
280	➔	OC I - OC K - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Mon 14/04/25	Thu 08/05/25	
281	➔	OC H - Realizzazione di partizioni interne	16 days	Tue 29/04/25	Wed 21/05/25	
282	📁	<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 5</b>	<b>39 days</b>	<b>Mon 12/05/25</b>	<b>Fri 04/07/25</b>	
283	➔	OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Mon 12/05/25	Thu 29/05/25	
284	➔	OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Mon 26/05/25	Thu 12/06/25	
285	➔	OC L - OC N - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Mon 09/06/25	Fri 04/07/25	


M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47

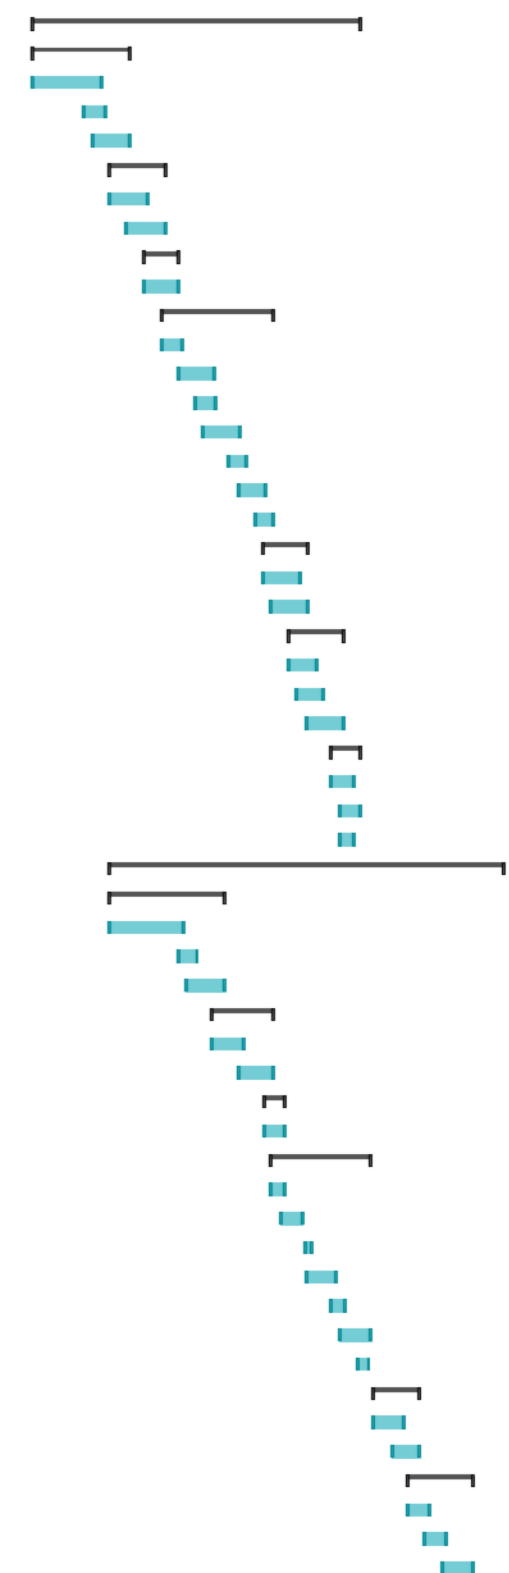

Project: Projec Date: Thu 18/0	Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
	Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
286	OC	Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 5	22 days	Mon 30/06/25	Tue 29/07/25	
287	OC J	Montaggio di serramenti interni	15 days	Mon 30/06/25	Fri 18/07/25	
288	OC F	Montaggio di serramenti esterni	17 days	Mon 07/07/25	Tue 29/07/25	
289	OC M	Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Mon 07/07/25	Thu 24/07/25	
290	NA1025020	REALIZZAZIONE EDIFICIO - FASE 5	185 days	Mon 09/12/24	Mon 01/09/25	
291	OS	OC - Strutture in elevazione FASE 5	55 days	Mon 09/12/24	Mon 24/02/25	
292	OS C	Carpenteria, posa ferri e getto per strutture in c.a.	37 days	Mon 09/12/24	Wed 29/01/25	
293	OS C	Montaggio di strutture in acciaio	10 days	Mon 20/01/25	Fri 31/01/25	
294	OC G	Realizzazione di copertura	21 days	Mon 27/01/25	Mon 24/02/25	
295	OC	Tamponature FASE 5	25 days	Mon 17/02/25	Fri 21/03/25	
296	OC D	Realizzazione di tamponature	16 days	Mon 17/02/25	Mon 10/03/25	
297	OC E	Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	15 days	Mon 03/03/25	Fri 21/03/25	
298	OC	Facciata continua FASE 5	11 days	Mon 17/03/25	Mon 31/03/25	
299	OC E	Montaggio di facciata continua	11 days	Mon 17/03/25	Mon 31/03/25	
300	OC	II - IE - IM - Impianti tecnici FASE 5	53 days	Tue 25/03/25	Wed 11/06/25	
301	OC Q	Realizzazione di impianti elevatori	9 days	Tue 25/03/25	Fri 04/04/25	
302	II S	Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	14 days	Mon 07/04/25	Mon 28/04/25	
303	II V	Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	7 days	Tue 22/04/25	Fri 02/05/25	
304	IE X - IE W	Realizzazione di impianto elettrico	15 days	Tue 29/04/25	Tue 20/05/25	
305	II U	Realizzazione di impianto antincendio	8 days	Mon 12/05/25	Wed 21/05/25	
306	IM R	Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	16 days	Mon 19/05/25	Tue 10/06/25	
307	IM R	Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Tue 03/06/25	Wed 11/06/25	
308	OC	Pareti divisorie, controsoffittature FASE 5	20 days	Tue 03/06/25	Mon 30/06/25	
309	OC I - OC K	Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Tue 03/06/25	Tue 24/06/25	
310	OC H	Realizzazione di partizioni interne	16 days	Mon 09/06/25	Mon 30/06/25	
311	OC	Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 5	35 days	Mon 23/06/25	Fri 08/08/25	
312	OC L	Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Mon 23/06/25	Thu 10/07/25	
313	OC I	Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Mon 07/07/25	Wed 23/07/25	
314	OC L - OC N	Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Mon 14/07/25	Fri 08/08/25	
315	OC	Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 5	24 days	Tue 29/07/25	Mon 01/09/25	
316	OC J	Montaggio di serramenti interni	15 days	Tue 29/07/25	Tue 19/08/25	
317	OC F	Montaggio di serramenti esterni	15 days	Mon 11/08/25	Mon 01/09/25	
318	OC M	Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Tue 05/08/25	Mon 25/08/25	
319	NA1025010	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO - FASE 5	195 days	Mon 13/01/25	Fri 17/10/25	
320	OS	Demolizioni e rimozioni FASE 5	27 days	Mon 13/01/25	Tue 18/02/25	
321	OS A	Rimozione di impianti	11 days	Mon 13/01/25	Mon 27/01/25	
322	OS A	Demolizione di pareti divisorie interne	12 days	Mon 20/01/25	Tue 04/02/25	
323	OS A	Rimozione di pavimenti e rivestimenti	12 days	Mon 27/01/25	Tue 11/02/25	
324	OS A	Rimozione di serramenti esterni e interni	7 days	Mon 10/02/25	Tue 18/02/25	
325	OS	Opere strutturali FASE 5	24 days	Mon 10/02/25	Thu 13/03/25	
326	OS C	Rinforzo strutture e Opere in c.a.	24 days	Mon 10/02/25	Thu 13/03/25	
327	OC	Rifacimento copertura FASE 5	43 days	Mon 03/03/25	Mon 05/05/25	
328	OC G	Realizzazione di copertura	27 days	Mon 03/03/25	Tue 08/04/25	
329	OC	Sistema a cappotto				
330	OC E	Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	22 days	Tue 01/04/25	Mon 05/05/25	
331	OC	Intonaci esterni e tinteggiatura FASE 5	26 days	Mon 14/04/25	Thu 22/05/25	
332	OC E	Formazione intonaci esterni e tinteggiatura	26 days	Mon 14/04/25	Thu 22/05/25	
333	II - IE - IM	Impianti tecnici FASE 5	41 days	Mon 12/05/25	Tue 08/07/25	
334	II S	Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	14 days	Mon 12/05/25	Thu 29/05/25	
335	II V	Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	7 days	Tue 20/05/25	Wed 28/05/25	
336	IE X	Realizzazione di impianto elettrico	15 days	Mon 26/05/25	Mon 16/06/25	
337	II U	Realizzazione di impianto antincendio	8 days	Mon 09/06/25	Wed 18/06/25	
338	IM R	Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	16 days	Mon 16/06/25	Mon 07/07/25	
339	IM R	Installazione della centrale termica per impianto termico	7 days	Mon 30/06/25	Tue 08/07/25	
340	OC	Pareti divisorie, controsoffittature FASE 5	26 days	Mon 30/06/25	Mon 04/08/25	
341	OC I - OC K	Realizzazione di contropareti e controsoffitti	16 days	Mon 30/06/25	Mon 21/07/25	
342	OC H	Realizzazione di partizioni interne	16 days	Mon 14/07/25	Mon 04/08/25	

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47

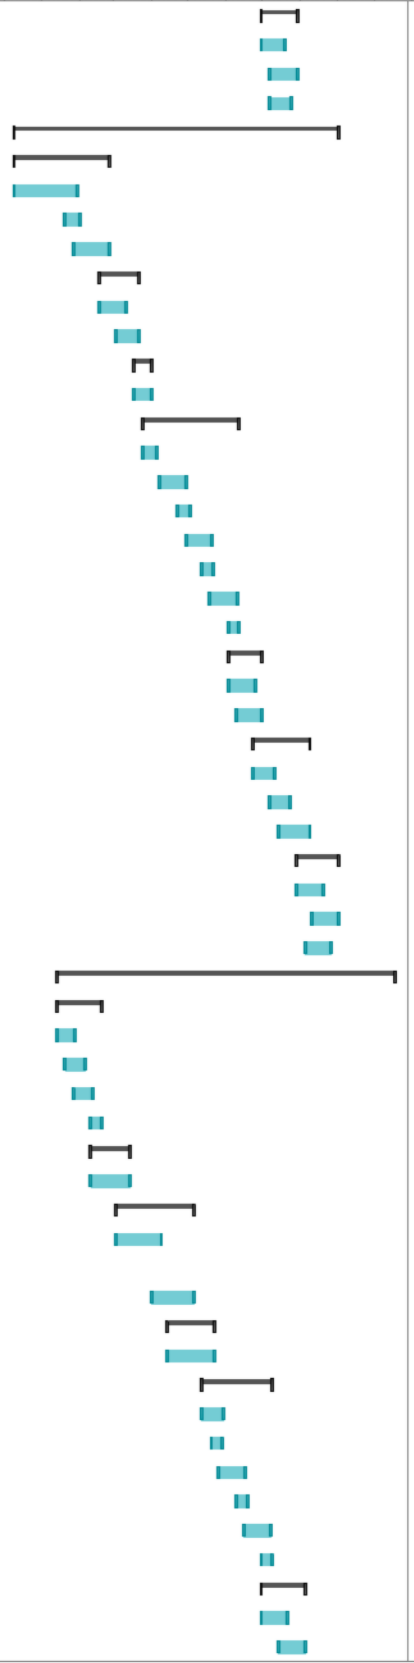


Project: Projec Date: Thu 18/0

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	P
343		<b>OC - Massetti, Intonaci, Pavimenti e Rivestimenti interni FASE 5</b>	<b>34 days</b>	<b>Mon 04/08/25</b>	<b>Fri 19/09/25</b>	
344		OC L - Formazione di massetto per pavimenti interni	14 days	Mon 04/08/25	Fri 22/08/25	
345		OC I - Formazione intonaci interni e tinteggiatura	13 days	Tue 12/08/25	Fri 29/08/25	
346		OC L - Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	20 days	Mon 25/08/25	Fri 19/09/25	
347		<b>OC - Serramenti interni ed esterni, protezioni e delimitazioni FASE 5</b>	<b>20 days</b>	<b>Mon 22/09/25</b>	<b>Fri 17/10/25</b>	
348		OC J - Montaggio di serramenti interni	15 days	Mon 22/09/25	Fri 10/10/25	
349		OC F - Montaggio di serramenti esterni	15 days	Mon 29/09/25	Fri 17/10/25	
350		OC M - Posa di ringhiere e parapetti	14 days	Mon 29/09/25	Thu 16/10/25	
351		<b>NAB0726 - FASE 6</b>	<b>157 days</b>	<b>Mon 17/03/25</b>	<b>Tue 28/10/25</b>	
352		<b>IM - II - IE - Allacciamenti impianti di rete</b>	<b>33 days</b>	<b>Mon 17/03/25</b>	<b>Mon 05/05/25</b>	
353		IE X - Posa di conduttura elettrica	21 days	Mon 17/03/25	Mon 14/04/25	
354		II S - Posa di conduttura idrica	28 days	Mon 24/03/25	Mon 05/05/25	
355		II V - Posa di conduttura del gas	10 days	Mon 14/04/25	Tue 29/04/25	
356		<b>OS - Demolizione muro su via Miano</b>	<b>13 days</b>	<b>Mon 14/04/25</b>	<b>Mon 05/05/25</b>	
357		OS A - Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	13 days	Mon 14/04/25	Mon 05/05/25	
358		<b>II - Impianti di smaltimento, irrigazione aree verdi</b>	<b>26 days</b>	<b>Mon 14/04/25</b>	<b>Thu 22/05/25</b>	
359		II S - Installazione di impianto automatico di irrigazione	20 days	Mon 14/04/25	Wed 14/05/25	
360		II T - Installazione rete di raccolta acque meteoriche e impianto fognario	20 days	Wed 23/04/25	Thu 22/05/25	
361		<b>VI - Sedi stradali, Parcheggi</b>	<b>55 days</b>	<b>Mon 12/05/25</b>	<b>Mon 28/07/25</b>	
362		VI P - Formazione di fondazione stradale	40 days	Mon 12/05/25	Mon 07/07/25	
363		VI P - Formazione di manto di usura e collegamento	35 days	Tue 10/06/25	Mon 28/07/25	
364		<b>SE - Percorsi pedonali esterni</b>	<b>23 days</b>	<b>Mon 14/07/25</b>	<b>Wed 13/08/25</b>	
365		SE O - Formazione di percorsi pedonali	23 days	Mon 14/07/25	Wed 13/08/25	
366		<b>SE - Piantumazione e posa superfici verdi</b>	<b>19 days</b>	<b>Mon 04/08/25</b>	<b>Fri 29/08/25</b>	
367		SE O - Messa a dimora di piante	12 days	Mon 04/08/25	Wed 20/08/25	
368		SE O - Formazione di tappeto erboso	14 days	Mon 11/08/25	Fri 29/08/25	
369		<b>OC - Recinzioni, ringhiere, cancellate</b>	<b>24 days</b>	<b>Tue 19/08/25</b>	<b>Fri 19/09/25</b>	
370		OC M - Posa di recinzioni e cancellate	24 days	Tue 19/08/25	Fri 19/09/25	
371		OC M - Posa di ringhiere e parapetti	10 days	Mon 01/09/25	Fri 12/09/25	
372		<b>IE - Illuminazione esterna, impianti speciali</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 08/09/25</b>	<b>Wed 01/10/25</b>	
373		IE Y - IE Z - Sistema d'illuminazione e impianti speciali	18 days	Mon 08/09/25	Wed 01/10/25	
374		<b>Smontaggio degli apprestamenti del cantiere</b>	<b>12 days</b>	<b>Mon 29/09/25</b>	<b>Tue 14/10/25</b>	
375		Disallestimento depositi, zone stoccaggio mat. e impianti fissi	10 days	Mon 29/09/25	Fri 10/10/25	
376		Disallestimento aree di deposito materiali	7 days	Mon 06/10/25	Tue 14/10/25	
377		<b>Smobilizzo del cantiere</b>	<b>11 days</b>	<b>Tue 14/10/25</b>	<b>Tue 28/10/25</b>	
378		Pulizia generale dell'area di cantiere	8 days	Tue 14/10/25	Thu 23/10/25	
379		Smobilizzo del cantiere	6 days	Tue 21/10/25	Tue 28/10/25	

M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47

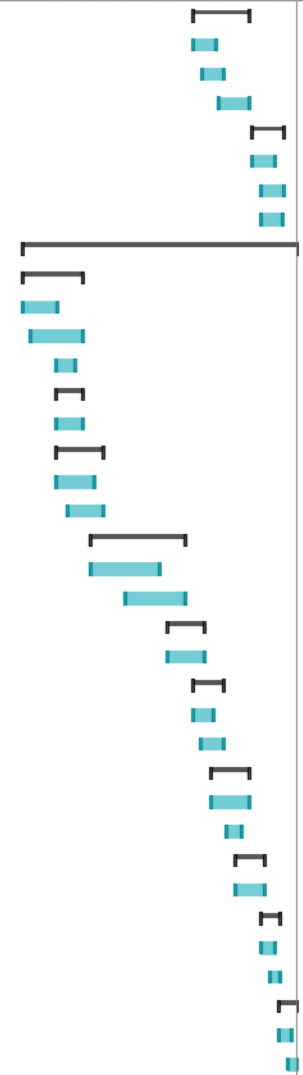

Project: Projec Date: Thu 18/0	Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
	Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			
