



Area Patrimonio

Servizio Tecnico Patrimonio

Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54
D.Lgs 50/2016, denominato *"Manutenzione Straordinaria Edile ed
Impiantistica Immobili Comunali non a Reddito"*.

*"Lavori di manutenzione straordinaria del blocco uffici al piano quarto
prospiciente la Corte C"
Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio - Napoli*

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO 7

**DATA:
01/2022**

IL PROGETTISTA:

Arch. Concetta Miragliuolo

IL R.U.P.:

Arch. Guglielmo Pescatore

Comune di Napoli (Na)

Area Patrimonio

Servizio Tecnico Patrimonio

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del blocco uffici al piano quarto prospiciente la Corte C - Palazzo San Giacomo - Napoli

COMMITTENTE: Comune di Napoli (Na)
Area Patrimonio – Servizio Tecnico del Patrimonio

CANTIERE: Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – Comune di Napoli

Napoli (Na), 26/01/2022

IL TECNICO



(arch. Concetta Miragliuolo)

Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 5° D.lgs. 250/2016, denominato “Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica immobili comuni non a reddito”.

Dirigente: Ing. Vincenzo Brandi

R.U.P.: Arch. Guglielmo Pescatore




ID	Nome attività	Durata	Importo	Gennaio 2022													
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	Lavori a MISURA	147 g	489'208,22														
2	Opere provvisionali	146 g	50'765,77														
3	Smobilizzo e pulizia cantiere.	5 g	0,00														
4	Allestimento cantiere	4 g	0,00														
5	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... o quadrato di superficie asservita Per...	12 g	2'299,24														
6	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... uperficie asservita Per ogni mese o frazi...	125 g	2'693,66														
7	Trasporto e montaggio di montacarichi da cantiere a piatt ... ontaggio e noleggio mensile compreso...	145 g	9'012,96														
8	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... abilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m	50 g	1'232,40														
9	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... quadrato di superficie asservita Per il 1°mes...	15 g	1'083,93														
10	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... perficie asservita Per ogni mese o frazione dopo...	125 g	982,24														
11	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... drati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° m...	20 g	2'130,66														
12	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... ti di effettivo sviluppo Nolo per ogni m...	125 g	1'592,42														
13	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, ... ervita Senza recupero del materiale per altezze fin...	34 g	29'738,26														
14	Rimozioni, demolizioni e trasporti	137 g	96'814,78														
15	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso	10 g	1'709,04														
16	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di t...	10 g	1'257,00														
17	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a v...	38 g	2'378,89														
18	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... enti e/o getti Asportazione in profondità ...	58 g	16'035,77														
19	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a v...	28 g	1'210,41														
20	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, ... uadrato per centimetro di profondità Larghezza fin...	20 g	3'950,86														
21	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... ura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a ...	5 g	588,80														
22	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... ernita, eventuale numerazione delle lastre...	5 g	396,55														
23	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati...	5 g	322,48														
24	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura...	20 g	7'915,96														
25	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo...	20 g	5'187,52														
26	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	20 g	2'447,59														
27	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... ica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i pr...	20 g	567,14														
	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimension ... di rivestimento in legno di qualsiasi nat...	5 g	1'136,74														
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... mozione zoccolino battiscopa in grés o di maiol...	5 g	325,36														
	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti Raschiatura di vecc...	15 g	2'184,19														
	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura...	2 g	7'728,69														
	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo...	2 g	5'064,80														
	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	2 g	221,86														

Marzo 2022

Aprile 2022

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04

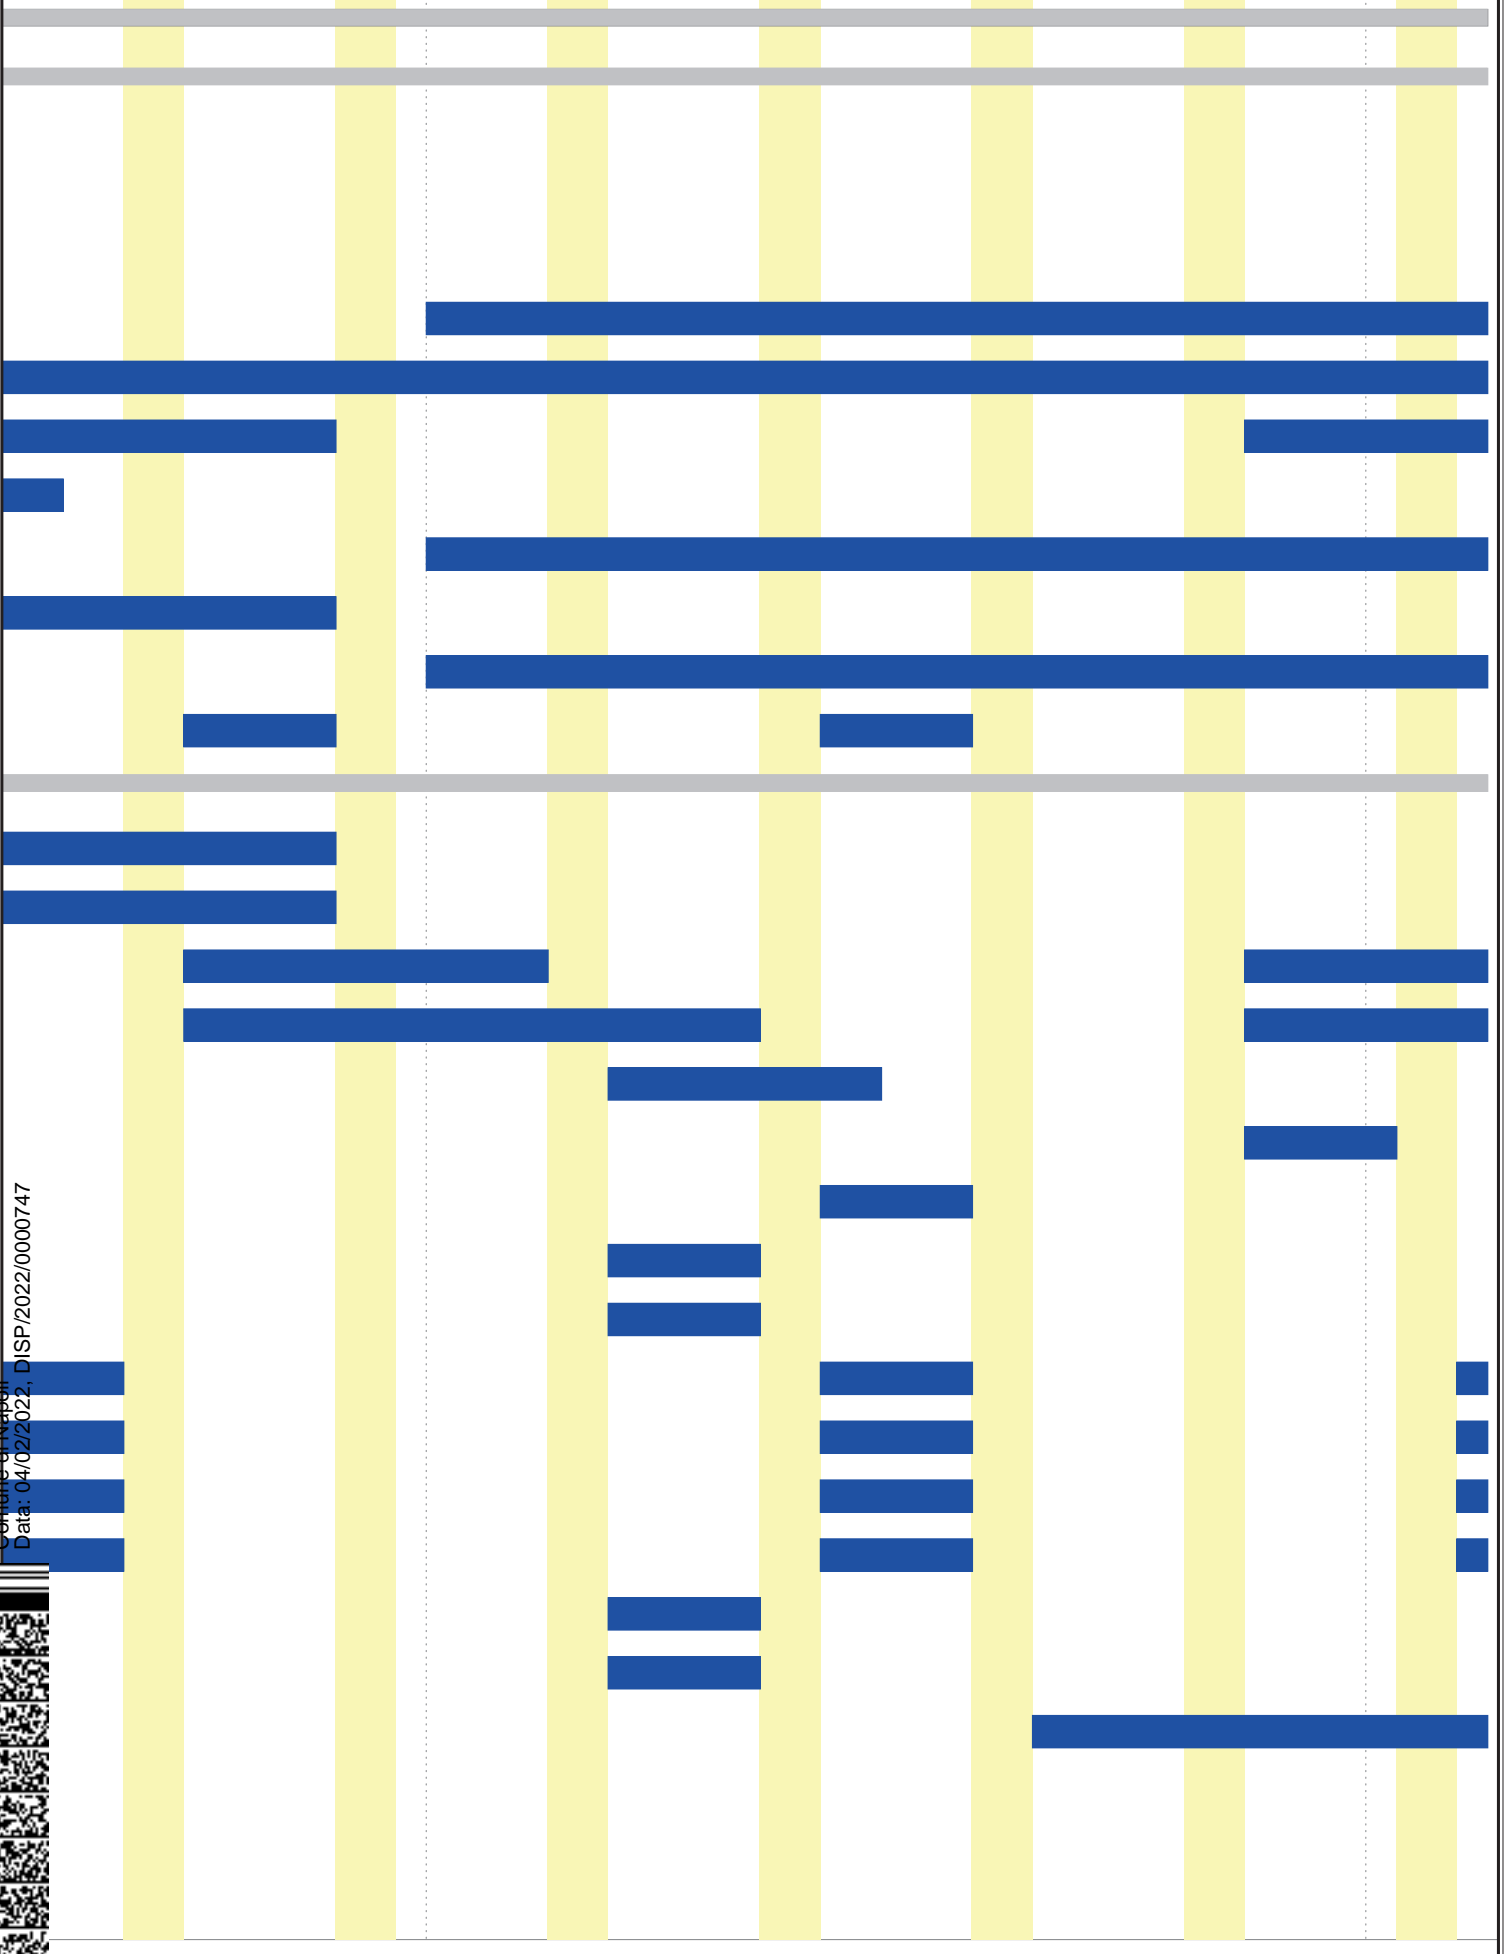


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747

Marzo 2022

Aprile 2022

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04

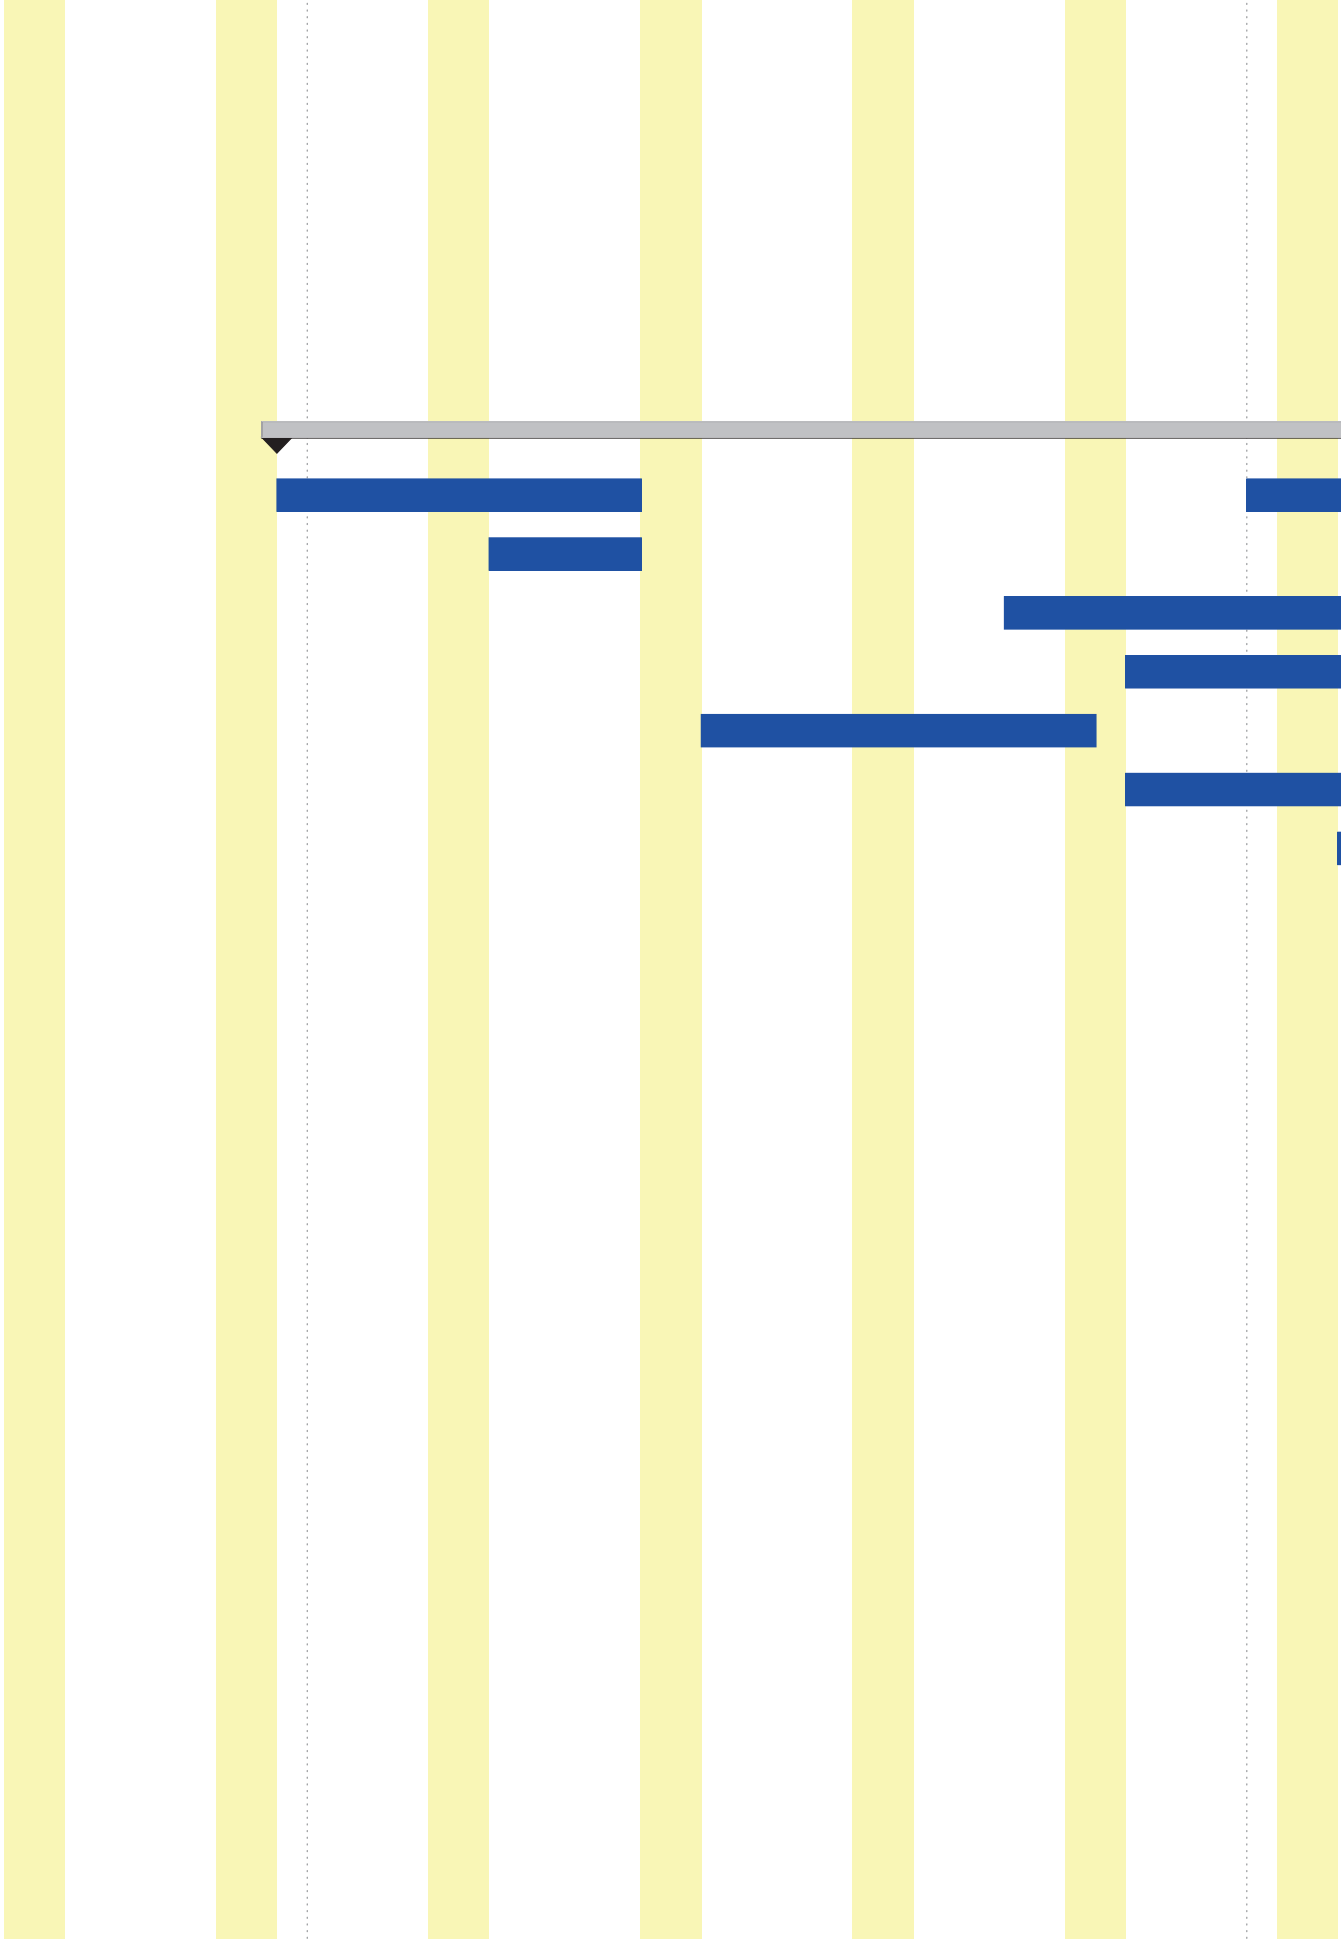

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747




Marzo 2022

Aprile 2022

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



MITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli

Maggio 2022

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

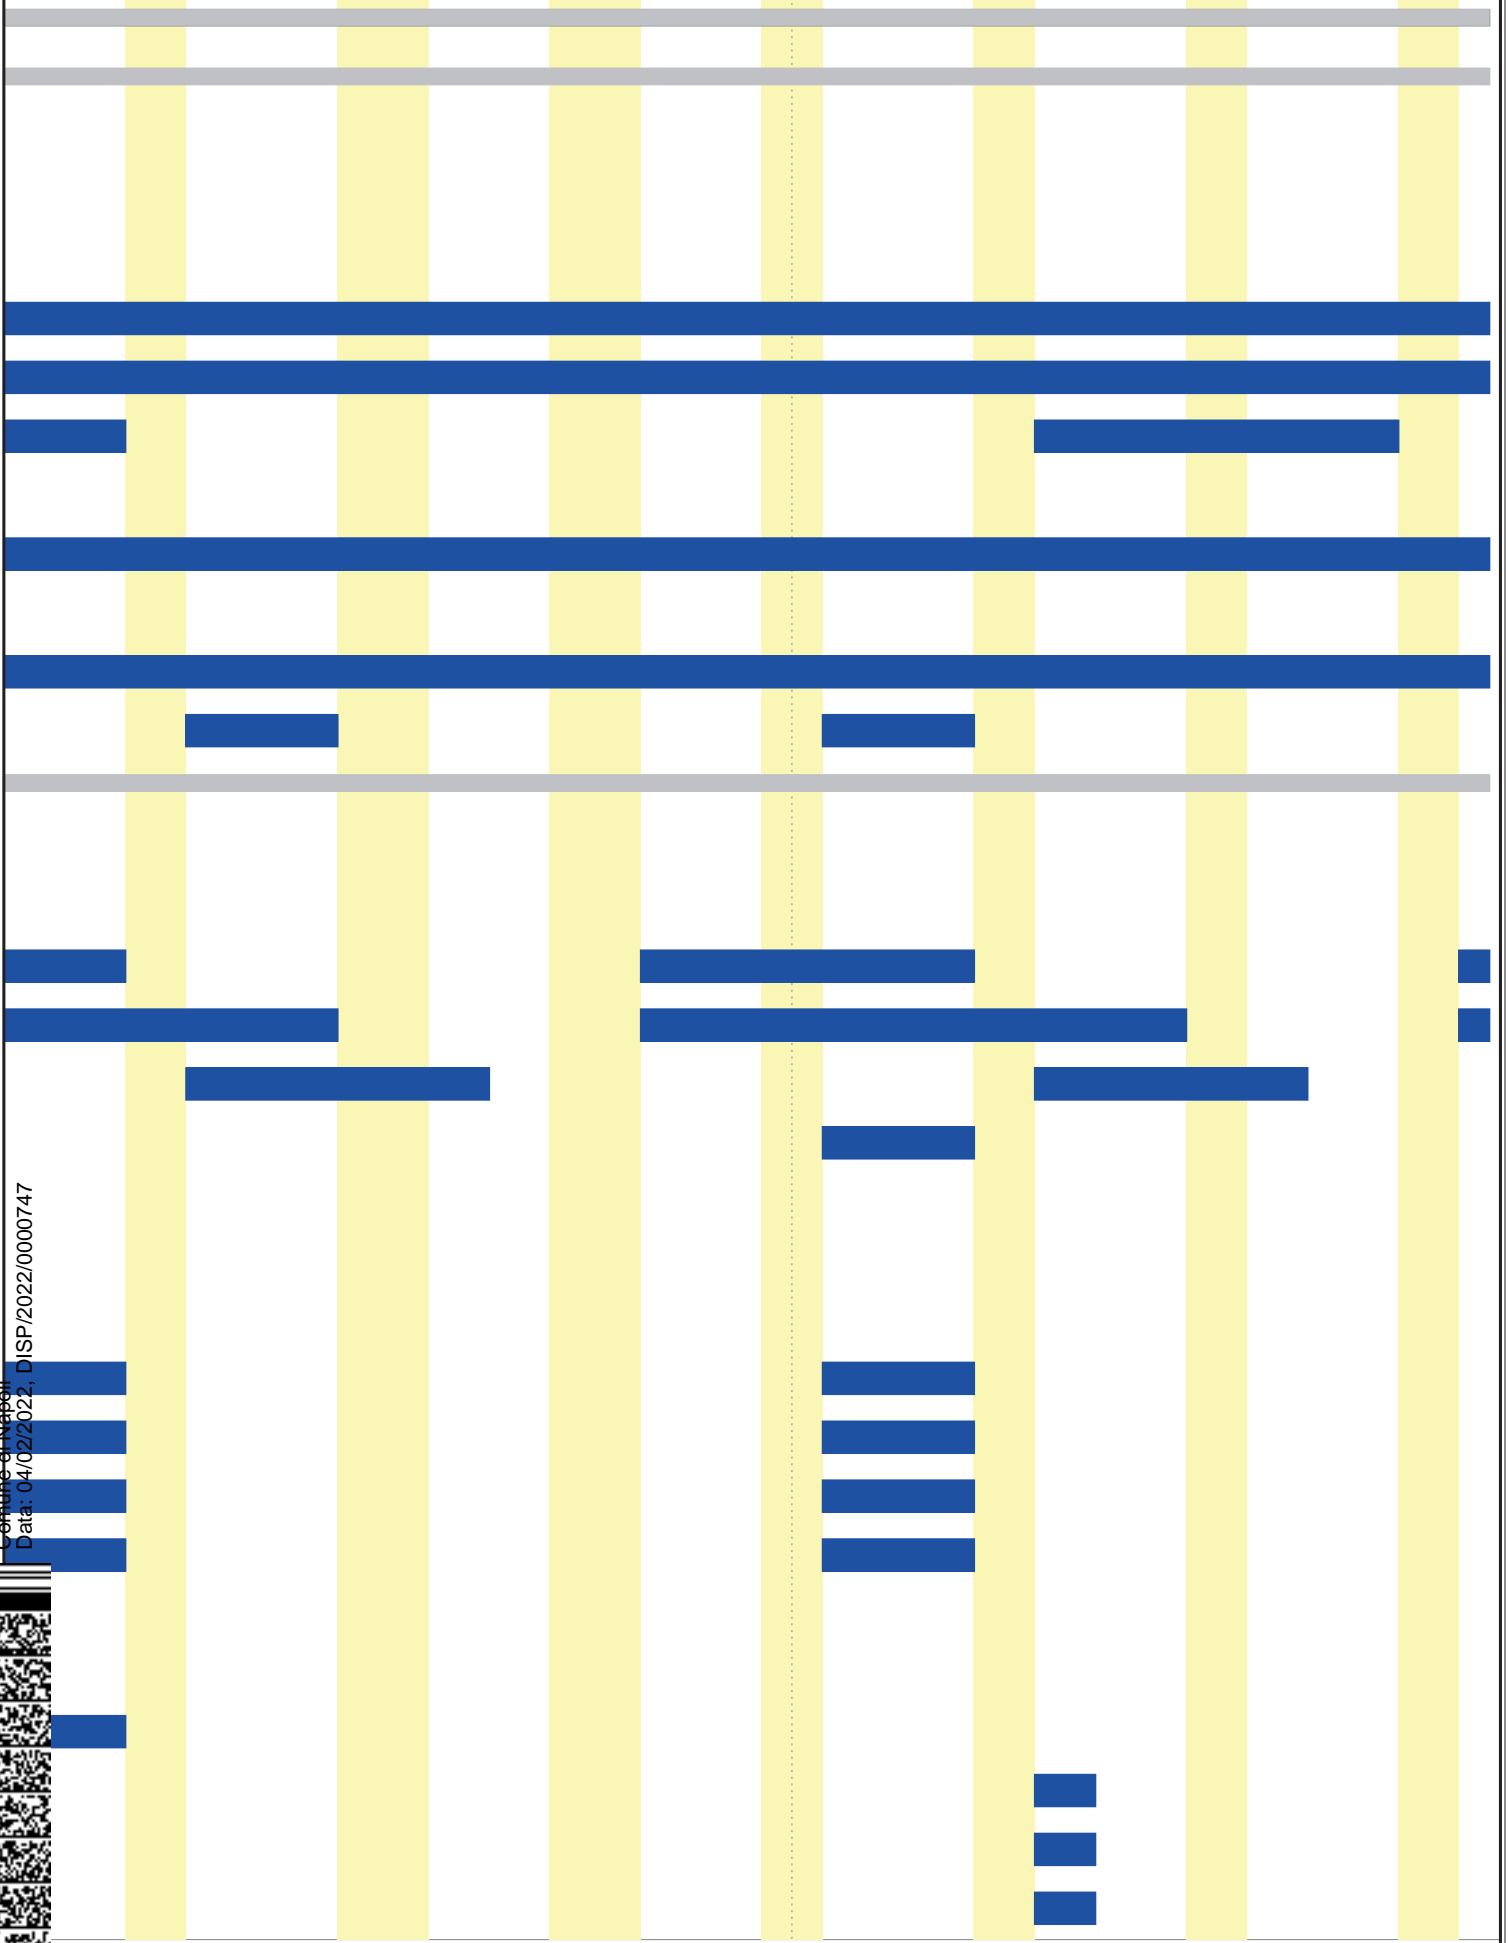


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Maggio 2022

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

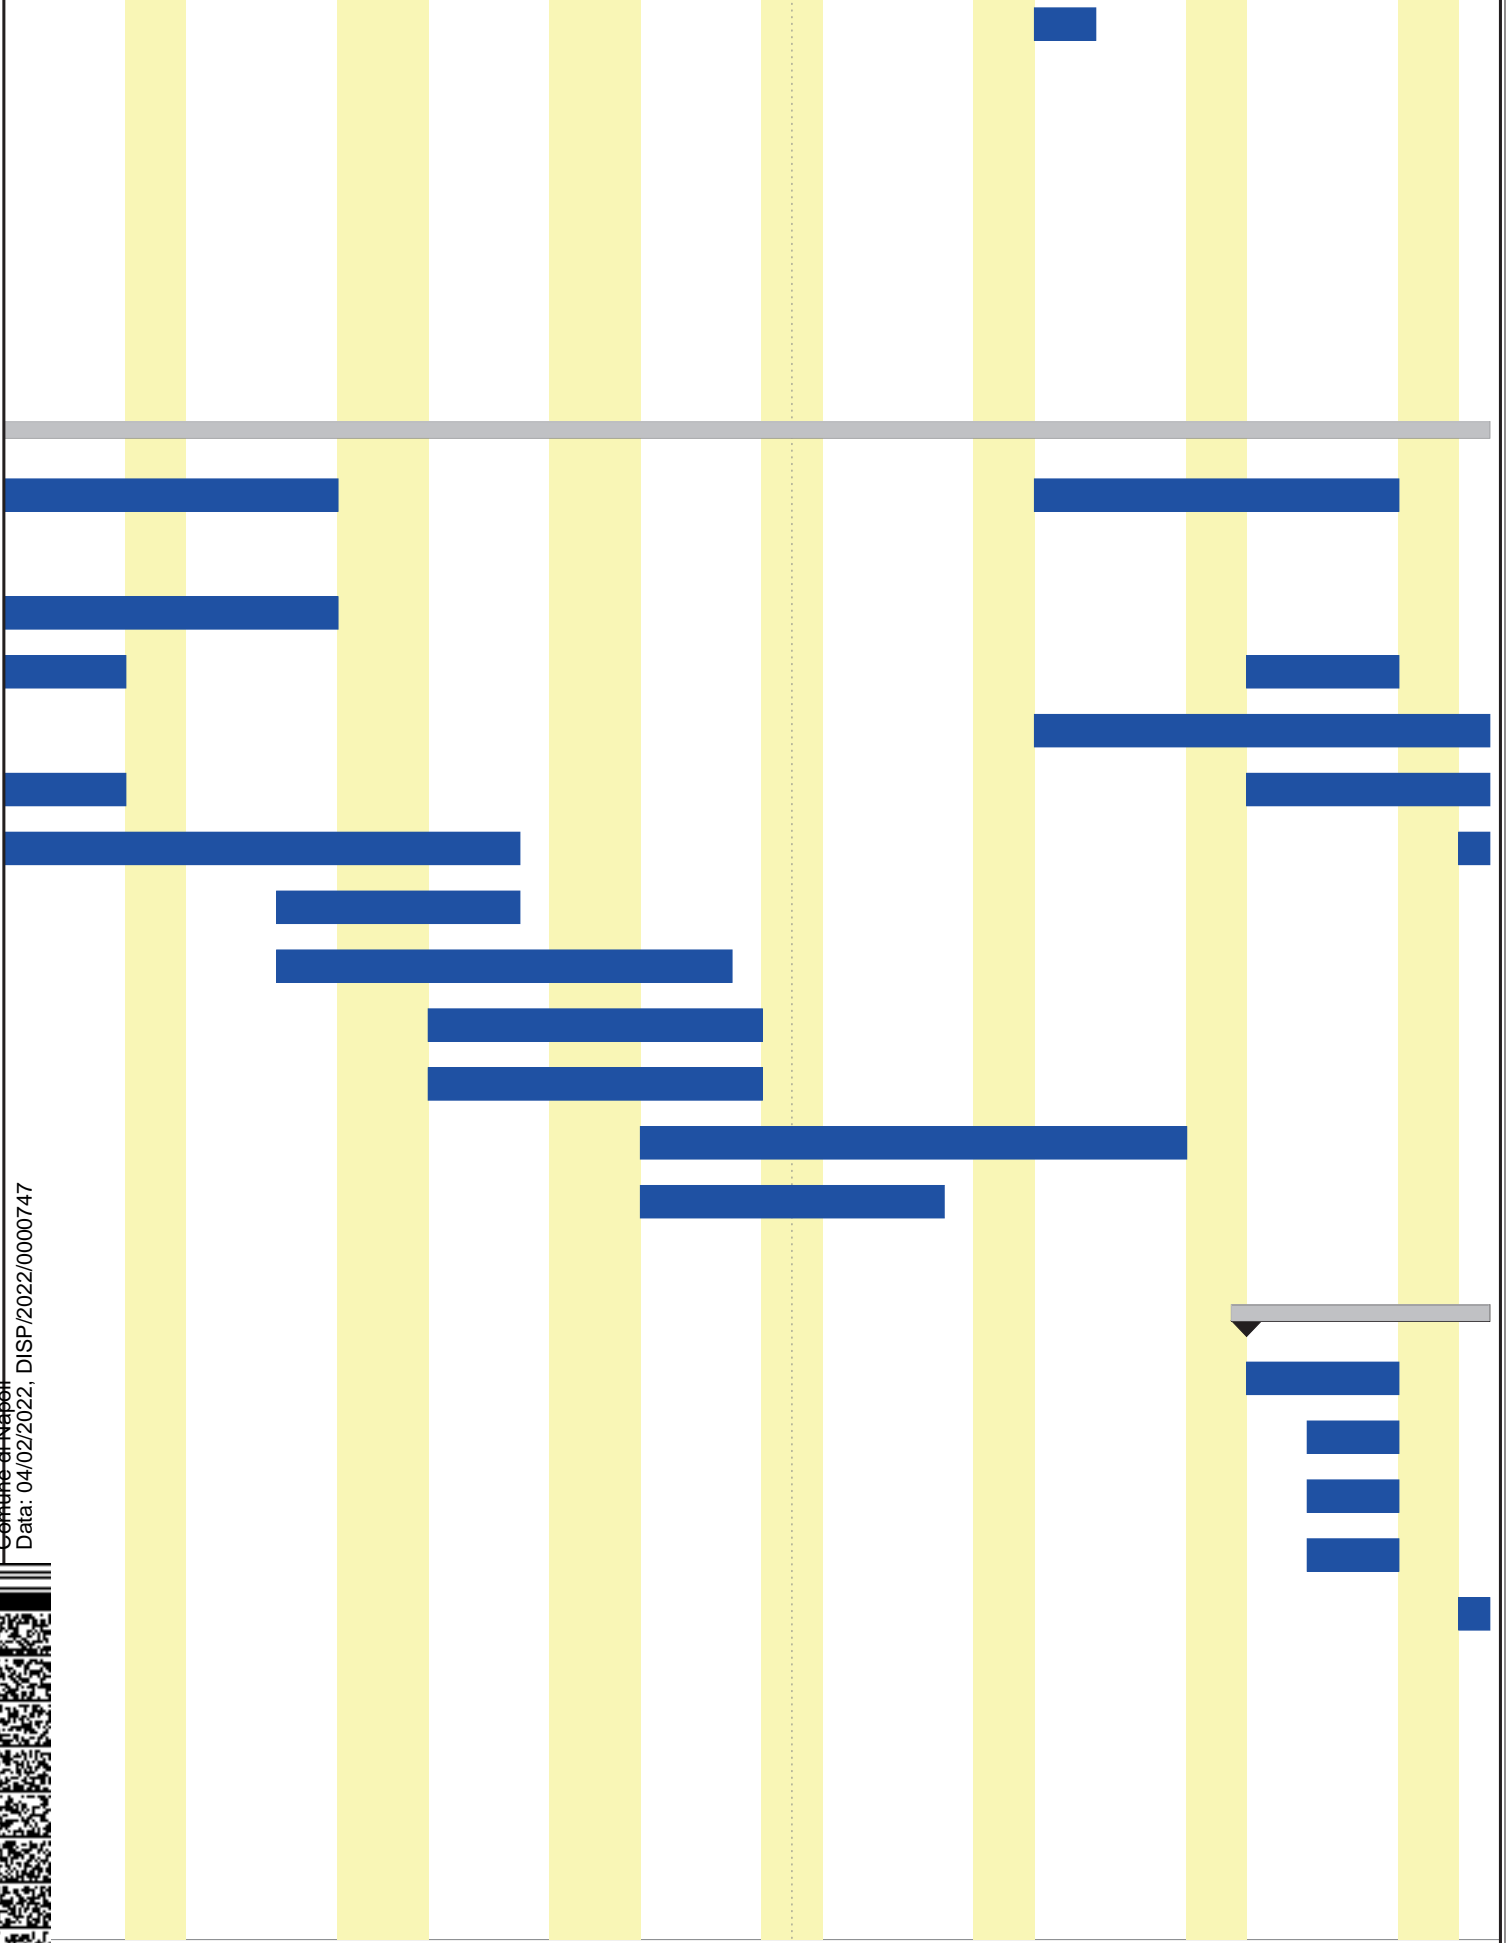


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Maggio 2022

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

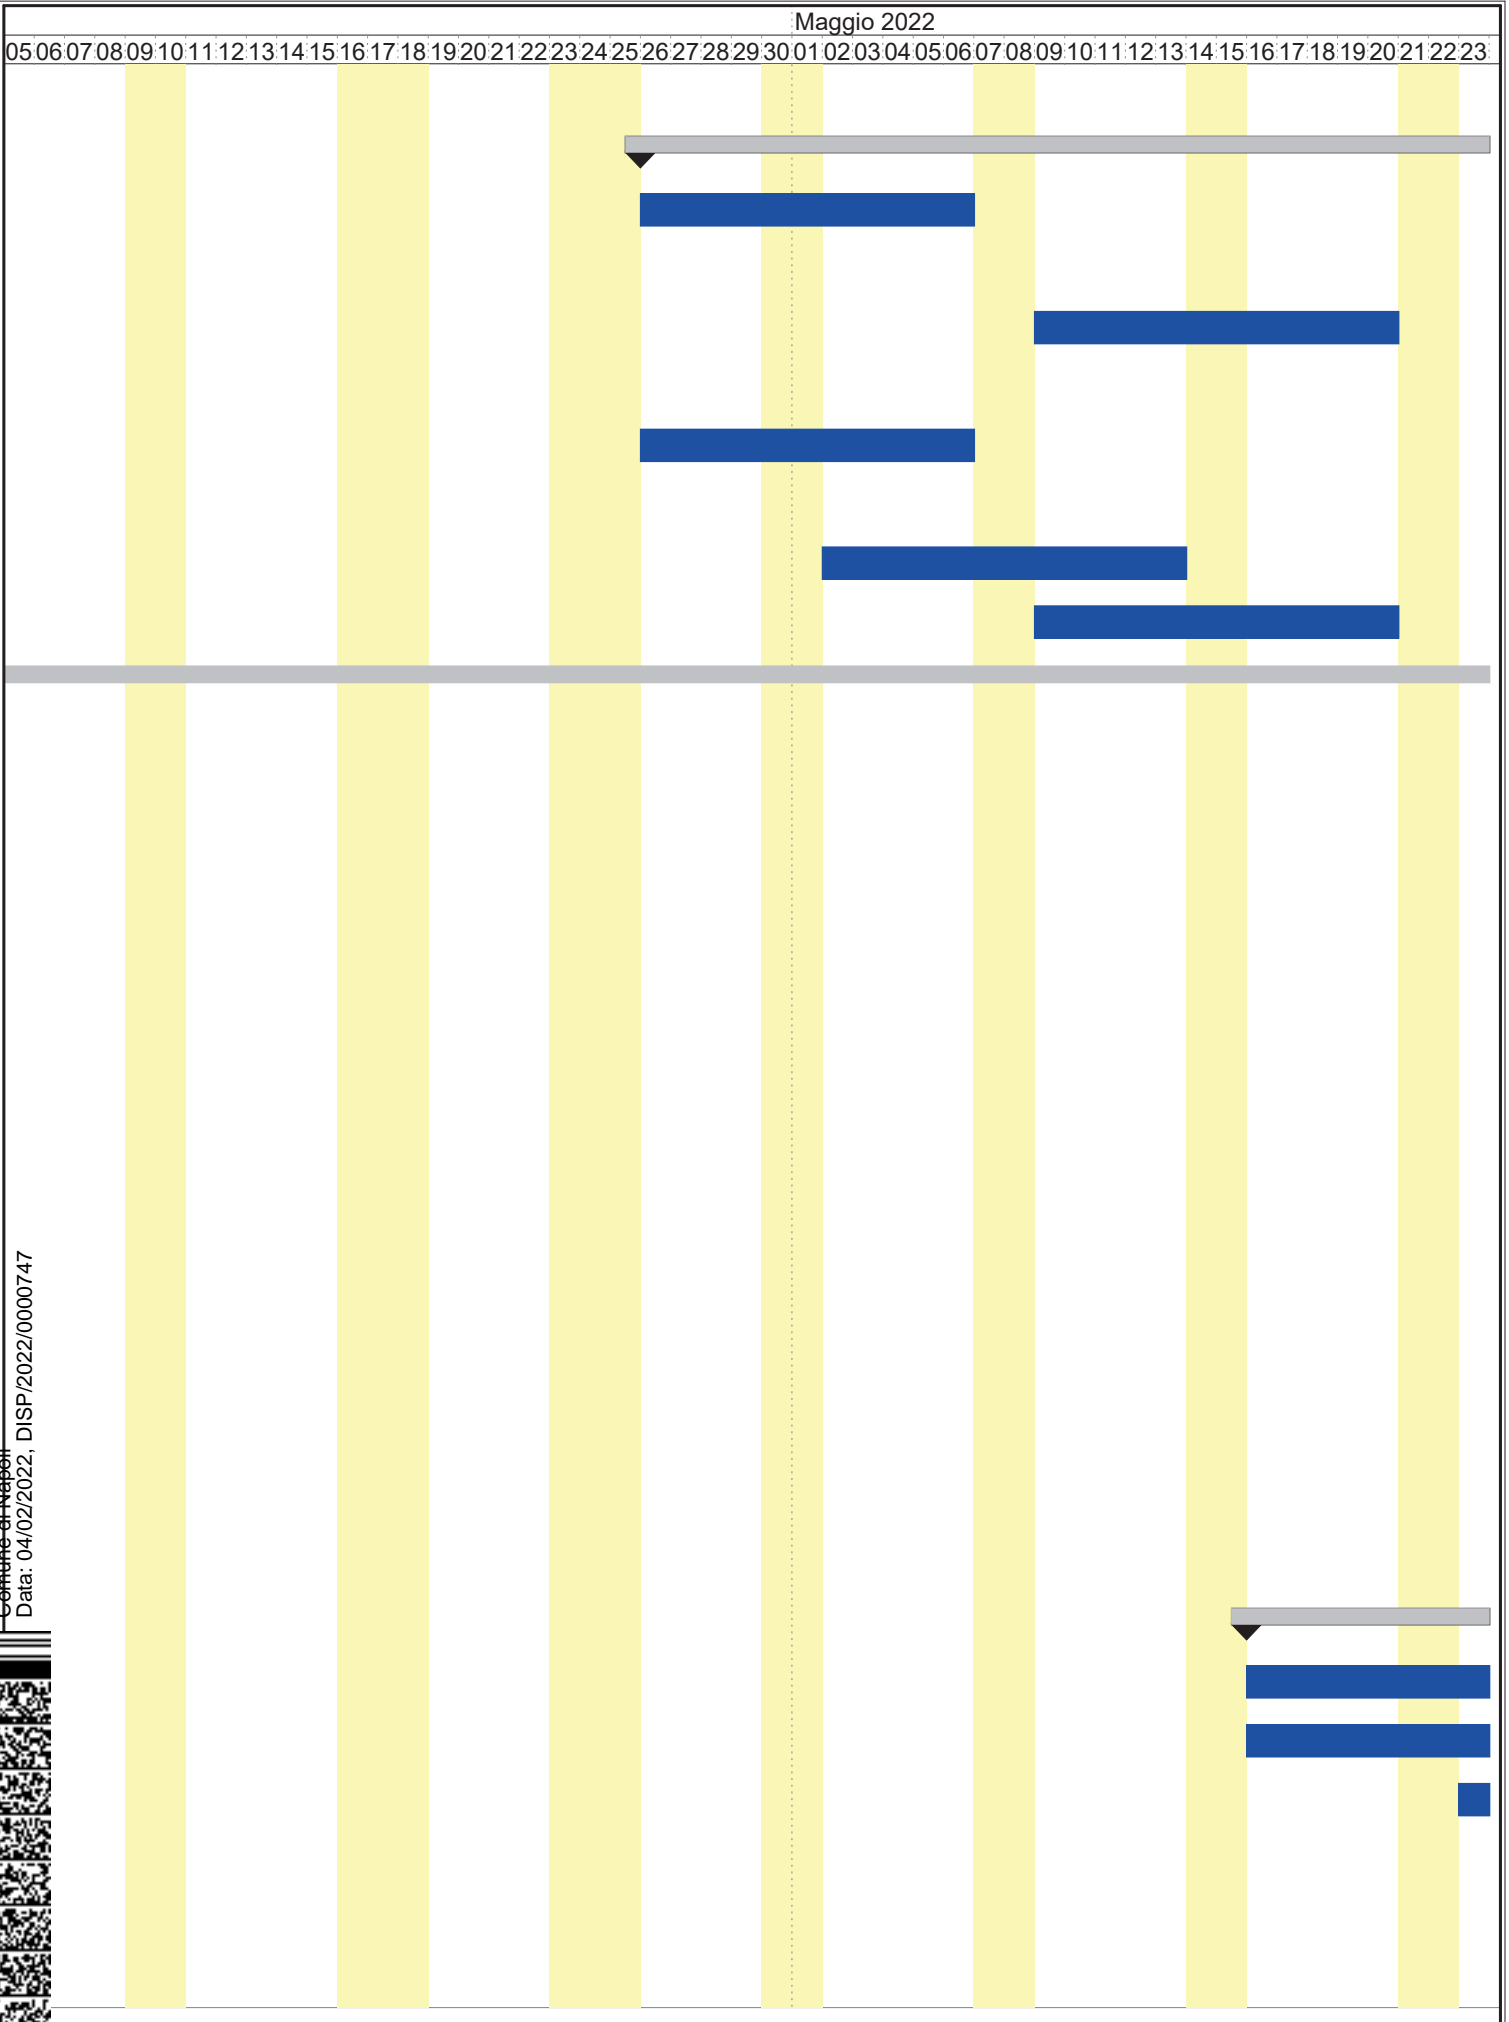


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Maggio 2022

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

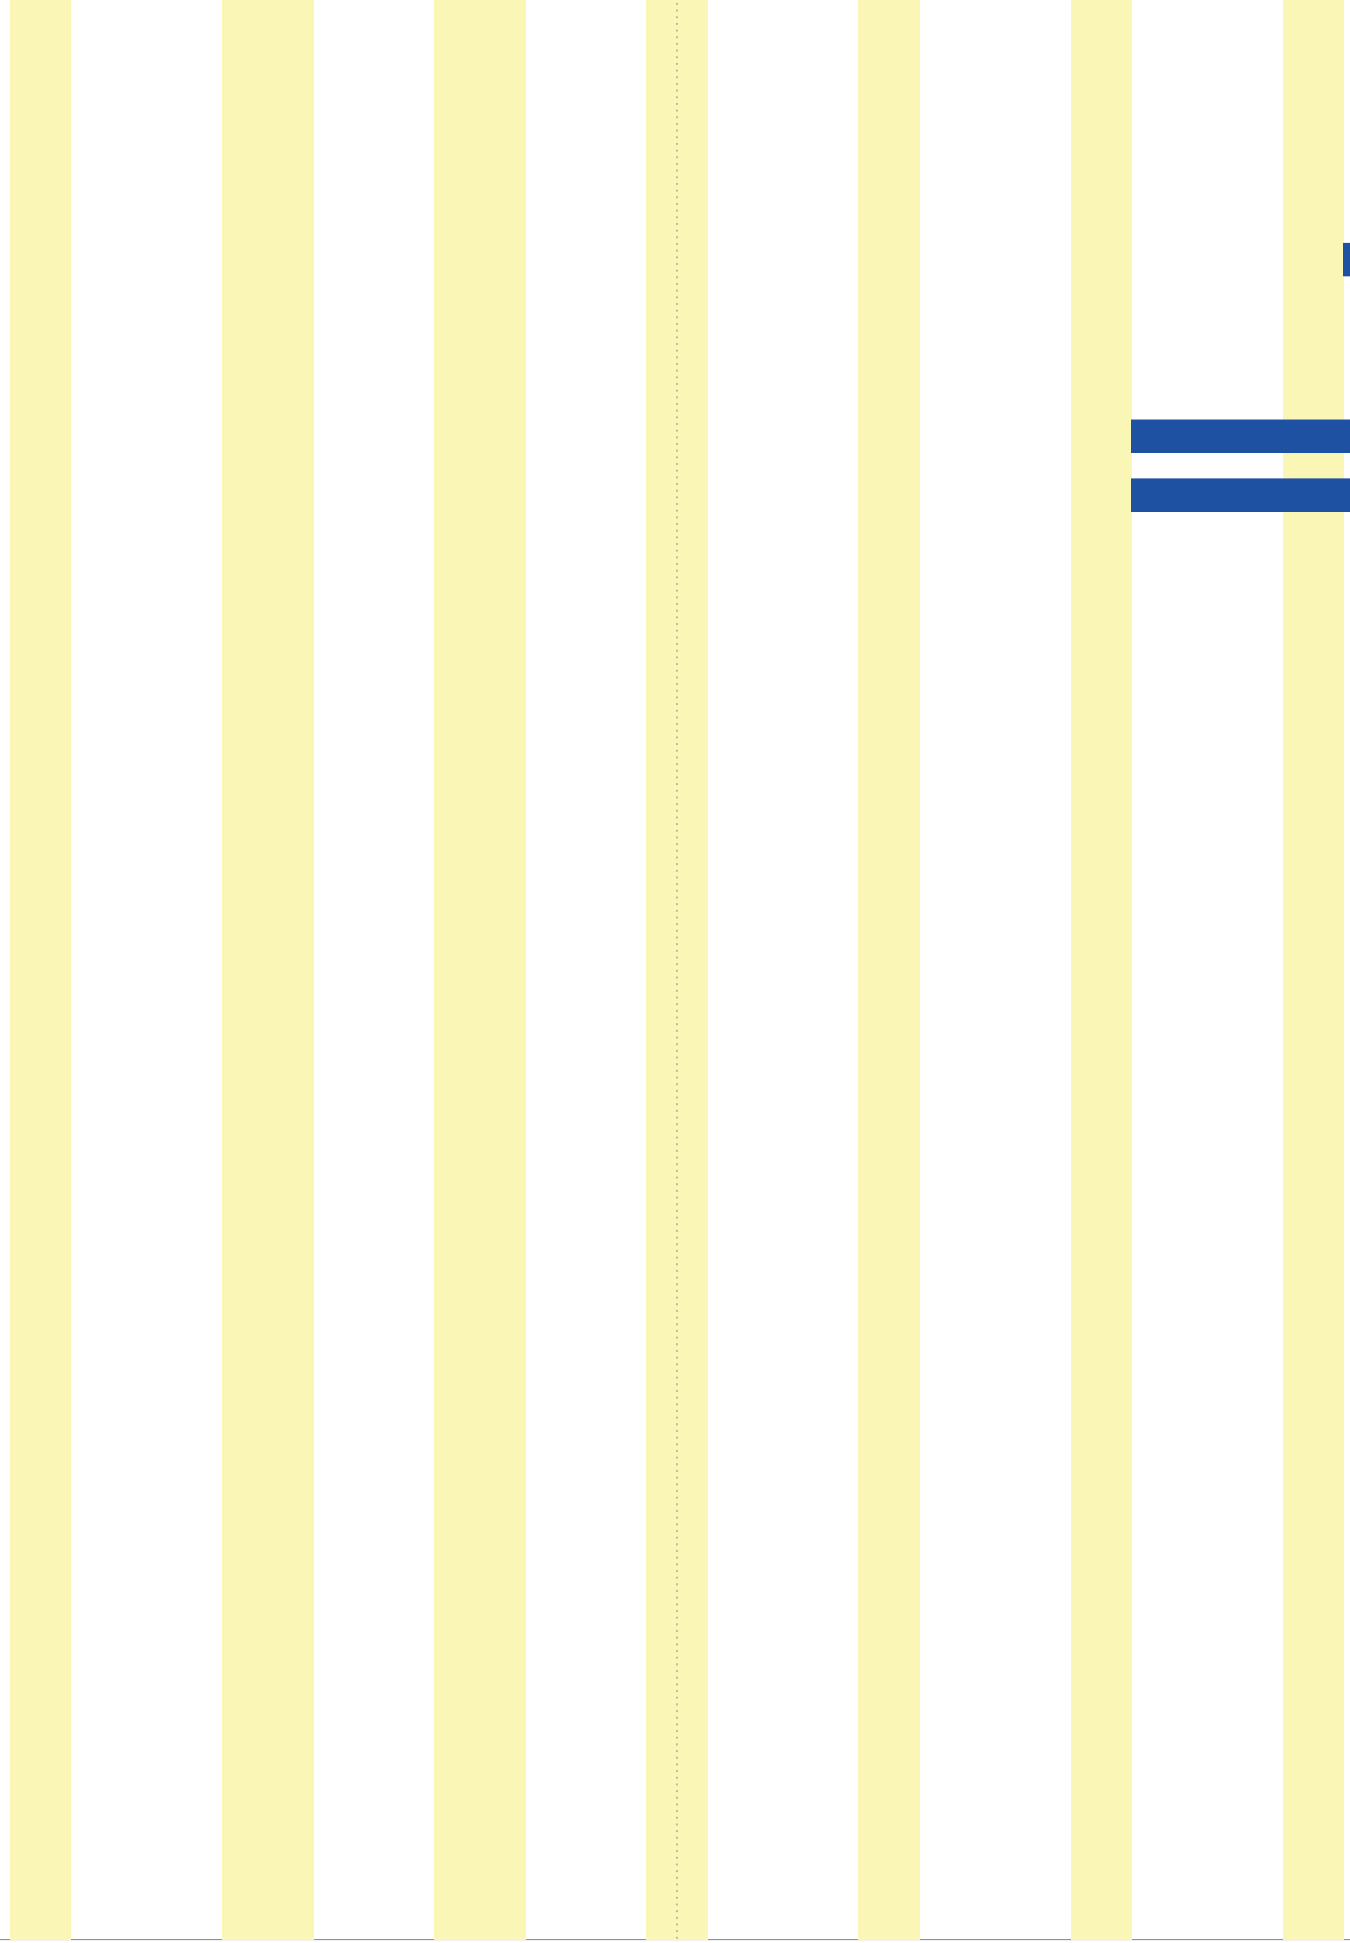


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Maggio 2022


05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

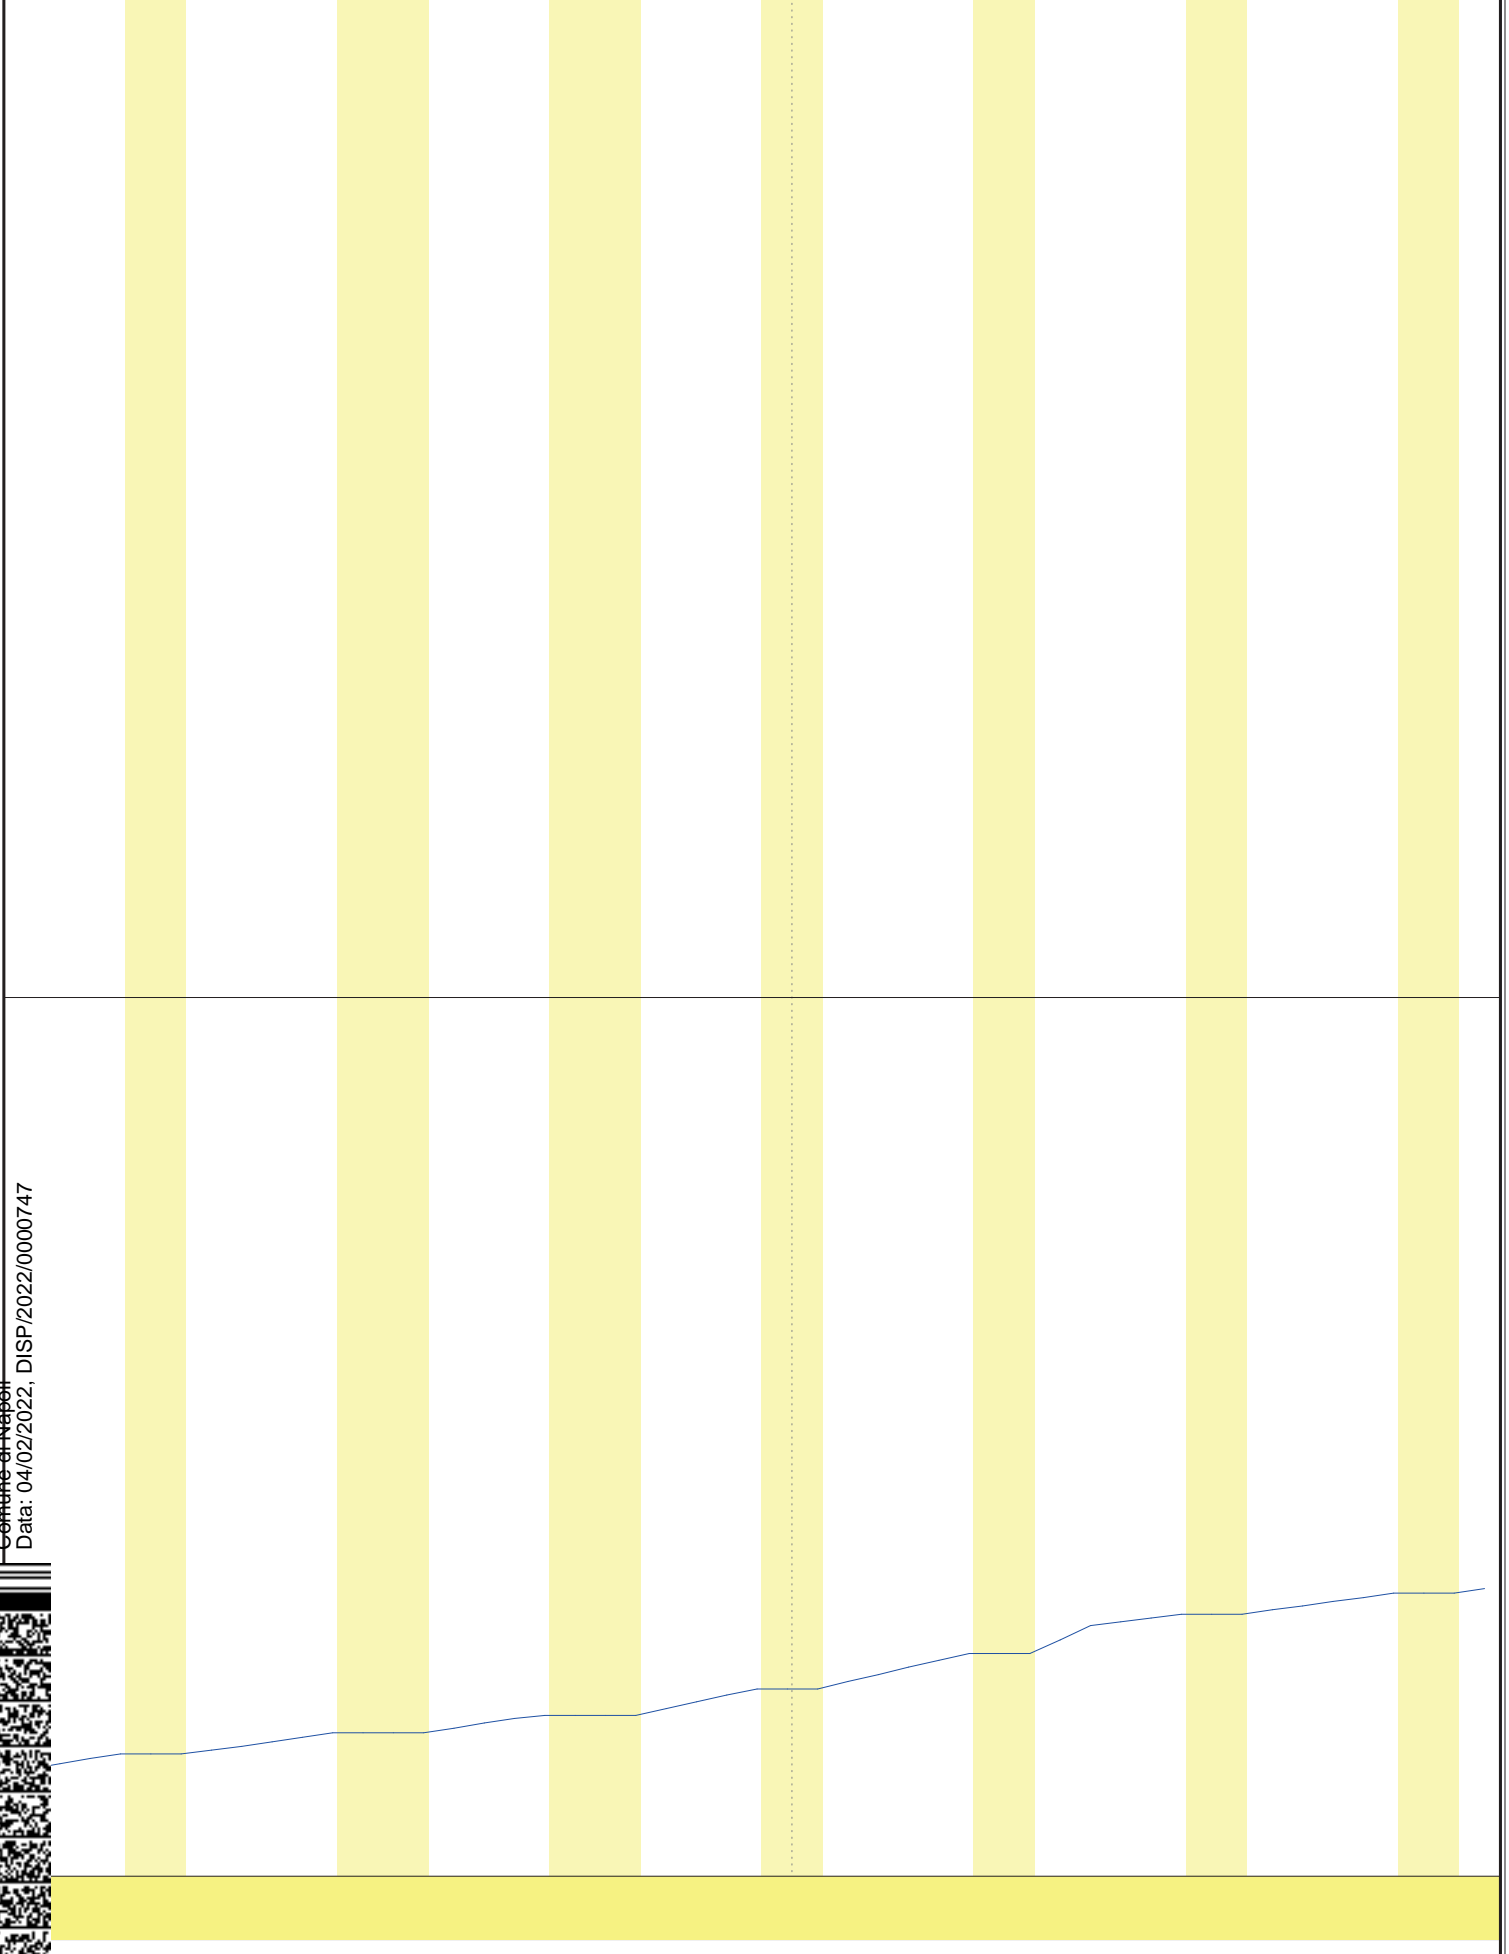

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747




MITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli

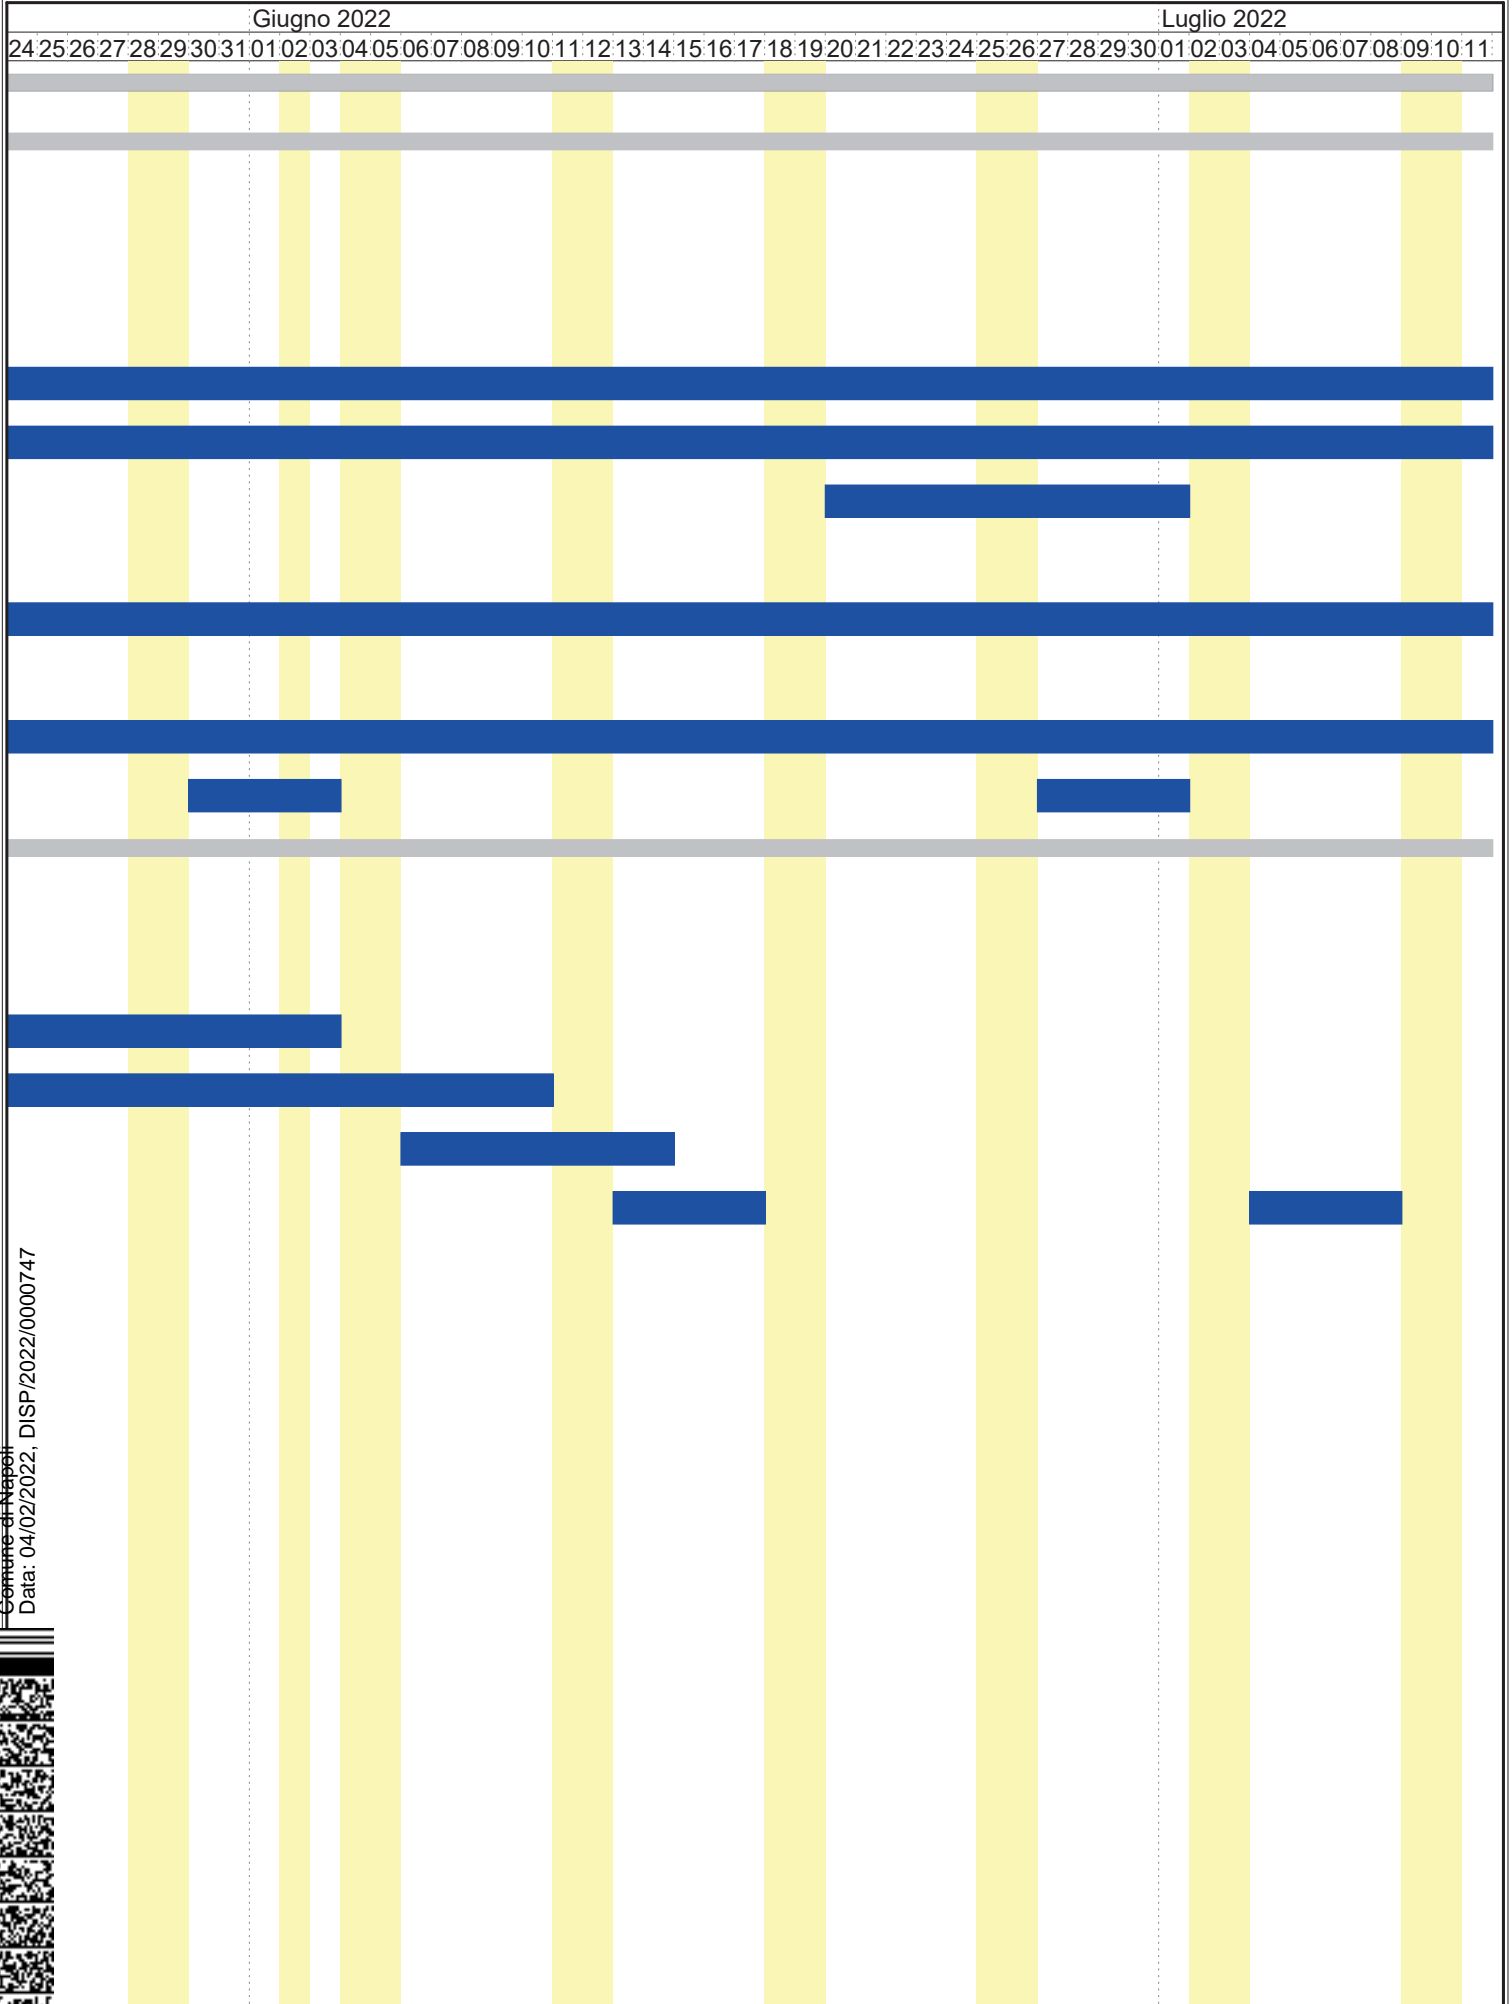


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



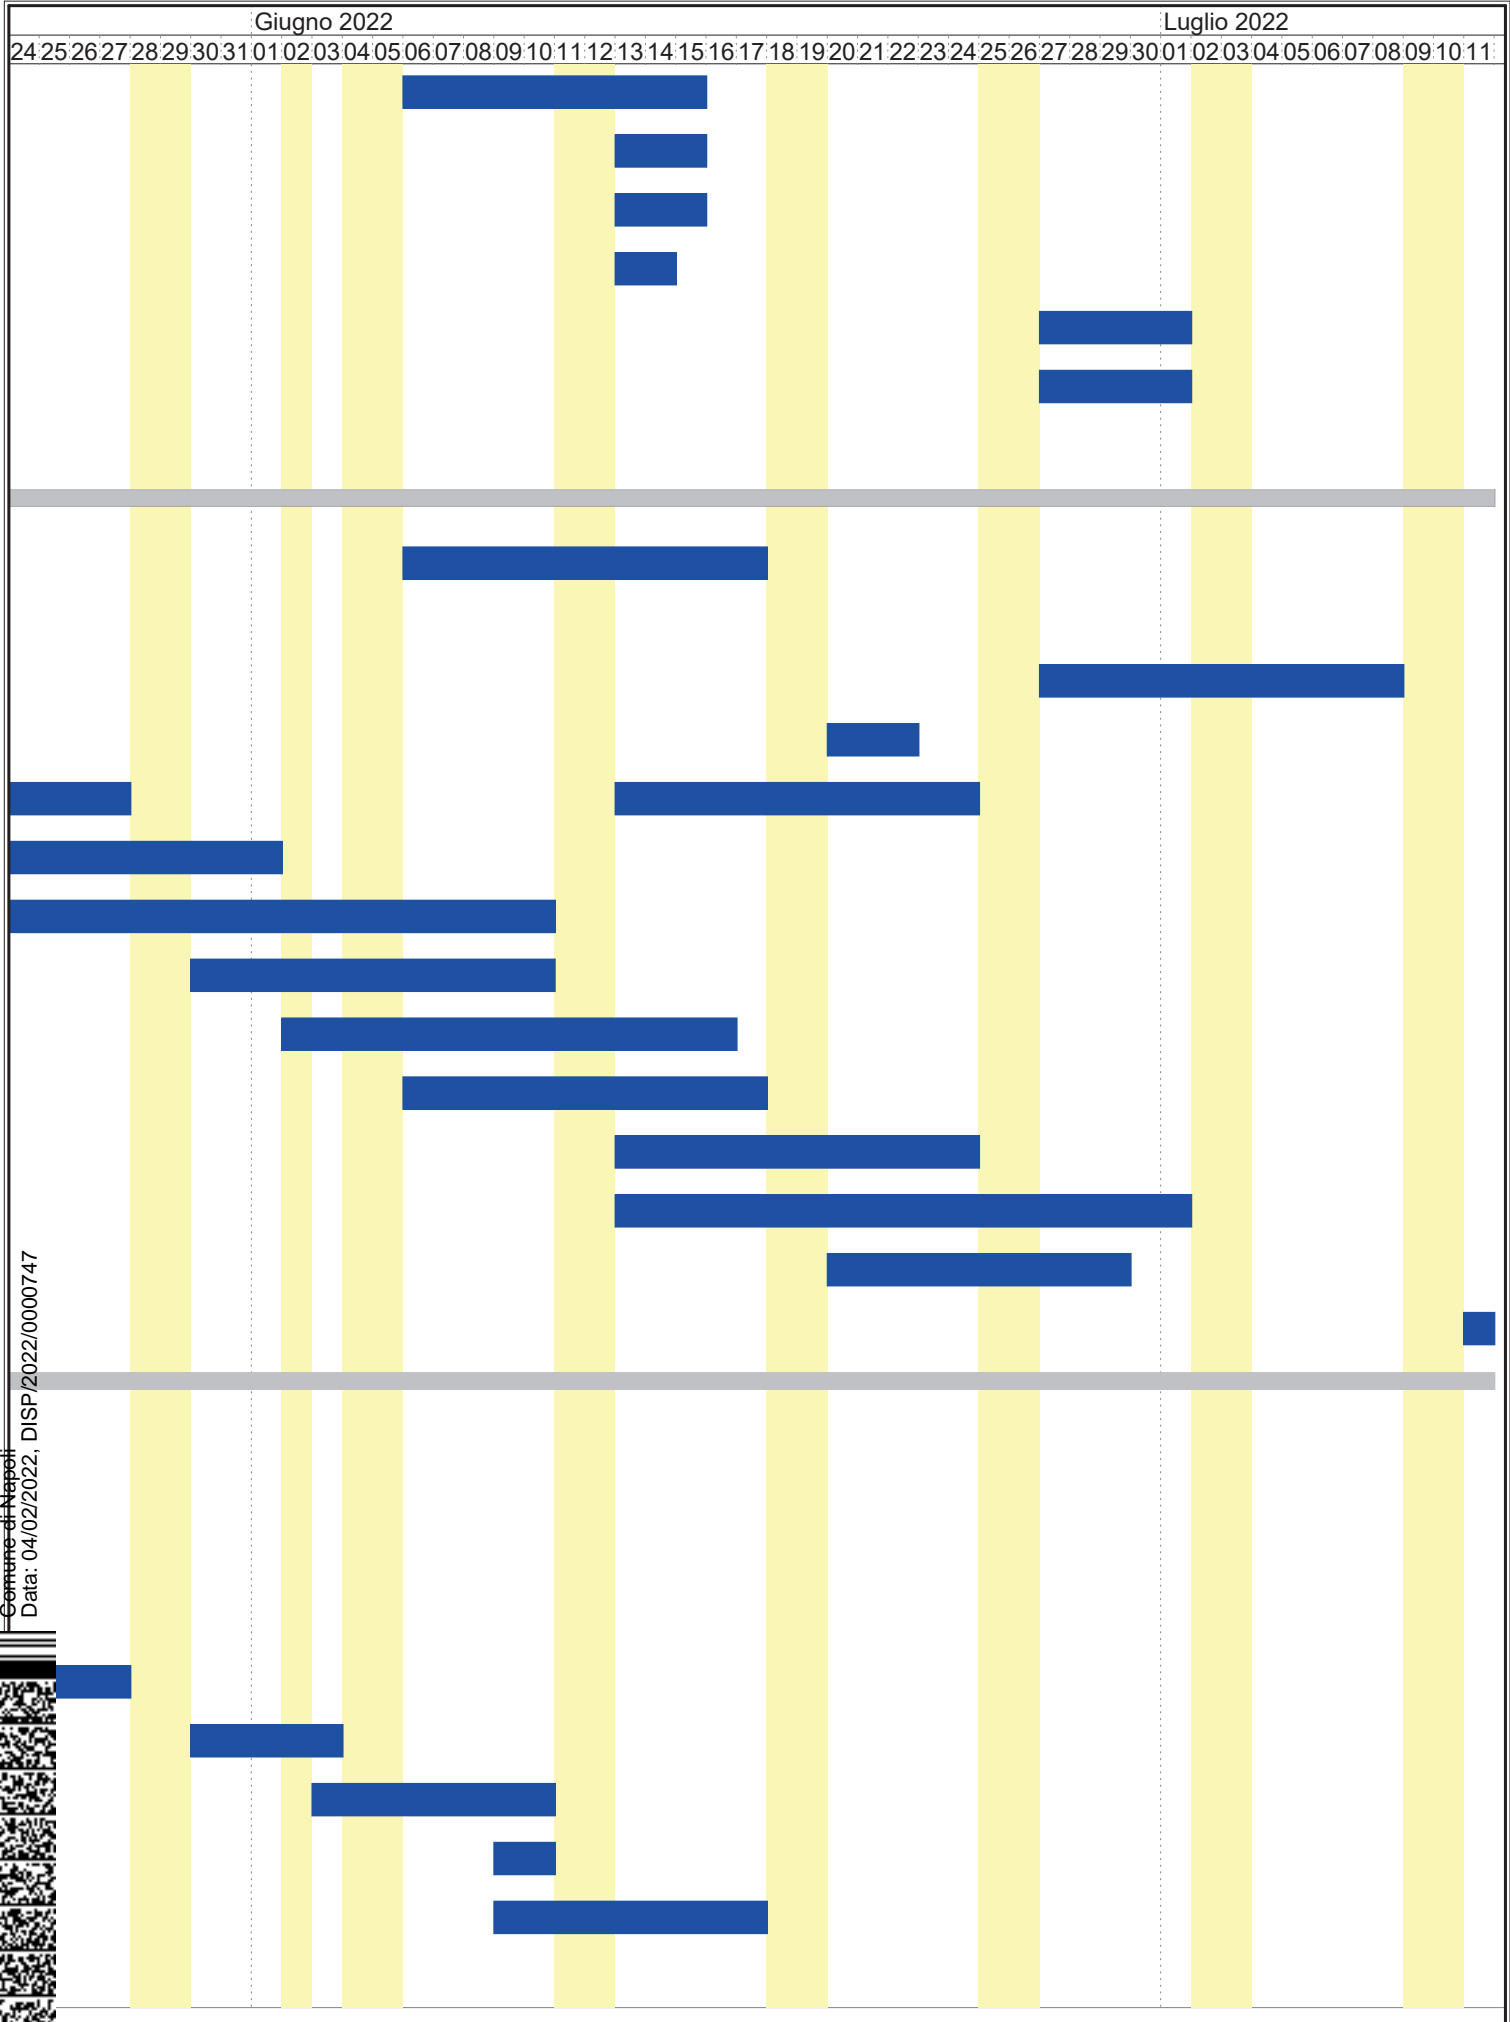


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



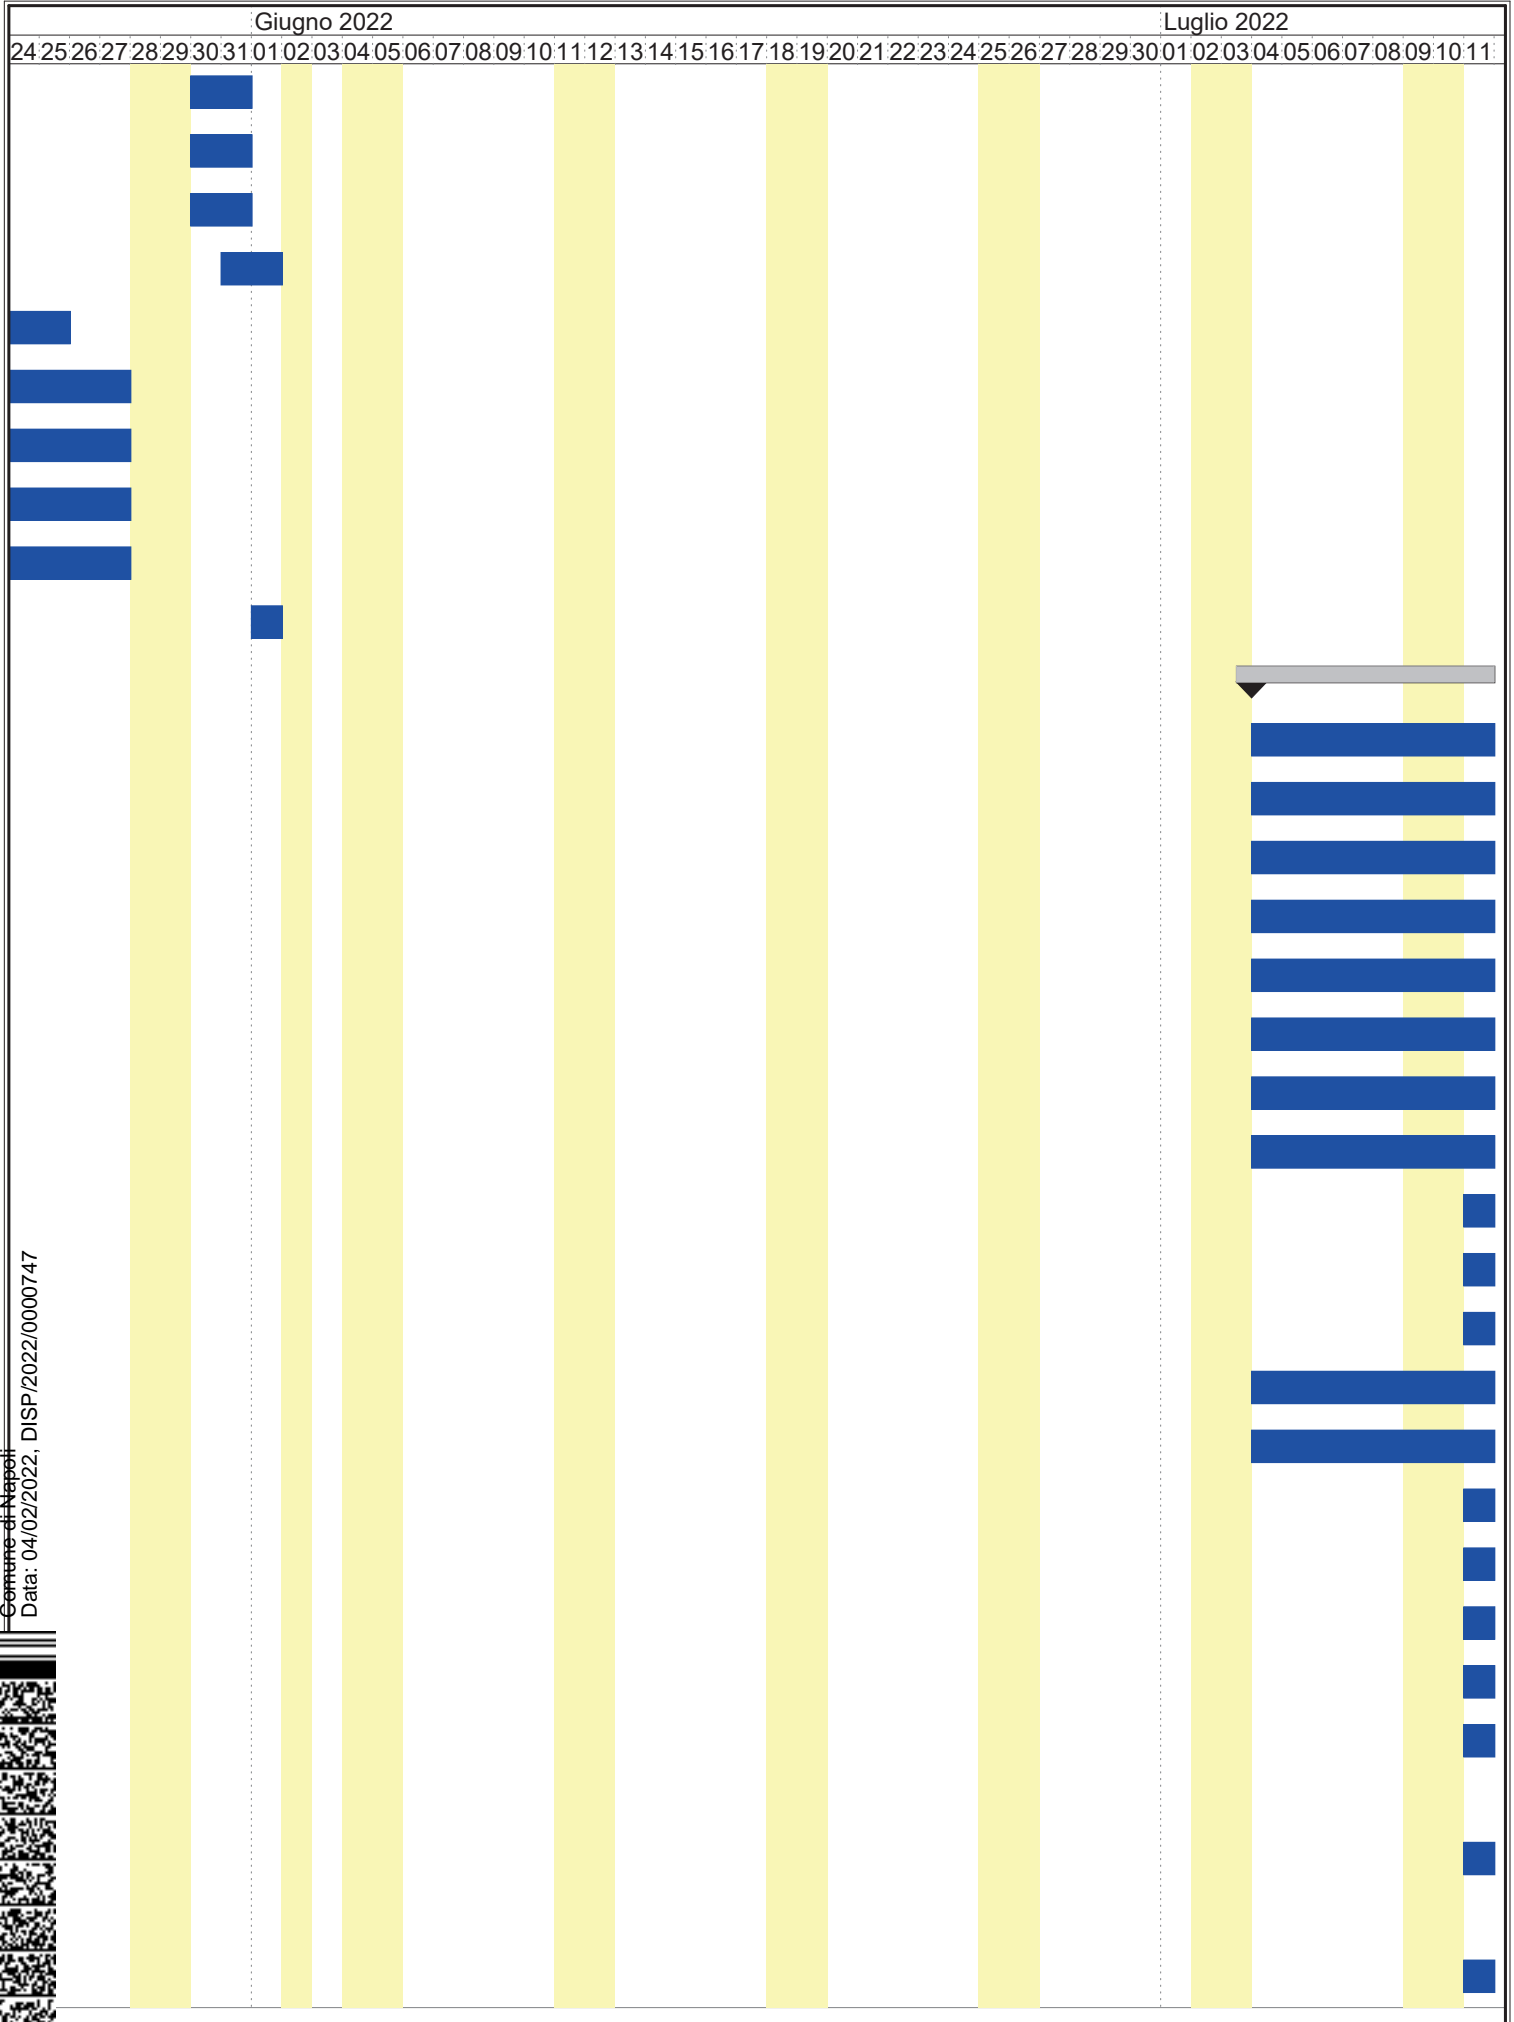

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747




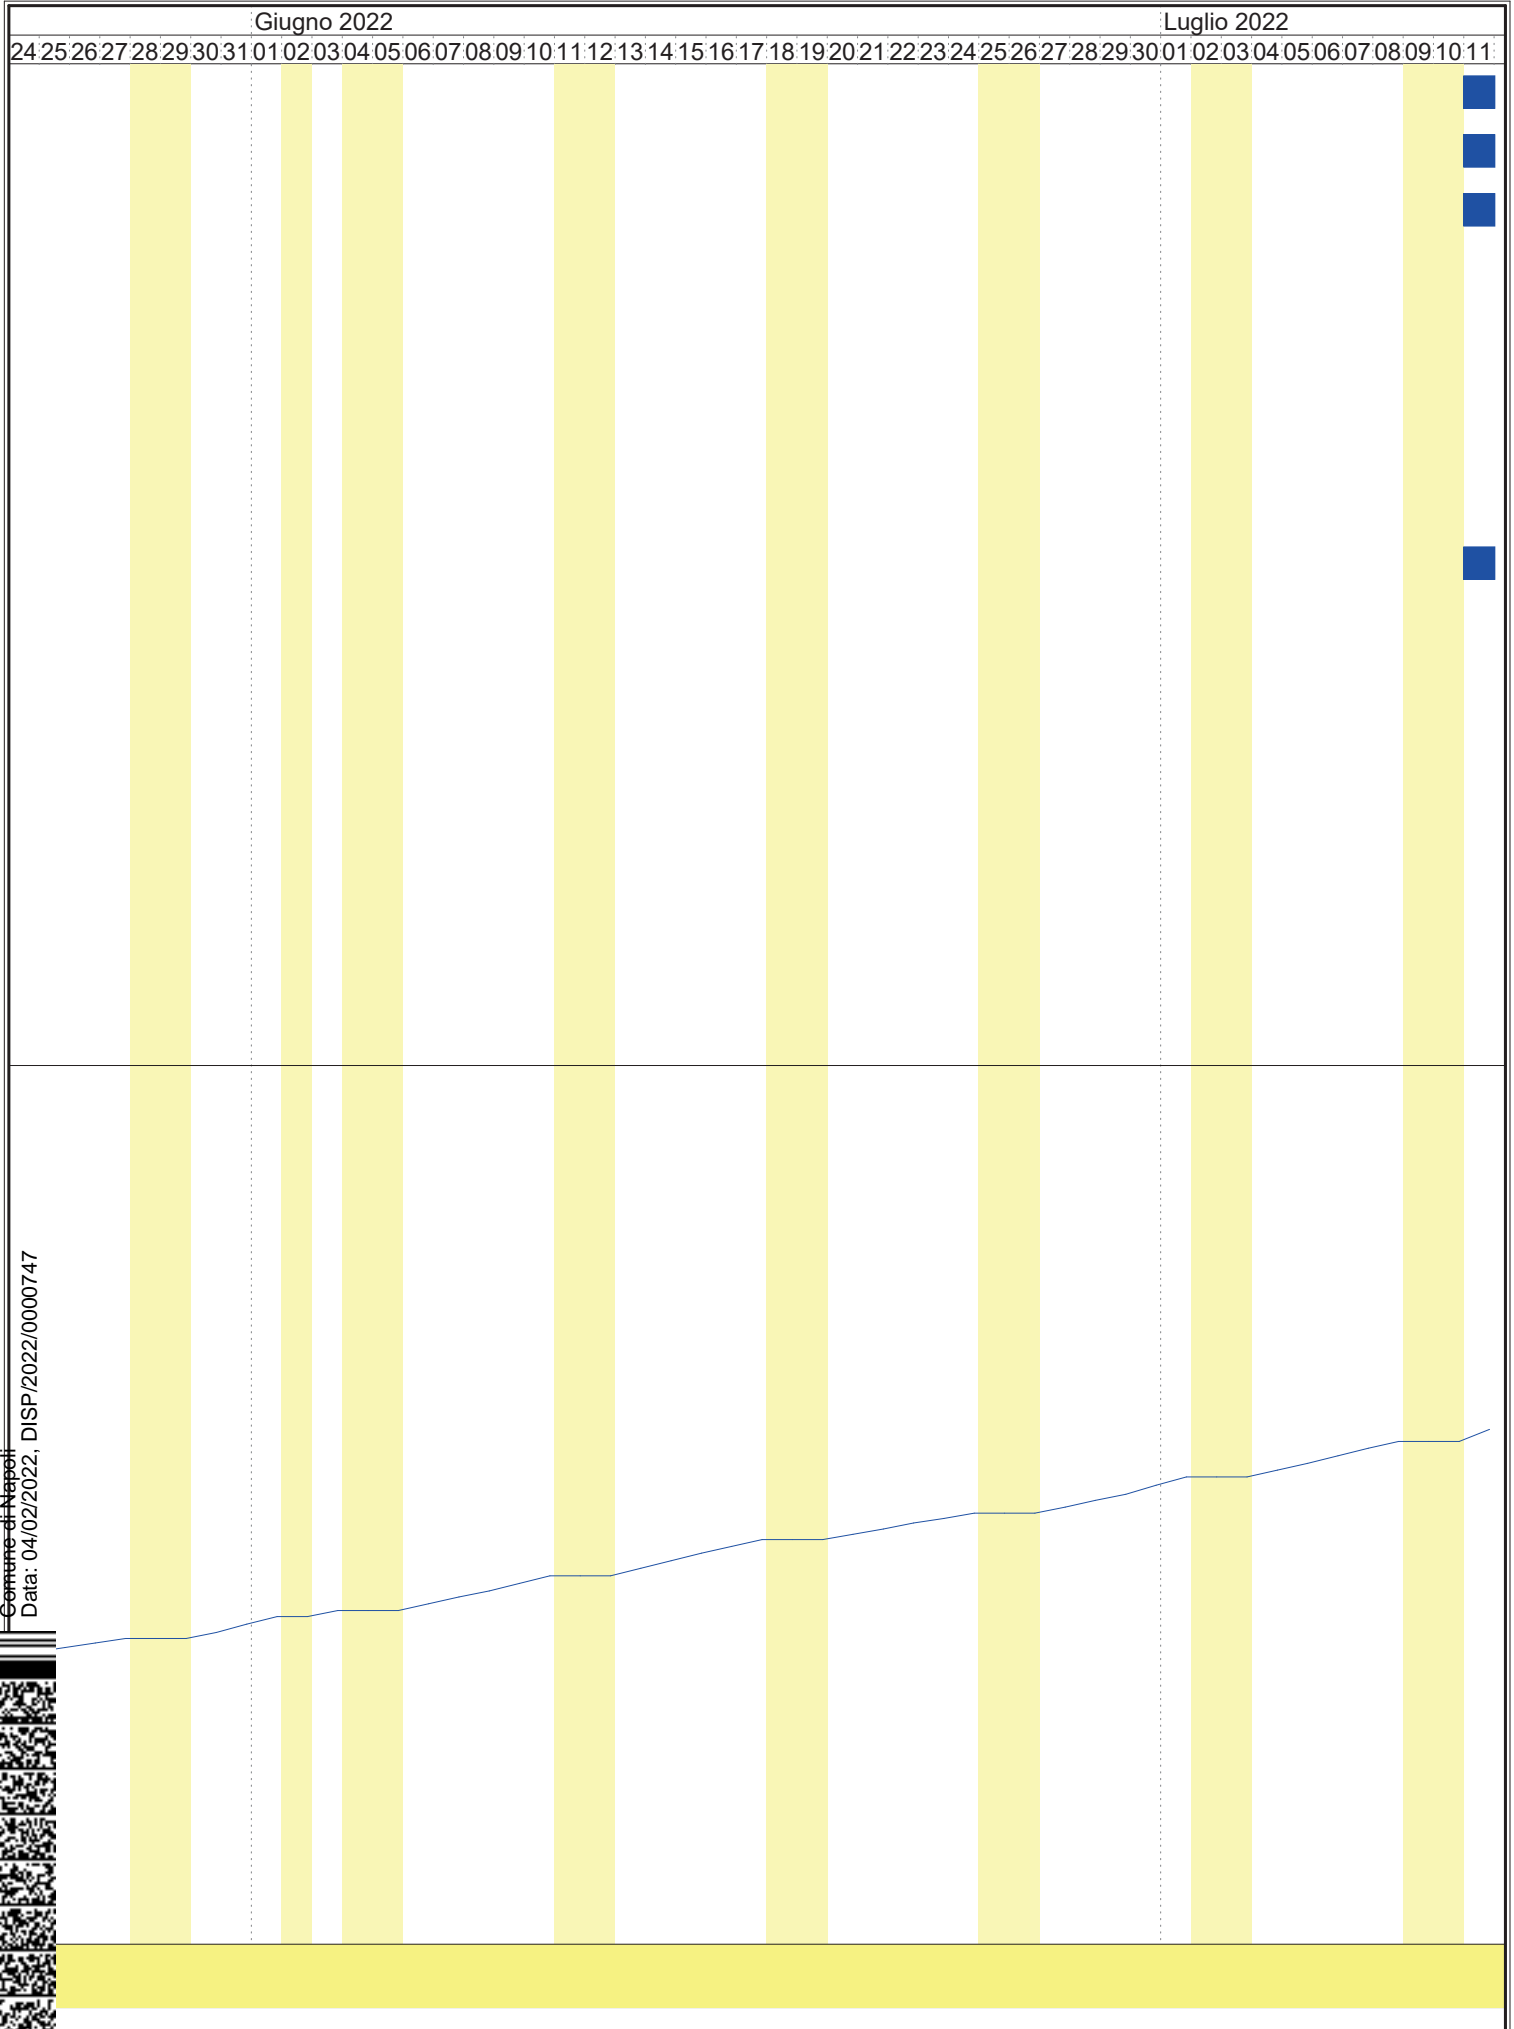

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747

Agosto 2022

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

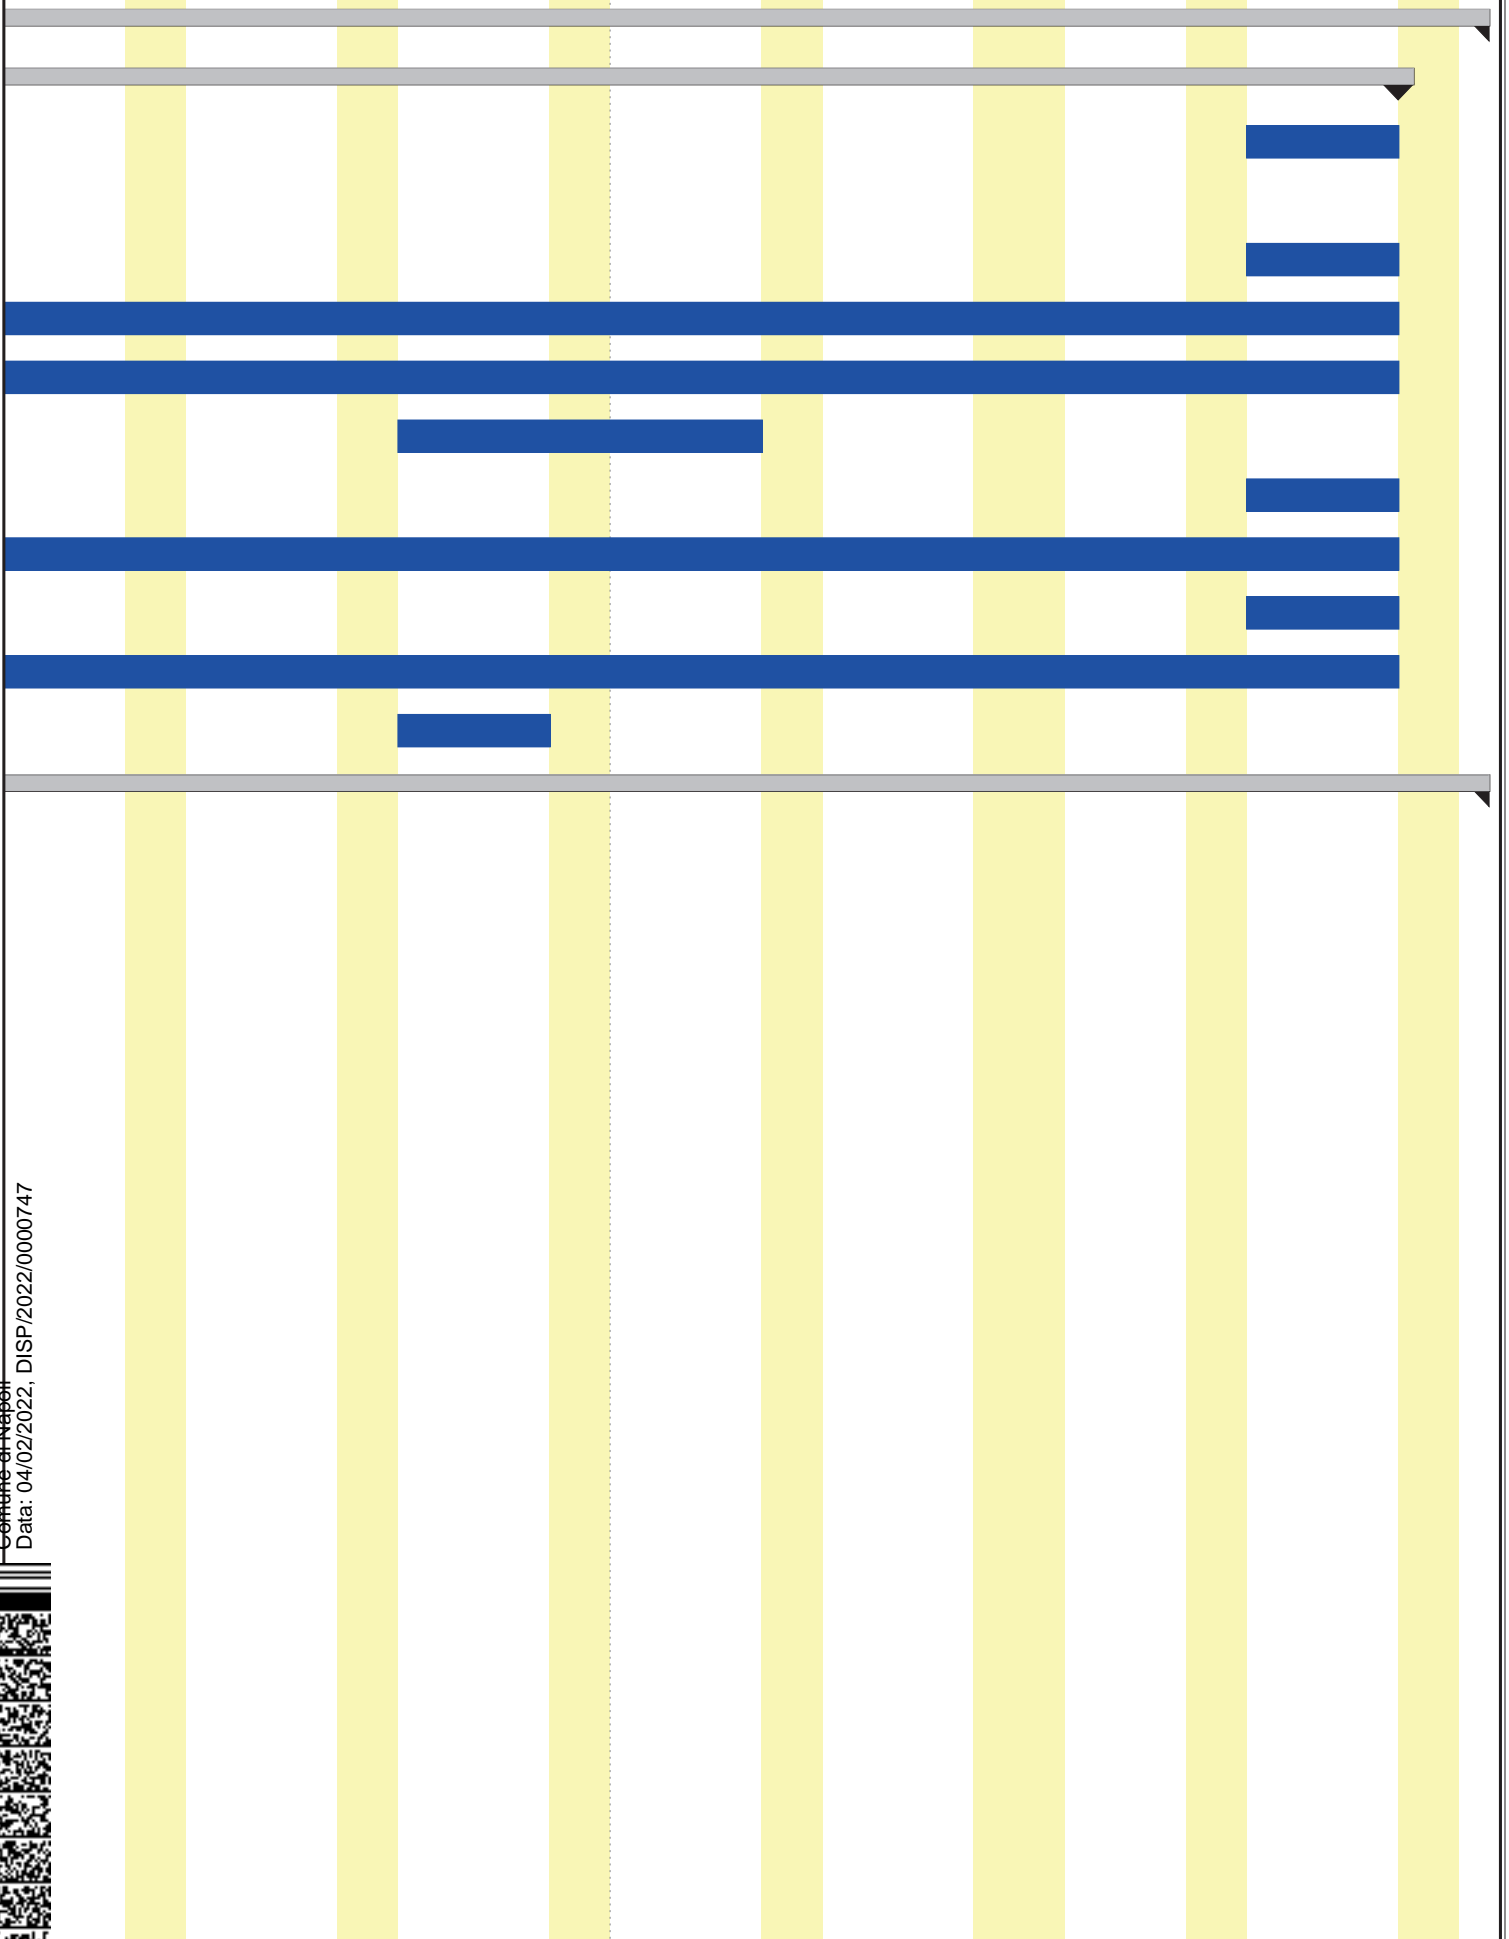


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Agosto 2022

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

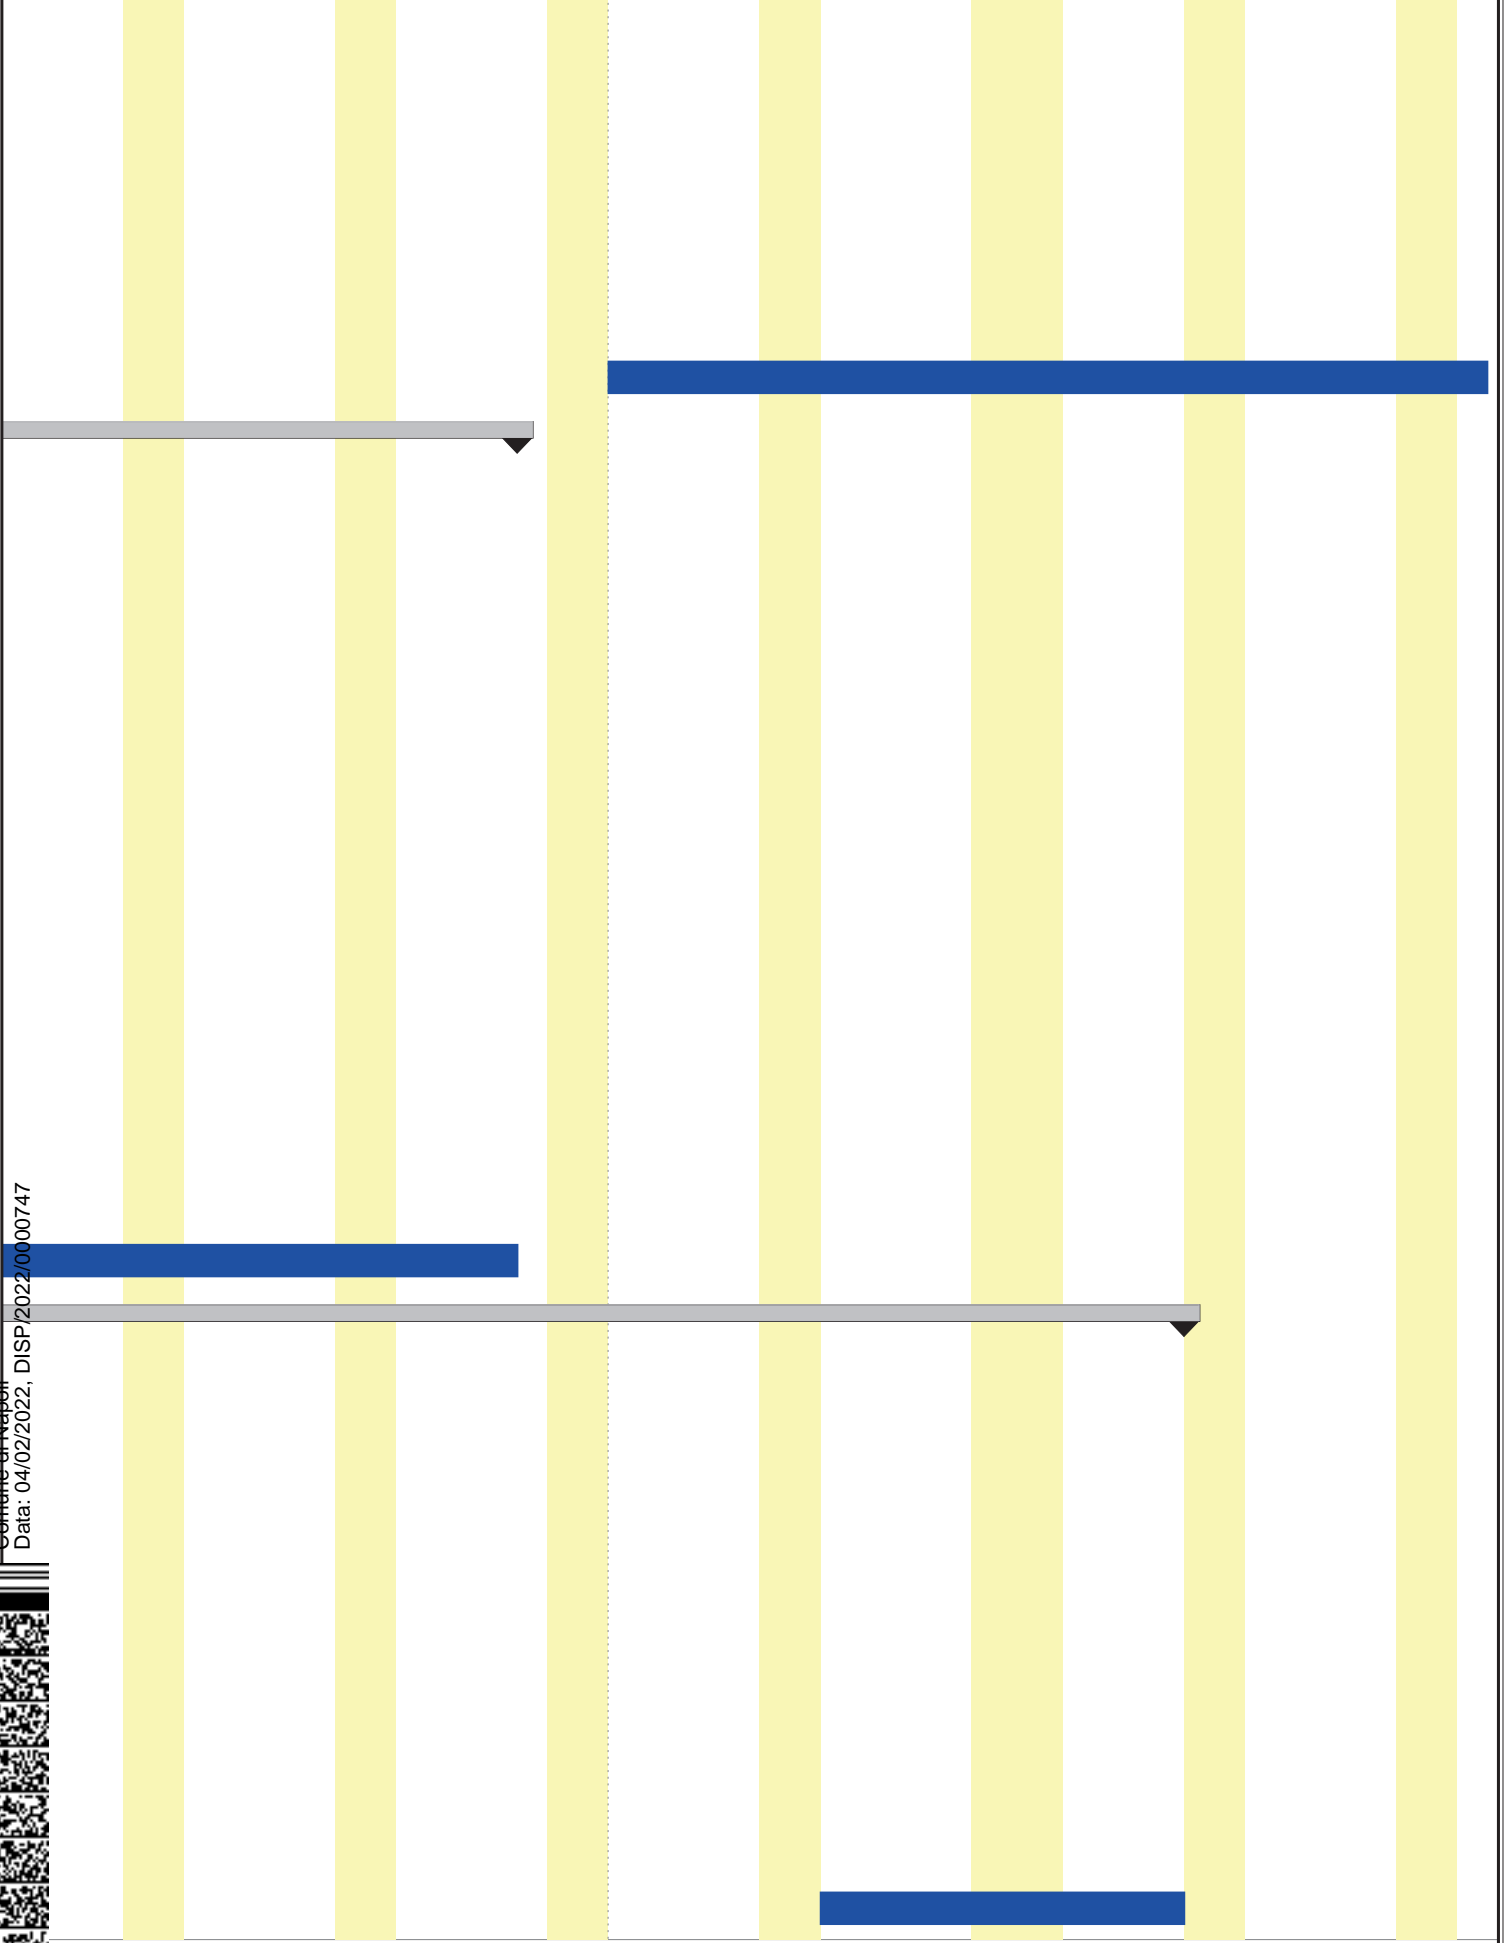


Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Agosto 2022


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

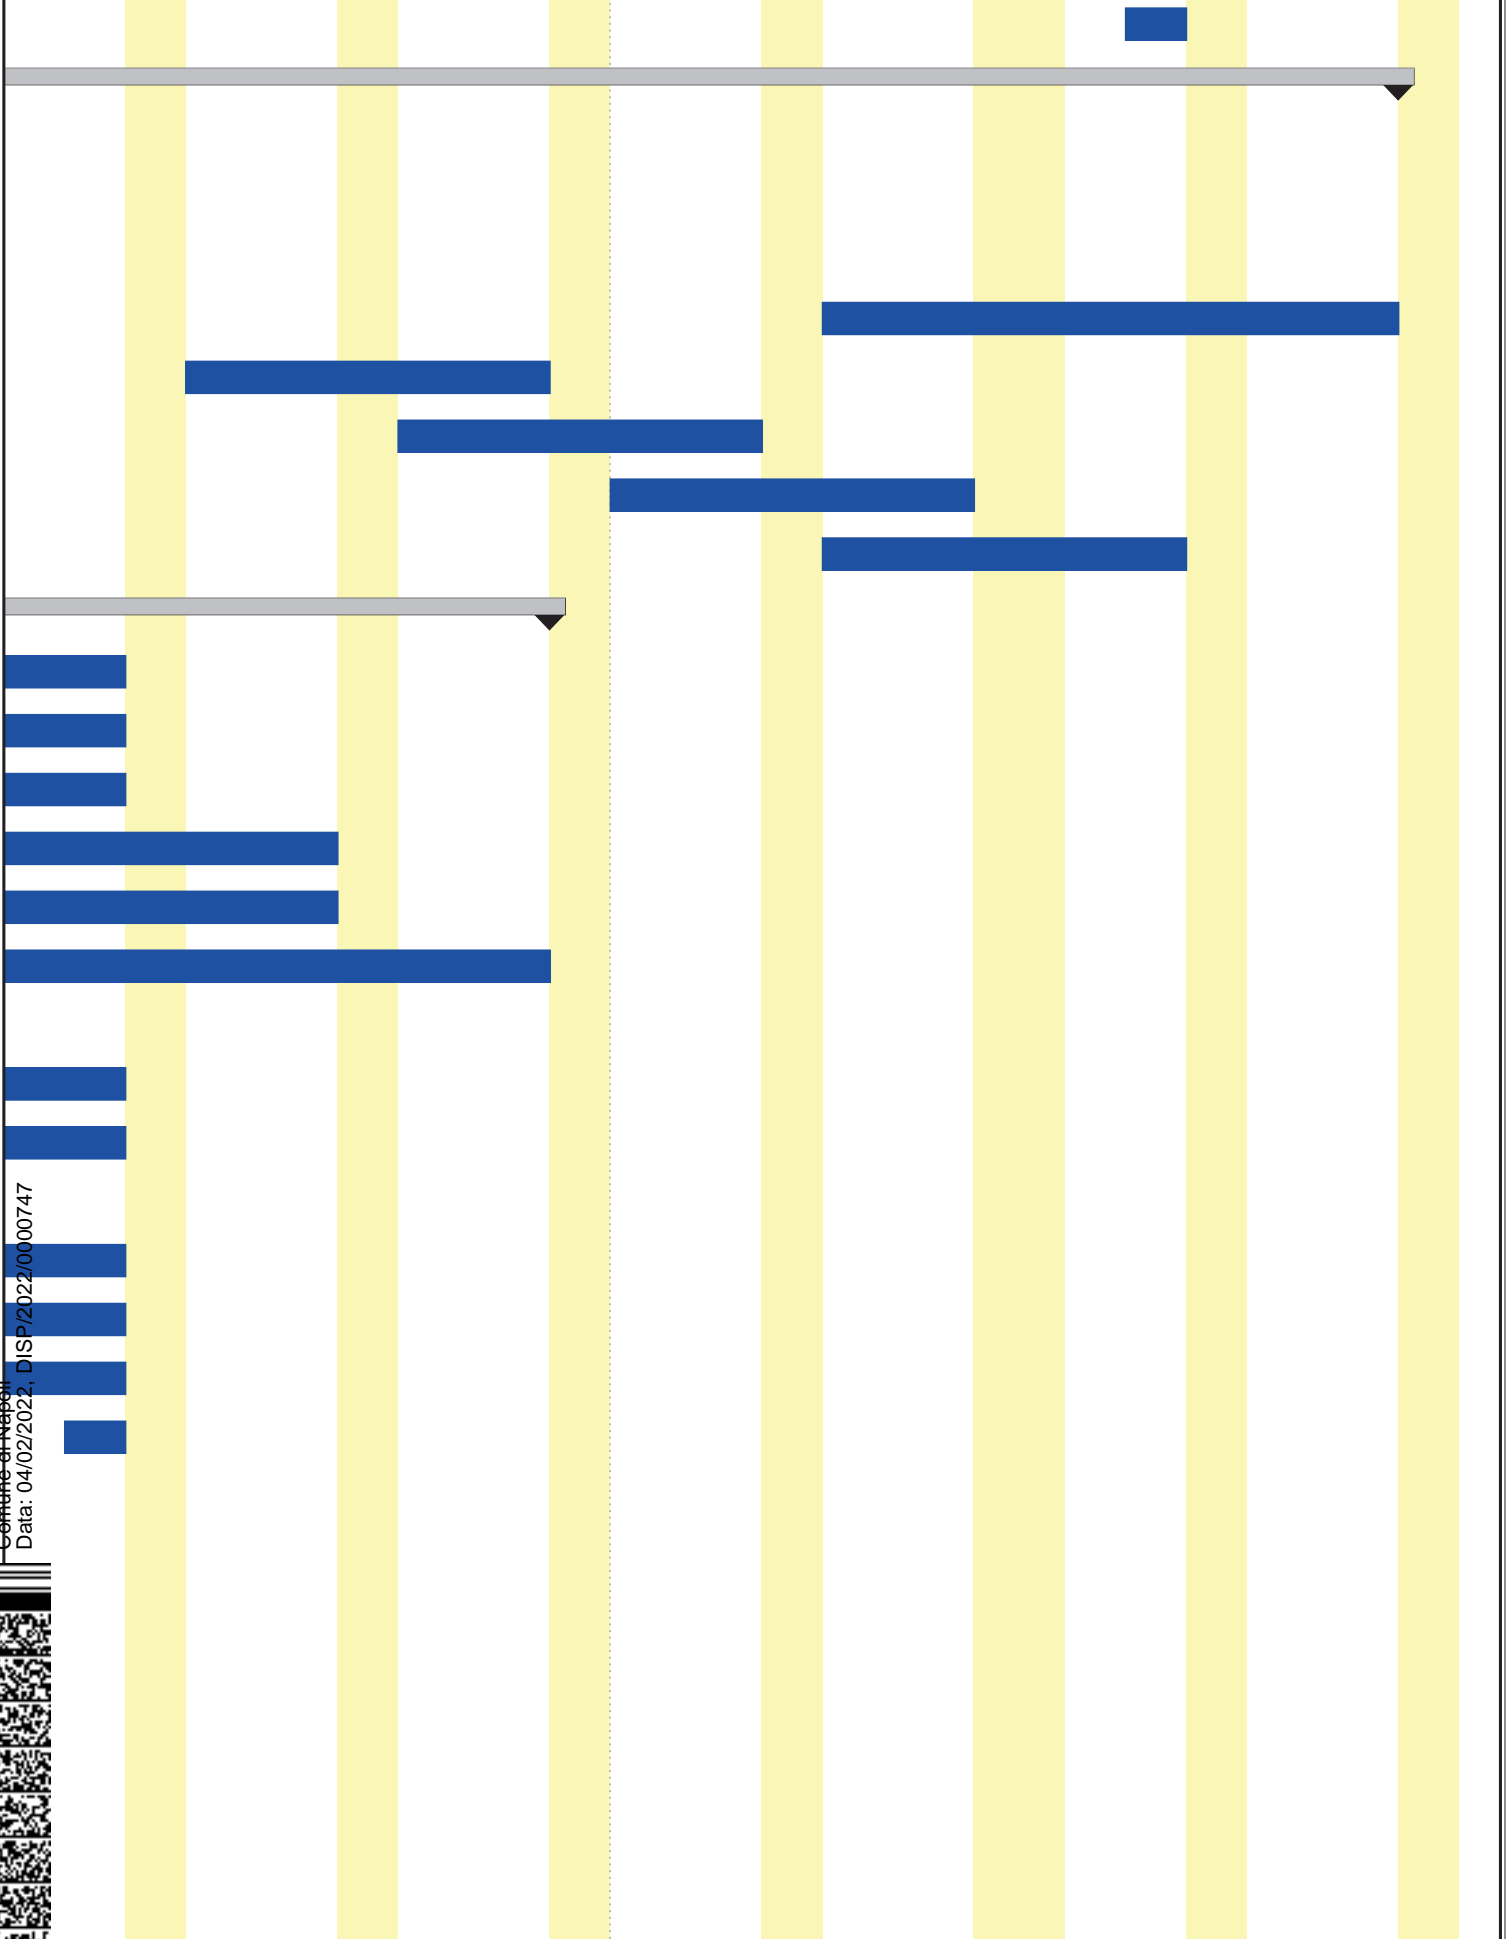

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747

Agosto 2022



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

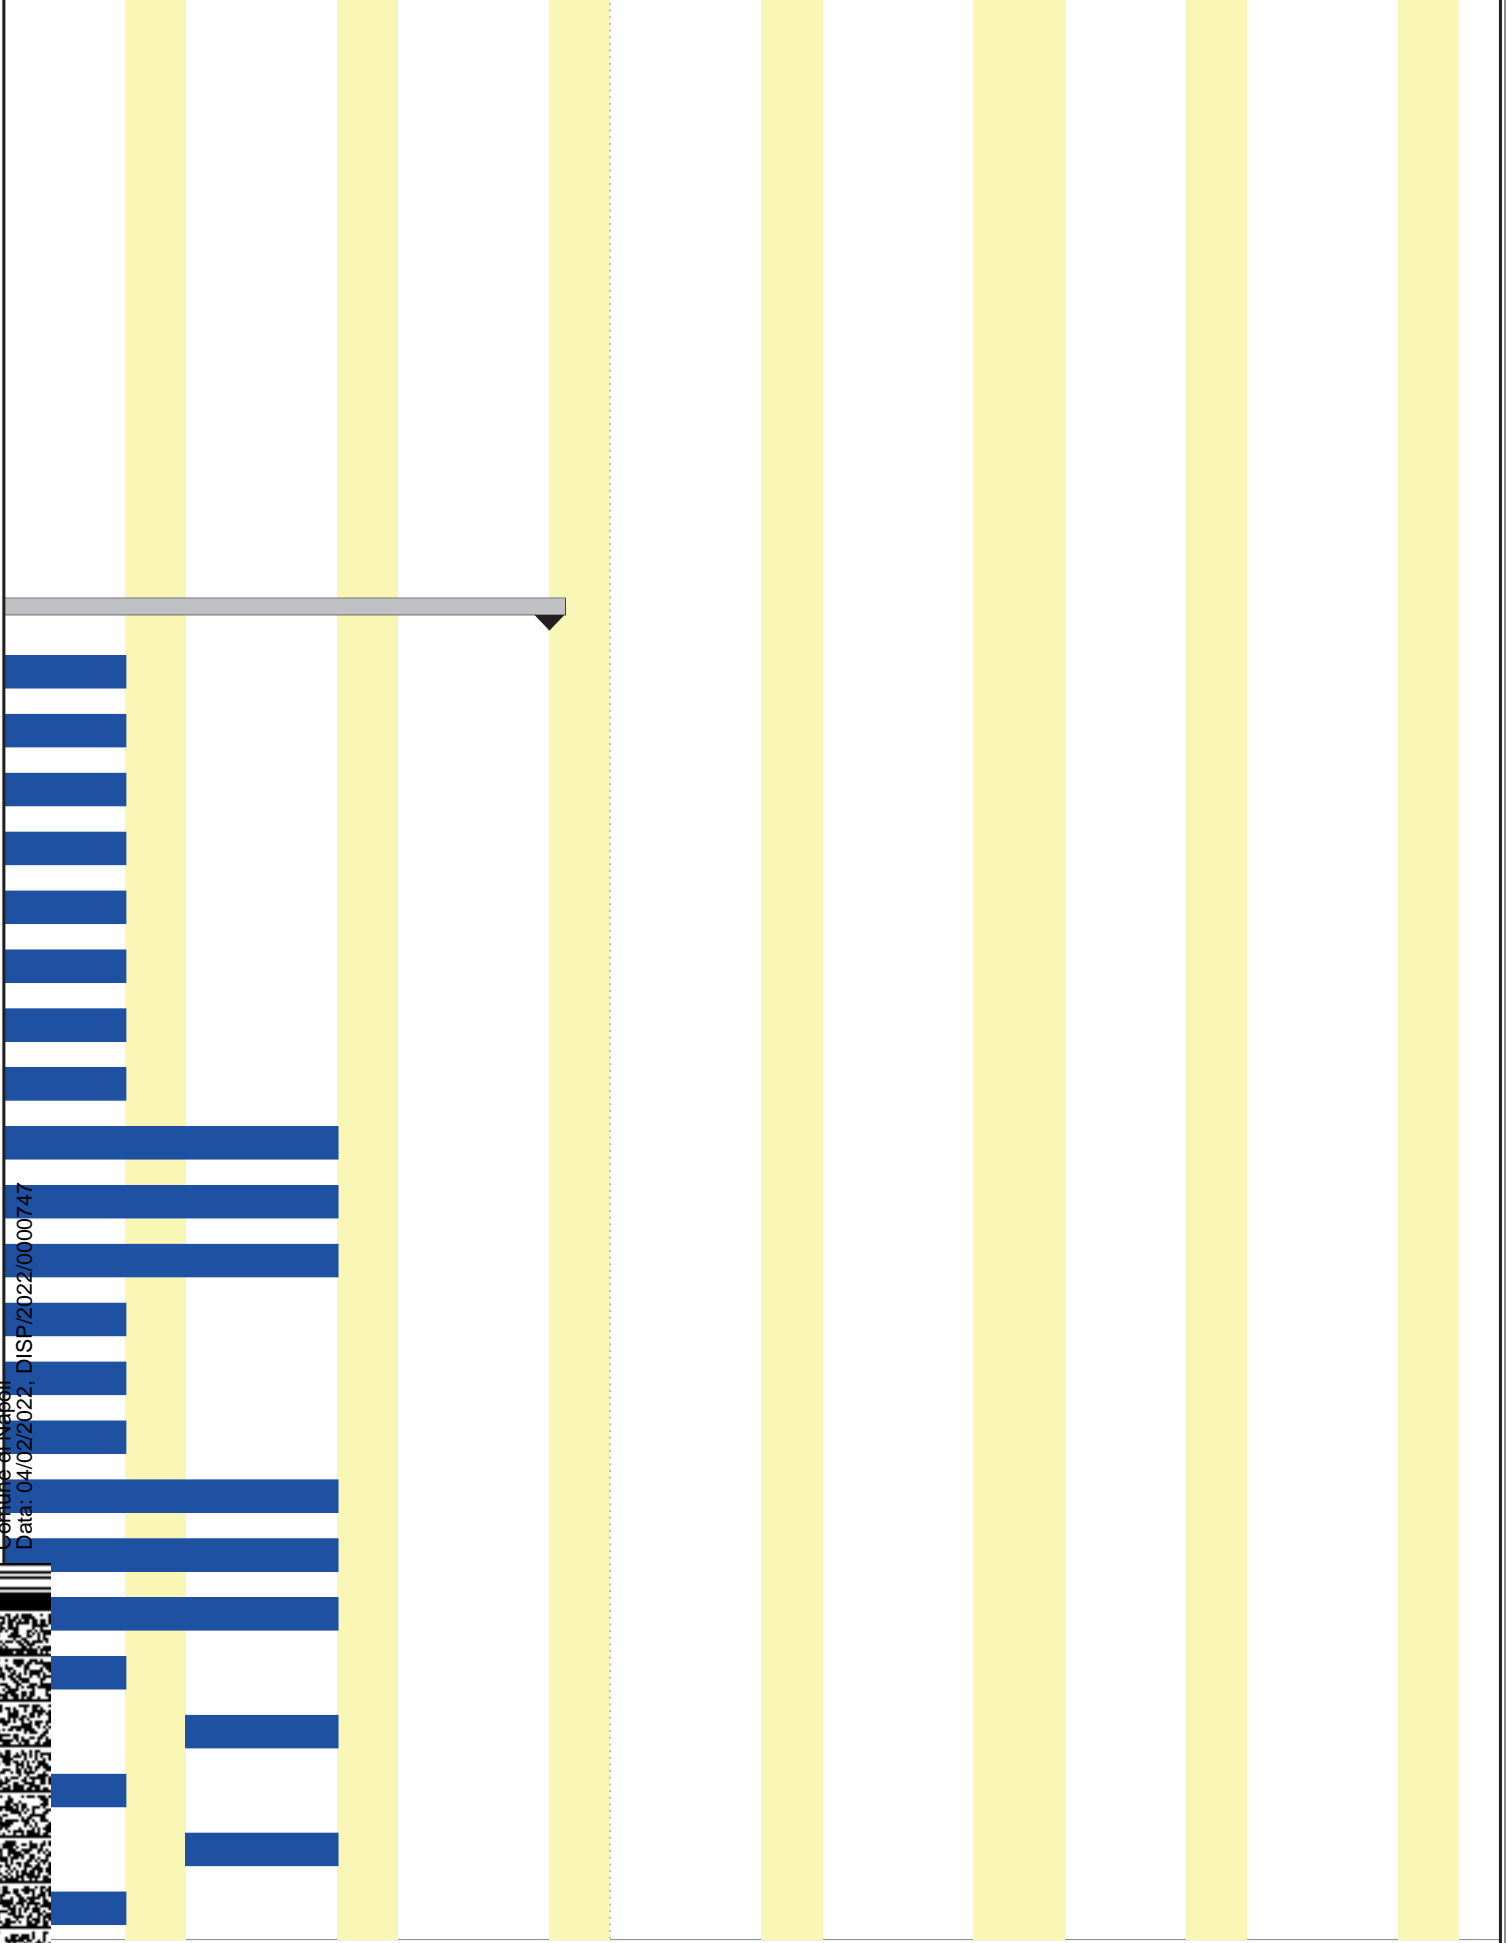

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747

Agosto 2022

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

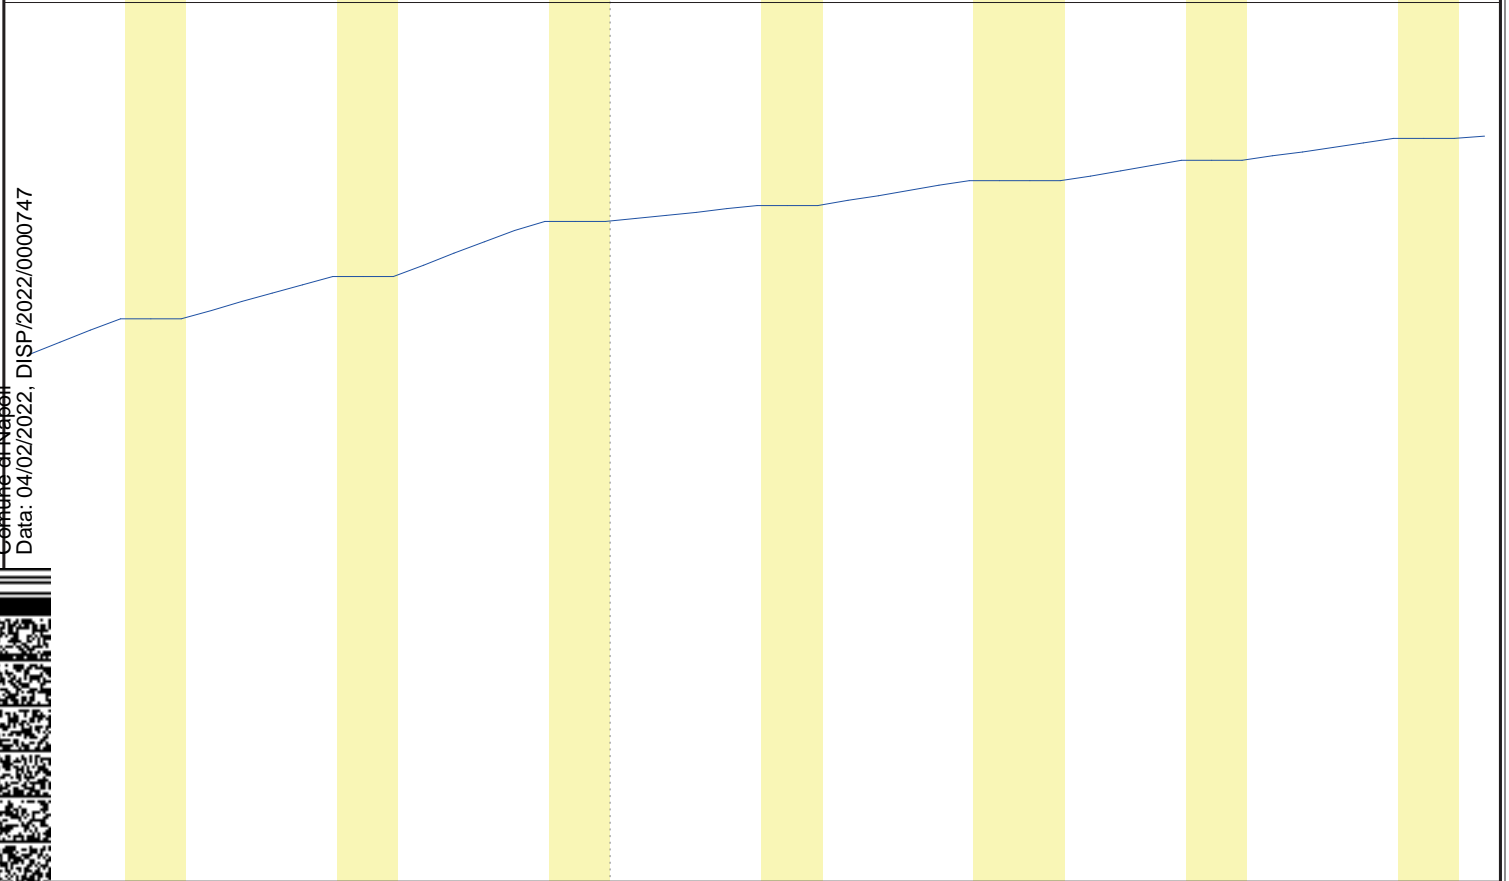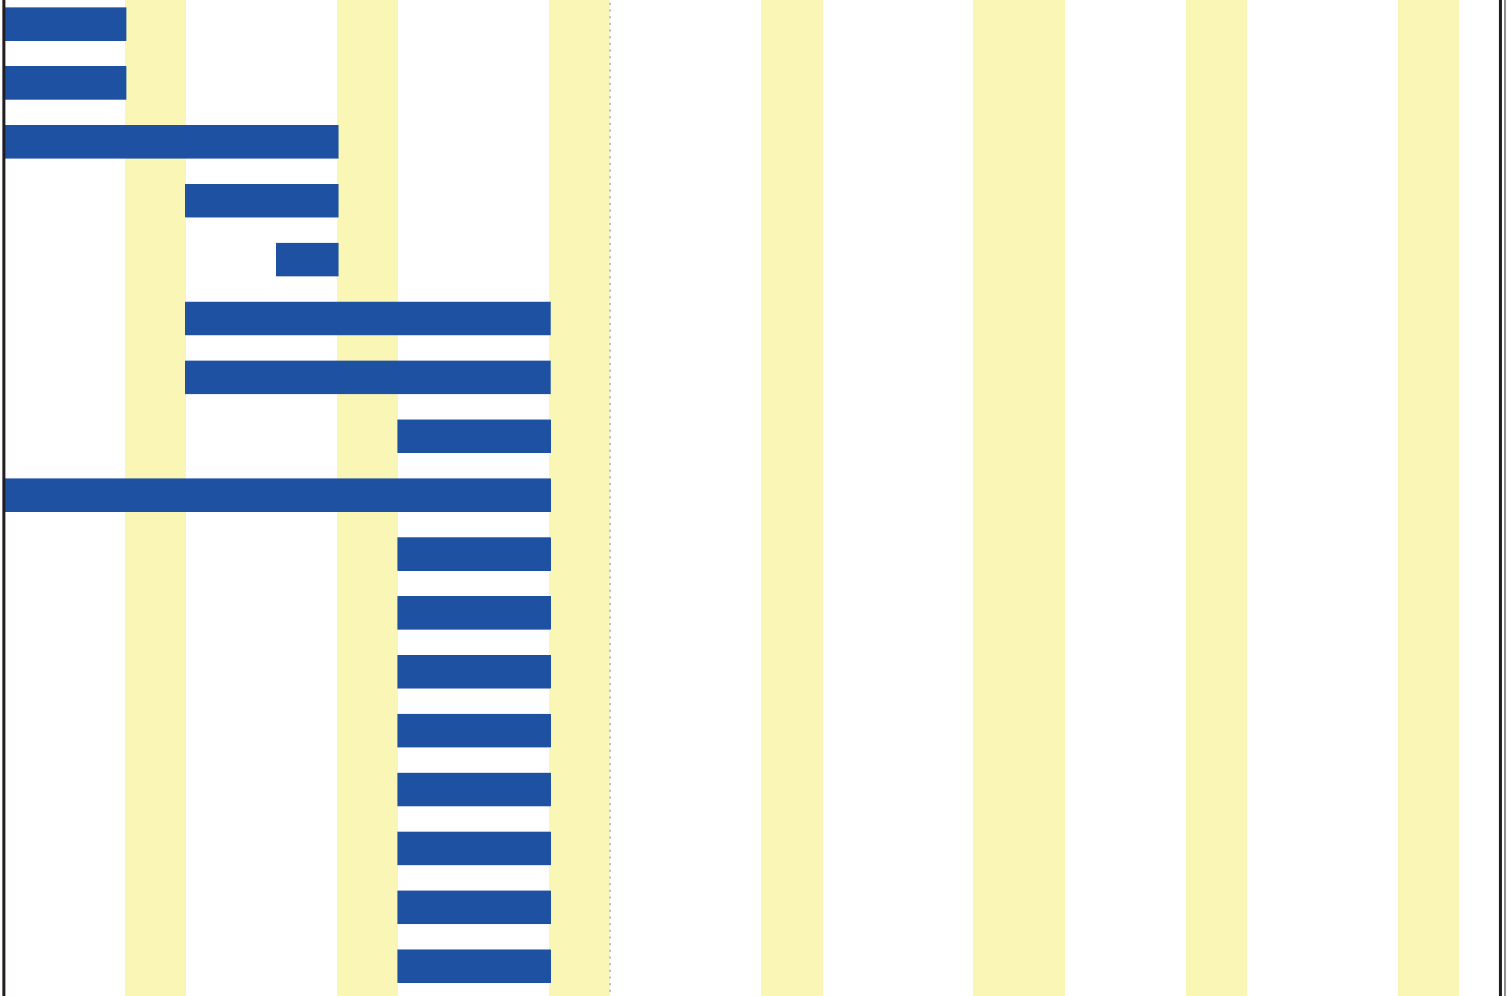

Comune di Napoli
Data: 04/02/2022, DISP/2022/0000747



Comune di Napoli (Na)

Area Patrimonio

Servizio Tecnico Patrimonio

TABELLA ATTIVITA'

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del blocco uffici al piano quarto prospiciente la Corte C - Palazzo San Giacomo - Napoli

COMMITTENTE: Comune di Napoli (Na)
Area Patrimonio – Servizio Tecnico del Patrimonio

CANTIERE: Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – Comune di Napoli

Napoli (Na), 26/01/2022

IL TECNICO



(arch. Concetta Miragliuolo)

Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 5° D.lgs. 250/2016, denominato “Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica immobili comuni non a reddito”.

Dirigente: Ing. Vincenzo Brandi

R.U.P.: Arch. Guglielmo Pescatore



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	489'208,22	100,000	31/01/2022	29/08/2022	147	211
* Opere provvisionali	50'765,77	10,377	31/01/2022	26/08/2022	146	208
* * Smobilizzo e pulizia cantiere.	0,00	0,000	22/08/2022	26/08/2022	5	5
* * Allestimento cantiere	0,00	0,000	31/01/2022	03/02/2022	4	4
* * Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... o quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	2'299,24	0,470	02/02/2022	26/08/2022	12	14
** periodo 01	1'341,14	0,274	02/02/2022	10/02/2022	7	9
** periodo 02	958,10	0,196	22/08/2022	26/08/2022	5	5
* * Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... uperficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	2'693,66	0,551	01/03/2022	26/08/2022	125	179
* * Trasporto e montaggio di montacarichi da cantiere a piatt ... ontaggio e noleggio mensile compreso lo smontaggio finale.	9'012,96	1,842	01/02/2022	26/08/2022	145	207
* * Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... abilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m	1'232,40	0,252	14/02/2022	05/08/2022	50	60
** periodo 01	246,48	0,050	14/02/2022	25/02/2022	10	12
** periodo 02	246,48	0,050	28/03/2022	08/04/2022	10	12
** periodo 03	246,48	0,050	09/05/2022	20/05/2022	10	12
** periodo 04	246,48	0,050	20/06/2022	01/07/2022	10	12
** periodo 05	246,48	0,050	25/07/2022	05/08/2022	10	12
* * Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	1'083,93	0,222	03/02/2022	26/08/2022	15	19
** periodo 01	722,62	0,148	03/02/2022	16/02/2022	10	14
** periodo 02	361,31	0,074	22/08/2022	26/08/2022	5	5
* * Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... perficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	982,24	0,201	01/03/2022	26/08/2022	125	179
* * Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... drati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione	2'130,66	0,436	07/02/2022	26/08/2022	20	24
** periodo 01	1'598,00	0,327	07/02/2022	25/02/2022	15	19
** periodo 02	532,67	0,109	22/08/2022	26/08/2022	5	5
* * Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... ti di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	1'592,42	0,326	01/03/2022	26/08/2022	125	179
* * Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, ... ervita senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	29'738,26	6,079	21/02/2022	29/07/2022	34	35
** periodo 01	4'373,16	0,894	21/02/2022	25/02/2022	5	5
** periodo 02	4'373,16	0,894	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** periodo 03	4'373,16	0,894	11/04/2022	15/04/2022	5	5
** periodo 04	4'373,16	0,894	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** periodo 05	3'499,30	0,715	30/05/2022	03/06/2022	4	5
** periodo 06	4'373,16	0,894	27/06/2022	01/07/2022	5	5
** periodo 07	4'373,16	0,894	25/07/2022	29/07/2022	5	5
rimozioni, demolizioni e trasporti	96'814,78	19,790	14/02/2022	29/08/2022	137	197
* * Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... il porto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso	1'709,04	0,349	14/02/2022	25/02/2022	10	12
* * Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... oni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	1'257,00	0,257	14/02/2022	25/02/2022	10	12
* * Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra e superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	2'378,89	0,486	21/02/2022	03/06/2022	38	47
** periodo 01	626,04	0,128	21/02/2022	04/03/2022	10	12

Comune di Napoli
 Data: 04/02/2022
 CUP: 2022/0000747

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** periodo 02	626,04	0,128	28/03/2022	08/04/2022	10	12
** periodo 03	563,43	0,115	26/04/2022	06/05/2022	9	11
** periodo 04	563,38	0,115	23/05/2022	03/06/2022	9	12
** Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... enti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo	16'035,77	3,278	21/02/2022	10/06/2022	58	75
** periodo 01	4'147,04	0,848	21/02/2022	11/03/2022	15	19
** periodo 02	4'147,04	0,848	28/03/2022	15/04/2022	15	19
** periodo 03	3'870,69	0,791	26/04/2022	13/05/2022	14	18
** periodo 04	3'871,00	0,791	23/05/2022	10/06/2022	14	19
** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	1'210,41	0,247	07/03/2022	14/06/2022	28	37
** periodo 01	302,63	0,062	07/03/2022	15/03/2022	7	9
** periodo 02	302,63	0,062	11/04/2022	20/04/2022	7	10
** periodo 03	302,63	0,062	09/05/2022	17/05/2022	7	9
** periodo 04	302,53	0,062	06/06/2022	14/06/2022	7	9
** Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, ... uadrato per centimetro di profondità Larghezza fino a 5 cm	3'950,86	0,808	28/03/2022	08/07/2022	20	20
** periodo 01	987,71	0,202	28/03/2022	01/04/2022	5	5
** periodo 02	987,71	0,202	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** periodo 03	987,71	0,202	13/06/2022	17/06/2022	5	5
** periodo 04	987,71	0,202	04/07/2022	08/07/2022	5	5
** Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... ura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a 100 mm	588,80	0,120	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... ernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	396,55	0,081	07/03/2022	11/03/2022	5	5
** Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm	322,48	0,066	07/03/2022	11/03/2022	5	5
** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti	7'915,96	1,618	14/02/2022	06/05/2022	20	20
** periodo 01	1'979,31	0,405	14/02/2022	18/02/2022	5	5
** periodo 02	1'979,31	0,405	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** periodo 03	1'979,31	0,405	04/04/2022	08/04/2022	5	5
** periodo 04	1'978,04	0,404	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre all'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso	5'187,52	1,060	14/02/2022	06/05/2022	20	20
** periodo 01	1'297,09	0,265	14/02/2022	18/02/2022	5	5
** periodo 02	1'297,09	0,265	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** periodo 03	1'297,09	0,265	04/04/2022	08/04/2022	5	5
** periodo 04	1'296,26	0,265	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** Trasporto a scarica autorizzata controllata di material ... scarica autorizzata controllata di materiali di risulta	2'447,59	0,500	14/02/2022	06/05/2022	20	20
** periodo 01	611,82	0,125	14/02/2022	18/02/2022	5	5
** periodo 02	611,82	0,125	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** periodo 03	611,82	0,125	04/04/2022	08/04/2022	5	5
** periodo 04	612,13	0,125	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** Trasporto a scarica autorizzata di materiali provenienti ... ica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10	567,14	0,116	14/02/2022	06/05/2022	20	20
** periodo 01	141,80	0,029	14/02/2022	18/02/2022	5	5
** periodo 02	141,80	0,029	14/03/2022	18/03/2022	5	5
** periodo 03	141,80	0,029	04/04/2022	08/04/2022	5	5
** periodo 04	141,73	0,029	02/05/2022	06/05/2022	5	5
** Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimension ... di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione	1'136,74	0,232	07/03/2022	11/03/2022	5	5

Comune di Napoli
 Data: 04/02/2022, DISP. 02/0000747

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... mozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	325,36	0,067	07/03/2022	11/03/2022	5	5
** Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature	2'184,19	0,446	21/03/2022	08/04/2022	15	19
** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti	7'728,69	1,580	09/05/2022	10/05/2022	2	2
** Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso	5'064,80	1,035	09/05/2022	10/05/2022	2	2
** Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	221,86	0,045	09/05/2022	10/05/2022	2	2
** Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... ica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10	51,41	0,011	09/05/2022	15/06/2022	10	12
** periodo 01	10,27	0,002	09/05/2022	10/05/2022	2	2
** periodo 02	41,13	0,008	06/06/2022	15/06/2022	8	10
** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti	166,95	0,034	13/06/2022	15/06/2022	3	3
** Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso	109,41	0,022	13/06/2022	15/06/2022	3	3
** Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³	159,61	0,033	13/06/2022	14/06/2022	2	2
** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... i superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti	1'741,26	0,356	27/06/2022	01/07/2022	5	5
** Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... anovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso	1'141,09	0,233	27/06/2022	01/07/2022	5	5
** Interventi di riparazioni alle pluviali ed ai canali di s ... edilizia acrobatica ed arrampicatori. Per n. 2 operatori.	32'815,40	6,708	01/08/2022	29/08/2022	20	29
Risanamenti e consolidamenti	166'015,92	33,936	28/02/2022	28/07/2022	106	151
** Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... enti o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo	4'395,44	0,898	28/02/2022	17/06/2022	41	51
** periodo 01	1'072,16	0,219	28/02/2022	11/03/2022	10	12
** periodo 02	1'179,28	0,241	01/04/2022	15/04/2022	11	15
** periodo 03	1'072,16	0,219	09/05/2022	20/05/2022	10	12
** periodo 04	1'071,85	0,219	06/06/2022	17/06/2022	10	12
** Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, ... sanamento di paramenti murari con problemi di umidità.	9'382,48	1,918	07/03/2022	11/03/2022	5	5
** Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ... ndo le seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni	8'730,13	1,785	24/03/2022	08/07/2022	27	35
** periodo 01	5'497,77	1,124	24/03/2022	15/04/2022	17	23
** periodo 02	3'232,36	0,661	27/06/2022	08/07/2022	10	12
** Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a atto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	5'501,80	1,125	28/03/2022	22/06/2022	18	20
** periodo 01	3'056,52	0,625	28/03/2022	08/04/2022	10	12
** periodo 02	1'528,41	0,312	16/05/2022	20/05/2022	5	5
** periodo 03	916,87	0,187	20/06/2022	22/06/2022	3	3
** trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... a a e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura	15'759,34	3,221	14/03/2022	24/06/2022	35	44


ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** periodo 01	4'502,60	0,920	14/03/2022	26/03/2022	10	13
** periodo 02	6'753,90	1,381	09/05/2022	27/05/2022	15	19
** periodo 03	4'502,84	0,920	13/06/2022	24/06/2022	10	12
** Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di r ... dico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto	8'014,56	1,638	28/03/2022	01/06/2022	23	29
** periodo 01	3'484,58	0,712	28/03/2022	08/04/2022	10	12
** periodo 02	4'529,99	0,926	16/05/2022	01/06/2022	13	17
** Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	21'227,87	4,339	04/04/2022	10/06/2022	27	37
** periodo 01	10'220,82	2,089	04/04/2022	21/04/2022	13	18
** periodo 02	11'007,04	2,250	23/05/2022	10/06/2022	14	19
** Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a ... regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato	4'342,40	0,888	14/04/2022	10/06/2022	14	20
** periodo 01	1'550,86	0,317	14/04/2022	21/04/2022	5	8
** periodo 02	2'791,54	0,571	30/05/2022	10/06/2022	9	12
** Realizzazione di inghisaggi strutturali, mediante la puli ... articolare costruttivo. Diam. foro mm26 e lunghezza 20 cm.	6'112,48	1,249	14/04/2022	16/06/2022	19	30
** periodo 01	2'895,46	0,592	14/04/2022	28/04/2022	9	15
** periodo 02	3'217,02	0,658	02/06/2022	16/06/2022	10	15
** Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di mu ... diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato	13'302,14	2,719	19/04/2022	17/06/2022	18	23
** periodo 01	5'912,10	1,209	19/04/2022	29/04/2022	8	11
** periodo 02	7'390,04	1,511	06/06/2022	17/06/2022	10	12
** Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferra ... perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato	13'553,08	2,770	19/04/2022	24/06/2022	18	23
** periodo 01	6'023,56	1,231	19/04/2022	29/04/2022	8	11
** periodo 02	7'529,53	1,539	13/06/2022	24/06/2022	10	12
** Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione d ... one di strutture in cls mediante applicazione di betoncino	19'635,00	4,014	26/04/2022	01/07/2022	29	37
** periodo 01	9'478,41	1,938	26/04/2022	13/05/2022	14	18
** periodo 02	10'156,59	2,076	13/06/2022	01/07/2022	15	19
** Realizzazione di ancoraggi a soffitto di lamierino prefor ... omico/pressione idoneo per applicazione in solai in cls.	7'900,96	1,615	26/04/2022	29/06/2022	16	20
** periodo 01	3'950,48	0,808	26/04/2022	05/05/2022	8	10
** periodo 02	3'950,48	0,808	20/06/2022	29/06/2022	8	10
** Realizzazione sistema di contenimento in fibra di vetro a ... pleto nito e posto in opera in perfetta regola d' arte.	28'158,24	5,756	11/07/2022	28/07/2022	14	18
Tramezzature, pavimenti e rivestimenti	13'730,86	2,807	16/05/2022	19/08/2022	68	96
Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con ... il oro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm	1'320,29	0,270	16/05/2022	20/05/2022	5	5
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a fatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	233,52	0,048	18/05/2022	20/05/2022	3	3
Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliat ... gli ri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre	85,53	0,017	18/05/2022	20/05/2022	3	3
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. o escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	45,13	0,009	18/05/2022	20/05/2022	3	3
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incoll ... anato e ato , in opera Per posa di pavimenti ceramici	763,47	0,156	23/05/2022	27/05/2022	5	5

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (sega ... avoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm	1'675,29	0,342	30/05/2022	03/06/2022	4	5
** Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata ... d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti	3'785,22	0,774	03/06/2022	10/06/2022	6	8
** Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da 30 mm	363,91	0,074	09/06/2022	10/06/2022	2	2
** Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello sp ... inito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm	1'466,10	0,300	09/06/2022	17/06/2022	7	9
** Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, ... il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo	3'067,36	0,627	08/08/2022	19/08/2022	9	12
** Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferra ... perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato	925,04	0,189	18/08/2022	19/08/2022	2	2
* Intonaci, controsoffitti e rifiniture	55'103,27	11,264	26/04/2022	26/08/2022	87	123
** Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su pa ... o di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo.	14'556,52	2,976	26/04/2022	17/06/2022	19	23
*** periodo 01	6'895,25	1,409	26/04/2022	06/05/2022	9	11
*** periodo 02	7'661,27	1,566	06/06/2022	17/06/2022	10	12
** Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m pos ... to a perfetta regola d'arte Paraspigoli in lamiera zincata	197,40	0,040	13/06/2022	15/06/2022	3	3
** Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa ... a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.	8'415,80	1,720	09/05/2022	01/07/2022	20	24
*** periodo 01	4'208,01	0,860	09/05/2022	20/05/2022	10	12
*** periodo 02	4'207,80	0,860	20/06/2022	01/07/2022	10	12
** Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizz ... 600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura	10'854,56	2,219	08/08/2022	26/08/2022	14	19
** "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con ... tura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	7'887,27	1,612	26/04/2022	29/07/2022	29	36
*** periodo 01	2'447,75	0,500	26/04/2022	06/05/2022	9	11
*** periodo 02	2'719,71	0,556	06/06/2022	18/06/2022	10	13
*** periodo 03	2'719,80	0,556	18/07/2022	29/07/2022	10	12
** Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... etta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche	2'261,20	0,462	13/06/2022	05/08/2022	20	24
*** periodo 01	1'130,60	0,231	13/06/2022	24/06/2022	10	12
*** periodo 02	1'130,60	0,231	25/07/2022	05/08/2022	10	12
** Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche	7'124,56	1,456	02/05/2022	12/08/2022	30	36
*** periodo 01	2'374,85	0,485	02/05/2022	13/05/2022	10	12
*** periodo 02	2'374,85	0,485	20/06/2022	01/07/2022	10	12
*** periodo 03	2'374,85	0,485	01/08/2022	12/08/2022	10	12
** Interventi di verifica, parziale riparazione ed impermeabilizzazione e vanelle esterne in facciata.	3'805,96	0,778	09/05/2022	19/08/2022	19	24
*** periodo 01	2'017,16	0,412	09/05/2022	20/05/2022	10	12
*** periodo 02	1'788,80	0,366	08/08/2022	19/08/2022	9	12
* Porte, infissi e serramenti	37'908,84	7,749	31/01/2022	29/07/2022	127	180
** Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediant ... a e Grande riparazione di infissi di qualunque genere	2'329,49	0,476	27/06/2022	15/07/2022	15	19
** Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, an ... i,						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
scanalature, ecc. Per sportelli di persiane in castagno	2'612,50	0,534	04/07/2022	15/07/2022	10	12
* * Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solve ... parti più tenaci Con fonte di calore alla fiamma o ad aria	1'550,31	0,317	27/06/2022	15/07/2022	15	19
* * Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in ... erfetta regola d'arte Con impregnante a solvente: turapori	932,24	0,191	04/07/2022	22/07/2022	15	19
* * Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco gr ... voro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura	666,52	0,136	04/07/2022	22/07/2022	15	19
* * Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due ... oro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco	1'228,80	0,251	11/07/2022	29/07/2022	15	19
* * Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm ... ompreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm	741,27	0,152	27/06/2022	01/07/2022	5	5
* * Fornitura e posa in opera di infissi in legno di castagno ... n legno, a doppio battente a tutt'altezza, senza sopraluce	15'275,60	3,123	30/06/2022	15/07/2022	12	16
* * Vetro camera di sicurezza basso emissivo, con lastra inte ... ant'altro occorre per dare l'opera finita e regola d'arte.	2'930,21	0,599	30/06/2022	15/07/2022	12	16
* * Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm ... ompreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm	528,61	0,108	27/06/2022	01/07/2022	5	5
* * Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, co ... serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente	2'359,34	0,482	30/06/2022	15/07/2022	12	16
* * Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, ... ro finito a perfetta regola d'arte Larghezza da 12 a 15 cm	2'617,82	0,535	06/07/2022	15/07/2022	8	10
* * Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due ... contropiastra, due chiavi e ferramenta Tipo comune a borsa	206,64	0,042	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di ... era compreso ferramenta In materiale plastico, autoadesivo	73,08	0,015	14/07/2022	15/07/2022	2	2
* Realizzazione di pannellatura di protezione rigida alle f ... ata dei ... oratori, posa in opera e manutenzione in esercizio.	3'856,41	0,788	31/01/2022	04/02/2022	5	5
Impianti idrici	11'195,14	2,288	16/05/2022	01/06/2022	13	17
* Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igie ... ola arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti	1'143,10	0,234	16/05/2022	27/05/2022	10	12
* Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igie ... gola arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti	770,80	0,158	16/05/2022	27/05/2022	10	12
* Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	635,76	0,130	23/05/2022	27/05/2022	5	5
* Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazion ... 'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	753,12	0,154	30/05/2022	01/06/2022	3	3
* Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... Vaso vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata	1'079,20	0,221	31/05/2022	01/06/2022	2	2
* Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... a da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando	1'587,78	0,325	31/05/2022	01/06/2022	2	2
* Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornit ... regola arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"	384,72	0,079	30/05/2022	31/05/2022	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante c ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	456,00	0,093	04/07/2022	15/07/2022	10	12
* * Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm	214,65	0,044	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm	321,60	0,066	11/07/2022	22/07/2022	10	12
* * Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	1'339,80	0,274	11/07/2022	22/07/2022	10	12
* * Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	512,00	0,105	11/07/2022	22/07/2022	10	12
* * Cassetta di derivazione e connessione da incasso in mater ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm	184,20	0,038	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mm ² per contenitore da 155x155 mm	374,10	0,076	18/07/2022	22/07/2022	5	5
* * Cassetta di derivazione e connessione da incasso in mater ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm	108,22	0,022	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mm ² per contenitore da 220x220 mm	302,26	0,062	18/07/2022	22/07/2022	5	5
* * Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per a ... llo, fornita e posta in opera Scatola 3 posti 104x66x48 mm	78,10	0,016	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Scatola modulare da parete complete di base e coperchio l ... tti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm	404,41	0,083	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Scatola modulare da parete complete di base e coperchio l ... ntro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm	82,80	0,017	11/07/2022	15/07/2022	5	5
* * Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 801 UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5	762,00	0,156	11/07/2022	22/07/2022	10	12
* Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Terminale ermata, per cavi FTP	503,28	0,103	18/07/2022	22/07/2022	5	5
* Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione d ... m ³ /h, eivalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W	289,66	0,059	21/07/2022	22/07/2022	2	2
* Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminant ... nmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm	10'719,06	2,191	18/07/2022	29/07/2022	10	12
* Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... ne 65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	4'580,46	0,936	18/07/2022	29/07/2022	10	12
* Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori Accessorio per ensione (tiges) L=500 mm	482,10	0,099	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* Fornitura e posa in opera di canalina a battiscopa dimens ... le ize lungo il perimetrale per l' ubicazione dei cavi.	7'434,90	1,520	11/07/2022	29/07/2022	15	19
* Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... ata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W	248,10	0,051	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con ... vento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC	197,87	0,040	25/07/2022	29/07/2022	5	5

MMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli
DELLA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con ... ntervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A	4'741,65	0,969	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* * Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m	1'501,25	0,307	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* * Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modular ... Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare	21,65	0,004	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* * Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine ep ... o di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm	538,88	0,110	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* * Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente ... di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	2'126,70	0,435	25/07/2022	29/07/2022	5	5
* * Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, complet ... re da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A	481,44	0,098	25/07/2022	29/07/2022	5	5
Data, 26/07/2022						
Tecnico						
						

Comune di Napoli (Na)

Area Patrimonio

Servizio Tecnico Patrimonio

TABELLA DATI ED IMPORTI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del blocco uffici al piano quarto prospiciente la Corte C - Palazzo San Giacomo - Napoli

COMMITTENTE: Comune di Napoli (Na)
Area Patrimonio – Servizio Tecnico del Patrimonio

CANTIERE: Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – Comune di Napoli

Napoli (Na), 26/01/2022

IL TECNICO



(arch. Concetta Miragliuolo)

Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 5° D.lgs. 250/2016, denominato “Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica immobili comuni non a reddito”.

Dirigente: Ing. Vincenzo Brandi

R.U.P.: Arch. Guglielmo Pescatore



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
31/01/2022	771,28	771,28	0,158
01/02/2022	833,44	1'604,72	0,328
02/02/2022	1'025,03	2'629,75	0,538
03/02/2022	1'097,29	3'727,05	0,762
04/02/2022	1'097,29	4'824,34	0,986
07/02/2022	432,55	5'256,89	1,075
08/02/2022	432,55	5'689,43	1,163
09/02/2022	432,55	6'121,98	1,251
10/02/2022	432,55	6'554,52	1,340
11/02/2022	240,95	6'795,48	1,389
14/02/2022	1'368,21	8'163,69	1,669
15/02/2022	1'368,21	9'531,90	1,948
16/02/2022	1'368,21	10'900,11	2,228
17/02/2022	1'295,95	12'196,05	2,493
18/02/2022	1'295,95	13'492,00	2,758
21/02/2022	1'703,65	15'195,65	3,106
22/02/2022	1'703,65	16'899,30	3,454
23/02/2022	1'703,65	18'602,95	3,803
24/02/2022	1'703,65	20'306,60	4,151
25/02/2022	1'703,64	22'010,24	4,499
28/02/2022	508,45	22'518,69	4,603
01/03/2022	550,59	23'069,28	4,716
02/03/2022	550,59	23'619,88	4,828
03/03/2022	550,59	24'170,47	4,941
04/03/2022	550,59	24'721,07	5,053
07/03/2022	2'843,94	27'565,01	5,635
08/03/2022	2'843,94	30'408,95	6,216
09/03/2022	2'843,94	33'252,90	6,797
10/03/2022	2'843,94	36'096,84	7,379
11/03/2022	2'843,95	38'940,79	7,960
14/03/2022	2'396,19	41'336,99	8,450
15/03/2022	2'396,19	43'733,18	8,940
16/03/2022	2'352,96	46'086,14	9,421
17/03/2022	2'352,96	48'439,10	9,902
18/03/2022	2'352,96	50'792,06	10,383
21/03/2022	700,18	51'492,23	10,526
22/03/2022	700,18	52'192,41	10,669
23/03/2022	700,18	52'892,59	10,812
28/03/2022	1'023,58	53'916,17	11,021
29/03/2022	1'023,58	54'939,74	11,230
30/03/2022	1'788,69	56'728,43	11,596
31/03/2022	1'788,69	58'517,12	11,962
01/04/2022	1'788,69	60'305,81	12,327
02/04/2022	1'788,69	62'094,50	12,693
03/04/2022	1'895,90	63'990,40	13,080
04/04/2022	3'290,58	67'280,97	13,753
05/04/2022	3'290,58	70'571,55	14,426
06/04/2022	3'290,58	73'862,13	15,098
07/04/2022	3'290,58	77'152,70	15,771
08/04/2022	3'290,57	80'443,27	16,444
09/04/2022	2'515,46	82'958,74	16,958
10/04/2022	2'515,46	85'474,20	17,472
11/04/2022	2'515,46	87'989,66	17,986
12/04/2022	3'147,35	91'137,01	18,629
13/04/2022	3'147,35	94'284,36	19,273
14/04/2022	3'057,60	97'341,96	19,898
15/04/2022	3'057,60	100'399,56	20,523
16/04/2022	3'014,37	103'413,93	21,139
17/04/2022	1'917,98	105'331,91	21,531
18/04/2022	4'466,01	109'797,92	22,444
19/04/2022	4'466,01	114'263,93	23,357
20/04/2022	4'466,01	118'729,94	24,270
21/04/2022	4'144,29	122'874,23	25,117

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
02/05/2022	4'767,63	127'641,86	26,092
03/05/2022	4'767,63	132'409,49	27,066
04/05/2022	4'767,63	137'177,12	28,041
05/05/2022	4'767,63	141'944,74	29,015
06/05/2022	4'273,83	146'218,57	29,889
09/05/2022	9'055,98	155'274,55	31,740
10/05/2022	9'055,99	164'330,54	33,591
11/05/2022	2'543,17	166'873,71	34,111
12/05/2022	2'543,17	169'416,88	34,631
13/05/2022	2'543,17	171'960,05	35,151
16/05/2022	2'714,89	174'674,94	35,706
17/05/2022	2'714,89	177'389,83	36,261
18/05/2022	2'793,05	180'182,87	36,832
19/05/2022	2'793,05	182'975,92	37,402
20/05/2022	2'793,05	185'768,97	37,973
23/05/2022	2'870,92	188'639,89	38,560
24/05/2022	3'125,00	191'764,89	39,199
25/05/2022	3'125,00	194'889,89	39,838
26/05/2022	3'006,77	197'896,66	40,452
27/05/2022	3'006,77	200'903,43	41,067
30/05/2022	3'818,18	204'721,61	41,848
31/05/2022	5'217,79	209'939,40	42,914
01/06/2022	5'253,03	215'192,43	43,988
03/06/2022	3'786,01	218'978,44	44,762
06/06/2022	4'362,41	223'340,85	45,654
07/06/2022	4'362,41	227'703,26	46,545
08/06/2022	4'362,41	232'065,68	47,437
09/06/2022	4'753,81	236'819,49	48,409
10/06/2022	4'753,82	241'573,30	49,380
13/06/2022	4'996,77	246'570,07	50,402
14/06/2022	4'996,77	251'566,85	51,423
15/06/2022	4'873,74	256'440,59	52,420
16/06/2022	4'710,68	261'151,27	53,382
17/06/2022	4'388,97	265'540,24	54,280
20/06/2022	3'580,05	269'120,29	55,011
21/06/2022	3'580,05	272'700,34	55,743
22/06/2022	3'580,05	276'280,39	56,475
24/06/2022	3'274,43	279'554,82	57,144
25/06/2022	3'274,42	282'829,25	57,814
27/06/2022	4'245,10	287'074,35	58,681
28/06/2022	4'245,10	291'319,45	59,549
29/06/2022	4'245,10	295'564,55	60,417
30/06/2022	5'465,05	301'029,60	61,534
01/07/2022	5'465,05	306'494,66	62,651
04/07/2022	4'546,54	311'041,20	63,581
05/07/2022	4'546,54	315'587,74	64,510
06/07/2022	4'873,77	320'461,51	65,506
07/07/2022	4'873,77	325'335,28	66,502
08/07/2022	4'873,77	330'209,06	67,499
11/07/2022	7'822,26	338'031,31	69,098
12/07/2022	7'822,26	345'853,57	70,697
13/07/2022	7'822,26	353'675,83	72,296
14/07/2022	7'858,80	361'534,63	73,902
15/07/2022	7'858,79	369'393,42	75,508
16/07/2022	5'462,21	374'855,63	76,625
17/07/2022	5'462,21	380'317,85	77,742
18/07/2022	5'462,21	385'780,06	78,858
19/07/2022	5'607,04	391'387,10	80,004
20/07/2022	5'607,04	396'994,14	81,150
21/07/2022	7'575,39	404'569,53	82,699
22/07/2022	7'575,39	412'144,91	84,247
23/07/2022	7'575,39	419'720,30	85,796
24/07/2022	7'575,38	427'295,68	87,344

AMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli
 DELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
29/07/2022	5'564,09	432'859,78	88,482
01/08/2022	2'120,27	434'980,05	88,915
02/08/2022	2'120,27	437'100,31	89,349
03/08/2022	2'120,27	439'220,58	89,782
04/08/2022	2'120,27	441'340,85	90,215
05/08/2022	2'120,27	443'461,12	90,649
08/08/2022	3'297,46	446'758,58	91,323
09/08/2022	3'297,46	450'056,04	91,997
10/08/2022	3'297,46	453'353,50	92,671
11/08/2022	3'297,46	456'650,96	93,345
12/08/2022	3'297,46	459'948,42	94,019
16/08/2022	3'059,97	463'008,40	94,644
17/08/2022	3'059,97	466'068,37	95,270
18/08/2022	3'522,49	469'590,87	95,990
19/08/2022	3'522,50	473'113,37	96,710
22/08/2022	2'890,82	476'004,18	97,301
23/08/2022	2'890,82	478'895,00	97,892
24/08/2022	2'890,82	481'785,81	98,483
25/08/2022	2'890,82	484'676,63	99,074
26/08/2022	2'890,82	487'567,45	99,665
29/08/2022	1'640,77	489'208,22	100,000

Data, 26/04/2022

Tecnico

