COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVA CENTRALITÀ

Completamento del Programma di riqualificazione di cui al contratto di Quartiere II di Pianura

LOTTO 1: Parco Falcone e Borsellino - Via E. Torricelli

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Comune di Napoli - Area trasformazione del territorio

Dir. Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità - Arch. P. Cerotto

Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Arch. L. Salzano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato A - Diagramma di Gantt

- ☐ DESCRITTIVI
- ☐ ARCHITETTONICI
- ☐ STRUTTURALI
- ☐ IMPIANTISTICI
- ☐ ECONOMICI
- ☒ SICUREZZA

Gruppo di Progettazione:

Gamma Ingegneria soc. coop.

Viale M. Cristina di Savoia 18/A - 80122 Napoli

e.mail: info@gammaingegneria.com - www.gammaingegneria.com

Vitruvius Engineering s.a.s.

Sede oper. Viale M. Cristina di Savoia 18/A - 80122 Napoli

Pec: vitruvius@pec.it

Dott. For. Nat. PhD Savino Mastrullo

Via Toledo, 156 - 80132 Napoli

e.mail: savino.mastrullo@gmail.com

Ing. Antonio Marino

Via Falluti,8 - 80123 Caivano (NA)

e.mail: marino.antonio82@gmail.com

	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
00	Luglio 2021	Prima emissione (Progetto Definitivo approvato con D.D. 009 del 25/05/2021)	/
01	Novembre 2021	Integrazione (nota PG/2021/831240 del 17/11/2021)	/

ELABORATO

PSC_01_A_var

Integra e sostituise PSC_01_A
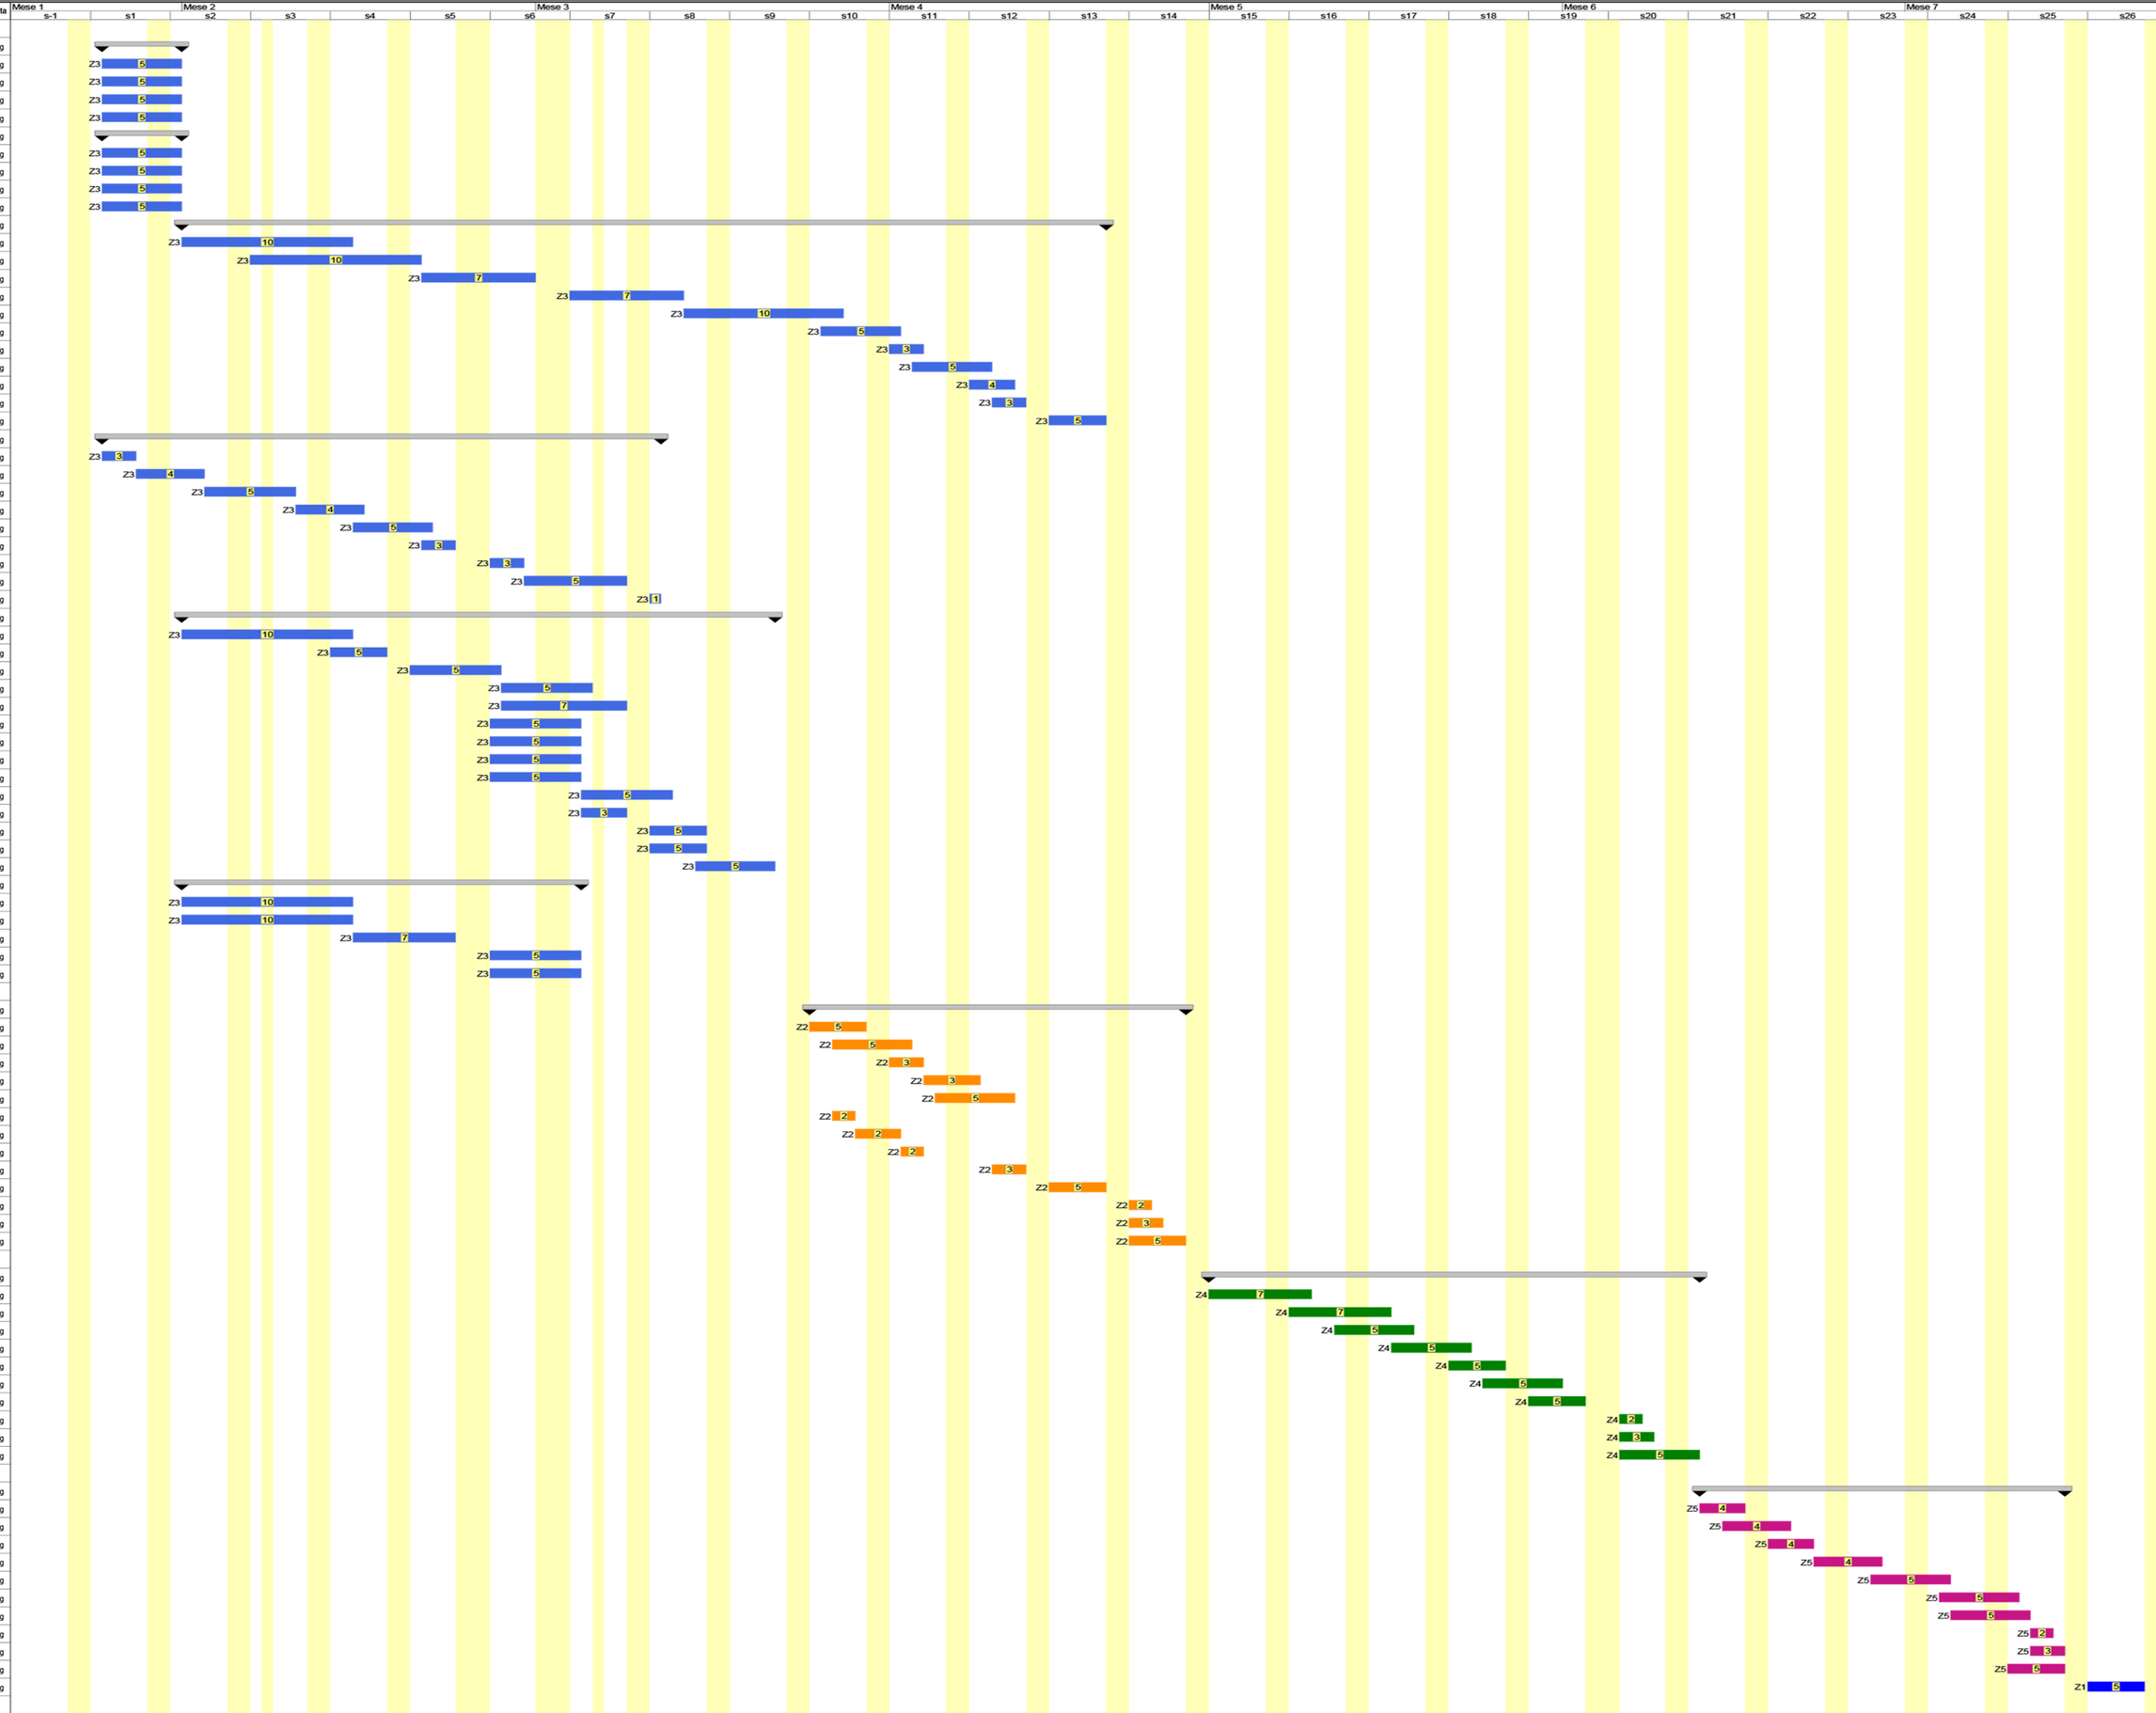
Nome attività	Durata
FASE 1	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g
Impianti di servizio del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia	5 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	5 g
Lavori stradali - Collegamento Casa della Cultura	55 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	10 g
Scavo a sezione obbligata	10 g
Posa di conduttura fognaria	7 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	7 g
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	4 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g
Lavori stradali - Viabilità SUD	31 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g
Messa a dimora di talee e piantine	1 g
Lavorazioni parco	34 g
Scavo di splateamento	10 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	5 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5 g
Posa di recinzioni e cancellate	5 g
Installazione di giochi per bambini	7 g
Rimozione di manto impermeabile	5 g
Rimozione di serramenti interni	5 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	5 g
Impermeabilizzazione di coperture	5 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	5 g
Montaggio di porte interne	5 g
Opere a verde	22 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	10 g
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive	10 g
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	7 g
Formazione di tappeto erboso	5 g
Messa a dimora di piante	5 g
FASE 2	
Lavori stradali	25 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g
Scavo a sezione obbligata	5 g
Posa di conduttura fognaria	3 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	3 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Scavo a sezione obbligata per realizzazione rampa di accesso	2 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad	2 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g
FASE 3	
Lavori stradali	30 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	7 g
Scavo a sezione obbligata	7 g
Posa di conduttura fognaria	5 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	5 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	5 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g
FASE 4	
Lavori stradali	24 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Posa di conduttura fognaria	4 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	4 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	5 g
Realizzazione di marciapiedi	5 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
