COMUNE DI NAPOLI

Progetto esecutivo "Riqualificazione del Parco Ciro Esposito"

Scampia

CIG: Z7B2C9F7DC - CUP: B62I19000860005

COMUNE DI NAPOLI Area Ambiente Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Comune di Napoli
Dirigente Servizio "Verde della Città" dott.ssa Teresa Bastia
R.U.P. arch. Francesca Spera

PROGETTO
Raggruppamento temporaneo di Professionisti R.T.P. "Green Scampia"
arch. Vincenzo Russo capogruppo-mandatario
ing. Federico de Chiara mandante
dott.ssa agr. Elena Silvestri mandante
arch. Laura Calandriello mandante
con dott. Rocco La Fratta geologo

PROGETTO ESECUTIVO

☐	P.e.E.e.	Elenco elaborati	
☐	P.e.R.gen.	Relazione generale	
☐	P.e.R.geo.	Relazione geologica	
☐	P.e.P.S.	Piano della sicurezza (con allegati grafici)	
☐	P.e.R.t.a	Relazione tecnica agronomica	
☐	P.e.R.t.i	Relazione tecnica impiantistica	
☐	P.e.R.t.e	Relazione tecnica opere edili	
☐	P.e.R.CAM	Relazione conformità C.A.M.	
☐	P.e.R.Ra.	Relazione di raffronto Pdf - Pe	
☐	P.e.P.m.	Piano di manutenzione	
☐	P.e.Cm.	Computo metrico estimativo	
☐	P.e.Quer.	Quadro economico riepilogativo	
☐	P.e.A.p.	Analisi prezzi	
☐	P.e.E.p.	Elenco prezzi	
☐	P.e.S..m.	Stima incidenza manodopera	
☐	P.e.S.s.	Stima Oneri di sicurezza	
☑	P.e.Cr.	Cronoprogramma	
☐	P.e.S.c.	Schema di contratto	
☐	P.e.C.a.	Capitolato speciale di appalto	
☐	P.e.O.p.	Offerta prezzi	
☐	P.e.a1	Inquadramento territoriale	1:5.000
☐	P.e.a2.R1	Rilievo - Planimetrie generali	1:1000
☐	P.e.a2.R2	Rilievo - Sezioni e ambiti *(Specchio d'acqua - Terminale Municipalità - Collinetta - Ingresso principale - Accessi secondari)*	1:500
☐	P.e.a2.R3	Rilievo - Ambiti *(Porticati perimetrali e Pagode - Cancello - Pergole - Bastioni - Fontana - Viali - Aree gioco)*	1:200/1:50
☐	P.e.a2.R4	Rilievo - Locali guardiania	1:50
☐	P.e.a3	Planimetria generale - Analisi del degrado	1:1000
☐	P.e.a4	Planimetria generale di progetto - Funzioni e ambiti d'intervento	1:1000
☐	P.e.a5	Ingresso Principale (*Locale Guardiania - Porticato - Servizi Igienici)*	1:200/1:50/1:10
☐	P.e.a6	Bastioni - Porticati perimetrali - Accessi secondari	1:200/1:50/1:10
☐	P.e.a7	Giardino d'acqua	1:200/1:50/1:10
☐	P.e.a8	Aree Gioco *(Area 3/6, 6/12 anni - Spazio fitness - Spazio danza - Area cani)*	1:200/1:50/1:10
☐	P.e.a9	Pergole - Viali - Balaustre - Canale interno	1:200/1:50/1:10
☐	P.e.a10	Arredo urbano	1:1000/1:50/1:10
☐	P.e.i	Impianto illuminotecnico e videosorveglianza	1:1000/1:50/1:10
☐	P.e.v.1	Rilievo Agronomico e analisi vegetazionale	1:750
☐	P.e.v.2	Progetto paesaggistico - integrazioni nuovi impianti vegetazionali	1:1000
☐	P.e.v.3	Pattern d'impianto vegetazionale *(A aiuole, B giardino didattico, C labirinto, D giardino delle farfalle*)	1:1000/1:50/1:10
☐	P.e.Pl.	Plinto armato	

Rev. 00 Giugno 2021 | Rev. 01 Ottobre 2021

ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di Na

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione del Parco "Ciro Esposito" Scampia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale.

CANTIERE: Viale della Resistenza, Napoli (Na)

Napoli, 31/05/2021

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere - mandante RTP Grenn Scampia de Chiara Federico)

IL COMMITTENTE

(RUP Spera Francesca)

ingegnere - mandante RTP Grenn Scampia de Chiara Federico
Via Alfonso I d'Aragona, 28
81031 Aversa (Ce)
Tel.: 3477904272 - Fax: -
E-Mail: federico.dechiara@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
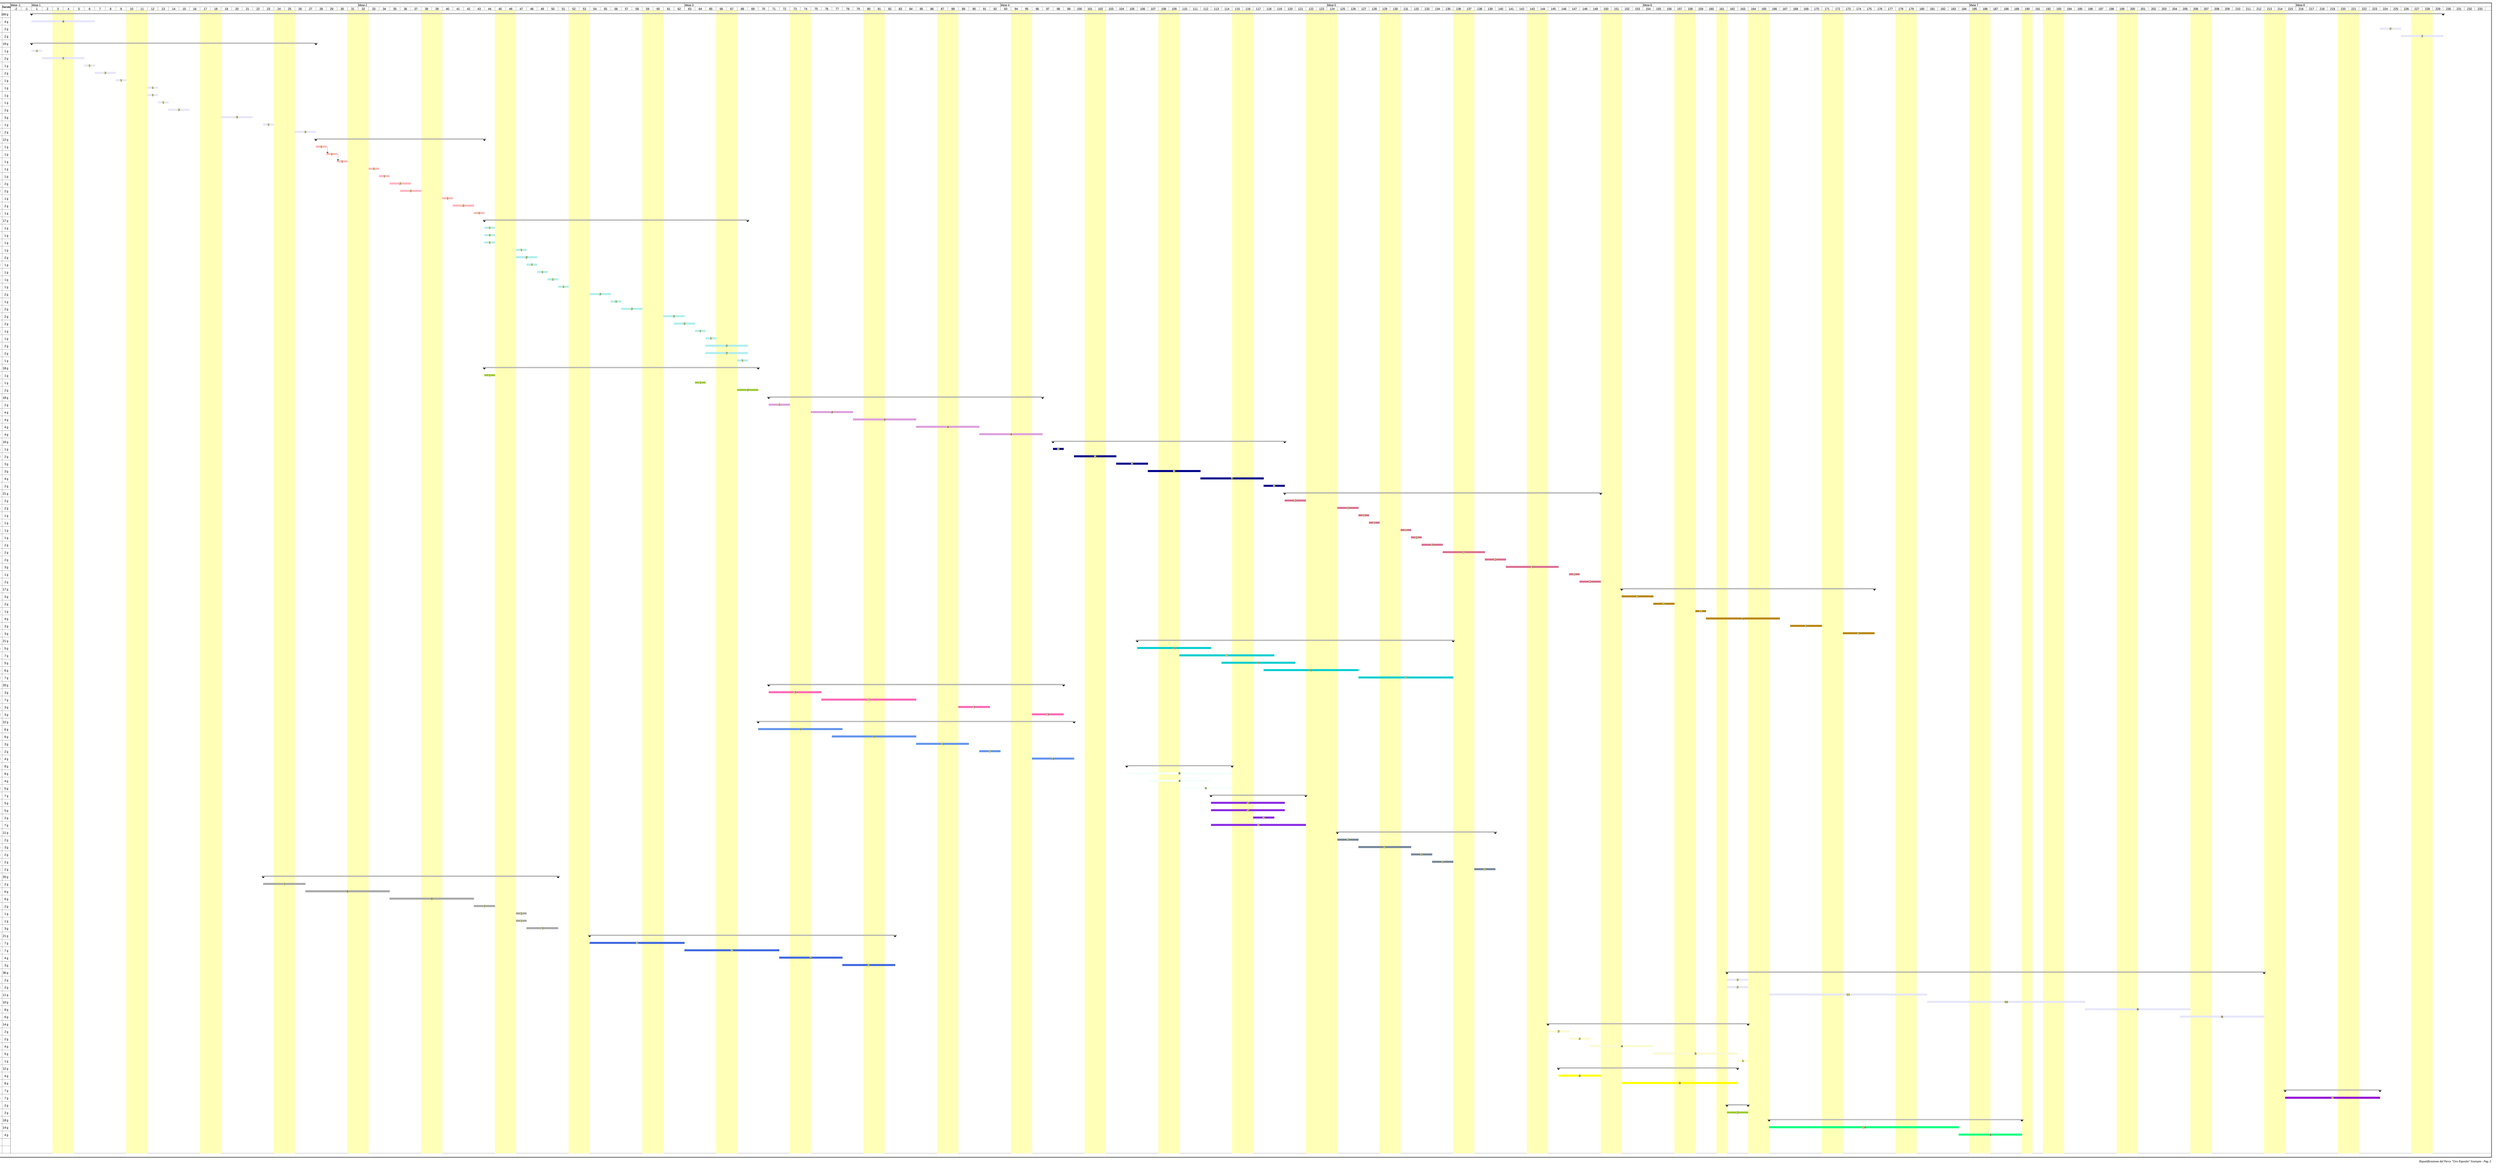
Nome attività	Durata
Installazione/disinstallazione cantiere	180 g
Realizzazione della recinzione e dog	2 g
Installazione del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantier	2 g
Fornitura ne acciaio principale	180 g
Realizzazione di recinzioni e ponteggi	2 g
Sagitaggio ferri + elementi strutty	2 g
Lavorazione piana ferri di armatur	2 g
Realizzazione della carpenteria per	2 g
Getto in calcestruzzo per le strutture	2 g
Rimozione di pavimento in legno di	2 g
Rimozione di manto impermeabilo	2 g
Impermeabilizzazione di superfici c	2 g
Posa di pavimento in marmo di carrar	2 g
Posa di ringhiere e parapetti	2 g
Verniciatura ed opere di finiture ca	2 g
Verniciatura a pennello di opere in f	2 g
Area di accesso principale	53 g
Installazione di cantiere temporaneo	1 g
Diserbo manuale di aree	1 g
Rimozione di piante, cespugli	1 g
Sminuzzaggio di strutture arborative	1 g
Sminuzzaggio di strutture verticali ne	1 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Puzzolamento dilissuoni	1 g
Rimozione ne cassoni di ingresso	1 g
Disallestimento di cantiere tempora	1 g
Locali guardiania	77 g
Rimozione di serramenti esterni	1 g
Rimozione di serramenti interni	1 g
Rimozione di apparecchi igienico sa	1 g
Rimozione di vasi outdoor	1 g
Rimozione di pavimento in ceramic	2 g
Rimozione ne rivestimenti in ceram	2 g
Rimozione di intipaini vetro-canta	2 g
Rimozione di sottocontrofittature, int	2 g
Realizzazione della rete di distribuz	2 g
Realizzazione di impianto di illuminaz	2 g
Esecuzione di muri magazzino e bar	2 g
Posa di pavimenti per interni in ceram	2 g
Posa di rivestimenti interni in ceram	2 g
Controsoffitto	2 g
Montaggio di apparecchi igienico sa	2 g
Montaggio di porte interne	2 g
Montaggio di serramenti esterni	2 g
Tinteggiatura di superfici interne e a	2 g
Posa della macchina di condizionam	2 g
Servizi igienici	18 g
Rimozione di apparecchi igienico sa	1 g
Montaggio di apparecchi igienico sa	1 g
Tinteggiatura di superfici interne e a	1 g
Pagoda	18 g
Diserbo manuale di aree	1 g
Rimozione di vasi ornamentali di gra	1 g
Rimozione di vasi di plastica - tram par	1 g
Eliminazione della ruota	1 g
Tinteggiatura di superfici esterne e a	1 g
Parcheggi	18 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Rabbiettatura e sistlatura di vecchia	1 g
Rispristino manutenzione di cab	1 g
Eliminazione delle scritte	1 g
Segnaletica di pavimentazione	1 g
Fosso verdi circostante il giardino d'ac	23 g
Rimozione di vasi ornamentali di gra	1 g
Realizzazione della carpenteria di ar	2 g
Lavorazione piana ferri di armatur	2 g
Getto di calcestruzzo di cordoli in c	2 g
Scavo eseguito con mezzi meccanici	1 g
Scavo a sezione obbligata in terreni	1 g
Impermeabilizzazione di superfici c	2 g
Formazione di massetti per pavime	2 g
Posa di piastrelle bassa	2 g
Posa di ferro di cotino	2 g
Semina a spaglio	2 g
Messa a dimora di piante	2 g
Cantiere d'opera	17 g
Realizzazione di impianto elettrico	2 g
Pozzetti di ispezione opere d'arte	2 g
Realizzazione di impianto di utilitie	2 g
Posa di cablatura elettrica	2 g
Posa di cablatura fognaria in Tubo	2 g
Posa di cablatura idrica in materi	2 g
Pali esterni	23 g
Accatastamento dei pagaglio di ma	1 g
Getto di calcestruzzo per muri	2 g
Rabbiettatura e sistlatura di vecchia	1 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Accessi secondari tipologia ad arco	18 g
Rimozione di vasi ornamentali di gra	1 g
Rispristino di cab di plastica - tram par	1 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Intervento nella lottazione	23 g
Verifica lottazione	1 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g
Posa di ringhiere e parapetti	1 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Canale interno	1 g
Diserbo manuale di aree	1 g
Formazione di percorsi pedonali - m	1 g
Posa di gittata nel solco di posto dell	1 g
Bacinet protezioni	1 g
Diserbo manuale di aree	1 g
Scavo a cielo	1 g
Rabbiettatura e sistlatura di vecchia	1 g
Pulizia/opere manutenzione di cab	1 g
Pergolato in legno e cls	23 g
Rimozione di vasi ornamentali di gra	1 g
Rispristino di cab di plastica - tram par	1 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Area spettacolare cavi	18 g
Scavo eseguito con mezzi meccani	1 g
Scavo a sezione ristretta in roccia ma	1 g
Formazione di calcestruzzi in massa	1 g
Posa di piastrelle bassa	1 g
Posa di ferro di cotino	1 g
Semina a spaglio	1 g
Posa di ringhiere e parapetti	1 g
Accesso da Piazza Giacomo Puccini	23 g
Scarrocciatura di opere in ferro con	1 g
Verniciatura a pennello di opere in f	1 g
Protezione dei riscossi	1 g
Formazione di percorsi pedonali - m	1 g
Impianto illuminazione	18 g
Rimozione di pali di illuminazione	1 g
Rimozione di apparecchi illuminazi	1 g
Realizzazione di impianto elettrico	1 g
Posa di cablatura elettrica	18 g
Posa di pali per pubblica illuminaz	1 g
Installazione di corpi illuminanti	1 g
Area giochi	18 g
Rimozione di pavimento antitrauma	1 g
Rimozione di tettoia - giochi - panch	1 g
Posa di pavimentazione antitrauma	1 g
Installazione di giochi per bambini	1 g
Installazione di arredi per giochi	1 g
Arredo urbano	17 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle	1 g
Installazione di giochi per bambini	1 g
Videosorveglianza	1 g
Realizzazione di impianto di videos	1 g
Pulizia Generale	1 g
Rimozione di pavimento in legno di	1 g
Varie	18 g
Messa a dimora di piante	1 g
Ultimarina	1 g
